



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020102

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: BARRO ARRIBA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18 de agosto de 2022

1. Ing. Félix Tavárez

TÉCNICOS: 2. Elizabeth García


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 21 DE ENERO	355.80	1.56	1	355.80	1	555.048	355.8
TRAMO B	CALLE 21 DE ENERO	25.20	1.00	1	25.20	1	25.2	25.2
TRAMO C	CALLE 21 DE ENERO	57.40	0.80	1	57.40	1	45.92	57.4
TRAMO D	CALLE 21 DE ENERO	45.90	0.80	1	45.9	1	36.72	45.9
TRAMO E	CALLE 21 DE ENERO	47.80	1.00	1	47.8	1	47.8	47.8
TRAMO F	CALLE 21 DE ENERO	47.20	1.00	1	47.2	1	47.2	47.2
TRAMO G	CALLE 21 DE ENERO	49.10	1.00	1	49.1	1	49.1	49.1
TRAMO H	CALLE 21 DE ENERO	26.20	1.00	1	26.2	1	26.2	26.2
TRAMO I	CALLE 21 DE ENERO	113.80	1.00	1	113.8	1	113.8	113.8
TRAMO J	CALLE 21 DE ENERO	112.80	1.00	2	112.8	2	225.6	225.6
TRAMO K	CALLE 21 DE ENERO	9.40	1.00	1	9.4	1	9.4	9.4
TRAMO L	ENTRADA 1	25.60	1.00	1			25.6	
TRAMO M	ENTRADA 2				16.6	2		33.2
TRAMO N	CALLE LALITO GONZALEZ	24.70	1.00	2	24.7	2	49.4	49.4
Total							1256.99	1086.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,177,257.65

Monto desembolsado RD\$ 3,177,257.65 (100%)

Avance de obra 138.94%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18 de agosto de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: BARRO ARRIBA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,256.99 metros cuadrados de aceras y 1,086.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Al momento del levantamiento comprobamos que, las aceras y contenes fueron ejecutados con buena calidad, y con el ancho adecuado.
2. Es posible constatar en las imágenes adjuntas que se colocó un telford de espesor e = 50 cm promedio.
3. El material de relleno empleado es caliche, el cual fue colocado y compactado con equipo (maquito).

IMÁGENES

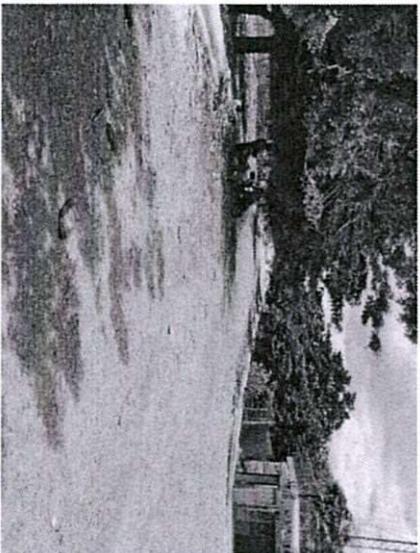



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

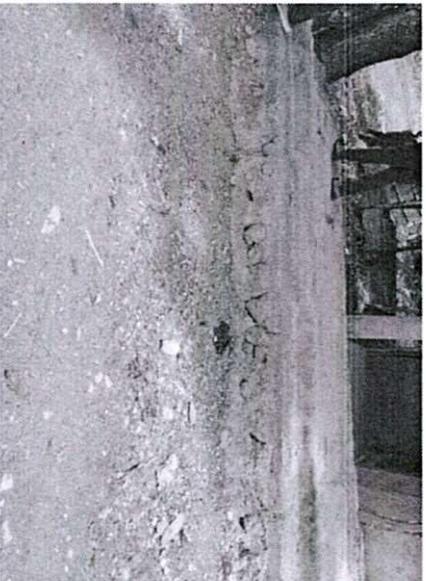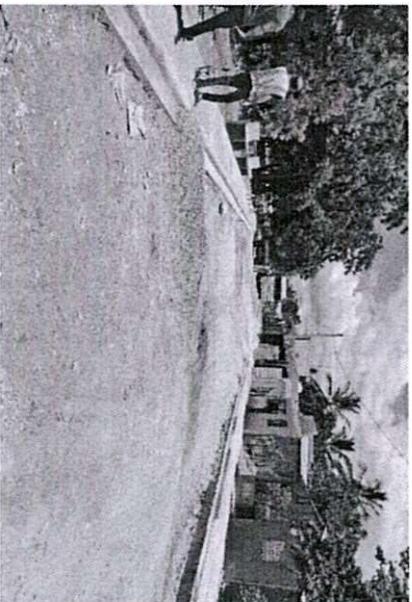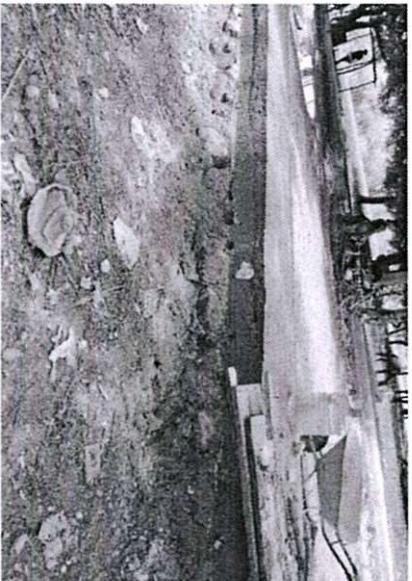

Suministra los datos de este reporte,


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico


ELIZABETH GARCÍA

Técnico

