

Santo Domingo, D.N.  
21 de abril del 2023

**SAOPPOT-273-2023**

Al: Licenciado  
**Víctor José D'Aza Tineo**  
Secretario General  
Su Despacho-

Vía: Licenciada  
**Lourdes Mirabal**  
Subsecretaria Administrativa y Financiera  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre del gobierno local Los Jovillos con no objeción de transferencia de 50% de fondos para el completivo del 100% en el marco del programa de "Apoyo a los gobiernos locales para la construcción de Obras de Infraestructuras de Competencia Municipal" (Aceras y Contenes).**

Luego de un cordial saludo, le remitimos el informe de cierre del **Distrito Municipal de Los Jovillos**, donde se da constancia de que dicho municipio ha agotado el 50% de los fondos asignados del 3er componente; para la construcción de aceras y contenes; además de haber cumplido con el volumen de trabajo requerido según asignación en el marco del programa de apoyo a los gobiernos locales para obras de infraestructuras y competencia municipal por tanto esta subsecretaria no presenta objeción para que sea transferido el 50% restante del monto asignado **RDS792,464.48** correspondiente al monto de **RDS396,232.24 (Trescientos noventa y seis mil doscientos treinta y dos pesos con 24/100)** para el completivo del 100%.

**Anexo:** Informe de cierre  
Tabla de asignación



**Ing. Valentín Santos García**  
Subsecretario

Subsecretaría Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial




C/c **Ing. Ángel Mercedes**  
Coordinador de Despacho  
VS/cr

**LISTADO DE GOBIERNOS PARA COMPLETIVO DEL 100%  
(3ER. COMPONENTE ACERAS Y CONTENES)**

No.	REGIÓN	PROVINCIA	MUNICIPIO	DISTRITO MUNICIPAL	792,464.48	396,232.24		
					3ER. COMPONENTE (MONTO BRUTO)	TOTAL A TRANSFERIR	% A DESEMBOLSAR	PENDIENTE POR TRANSFERIR
1	EL VALLE	AZUA	AZUA	LOS JOVILLOS	792,464.48	396,232.24	50.00%	-

RESUMEN POR GOBIERNO LOCAL				
Gobierno local	Cantidad	3Er. Componente (Monto Bruto)	Total A Transferir	Pendiente Por Transferir
Municipios	0	-	-	-
Distritos Municipales	1	792,464.48	396,232.24	-

  
**Ing. Valentín Santos García**  
 Subsecretario

Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,  
 Planeamiento y Ordenamiento Territorial



Santo Domingo, D.N.  
11 de abril de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Los Jovillos**



En la visita técnica realizada el 27 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 1,152.59 metros cuadrados de aceras y 859.5 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 346.8 metros cuadrados de aceras, y 346.8 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,499.39 metros cuadrados de acera y 1,206.30 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil  
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

3er  
Componente

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: D.M LOS JOVILLOS

BARRIO Y/O SECTOR:

2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social

RNC ó Cédula: 430057398

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes: X
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros:

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps.





# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020104  
REGIÓN: VALDESIÁ  
PROVINCIA: AZUA  
MUNICIPIO: AZUA  
DISTRITO MUNICIPAL: LOS JOVILLOS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 27 de marzo de 2023

TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora  
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LOS JOVILLOS CALLE RAMON ANTONIO MEDRANO	404.78	1.40	1	374.50	1	566.692	374.5
TRAMO B	CALLE DE LA ESCUELA NUEVA	123.60	1.16	2	123.60	2	286.752	247.2
TRAMO C	CALLE FRENTE A LA CLINICA	71.72	0.90	1	33.80	1	64.548	33.8
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL ENTRADA DE LOS JOVILLOS	204.00	1.15	1	204.00	1	234.6	204
Total							1152.59	859.50

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


Monto asignado RD\$ 3,253,175.73

Monto desembolsado RD\$ 3,253,175.73 (100%)

Avance de obra 113.64%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

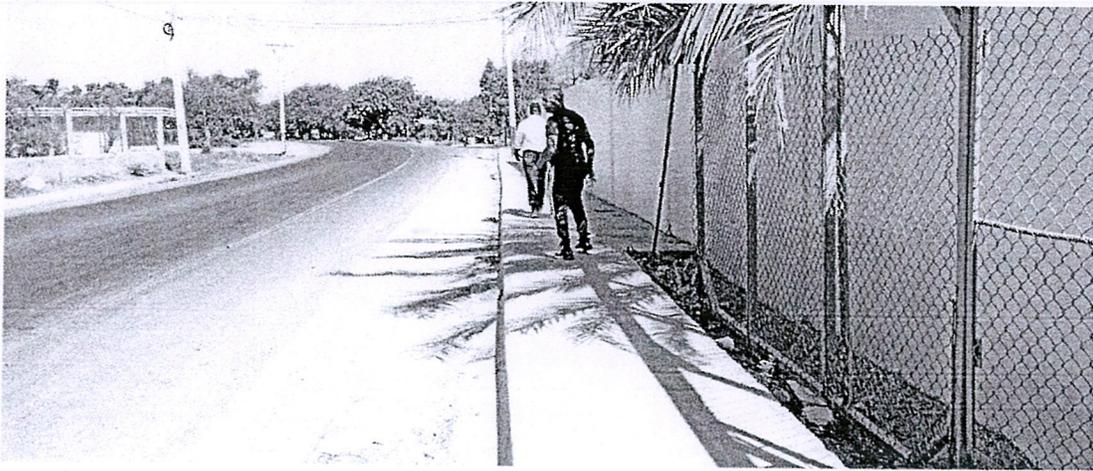

Suministra los datos de este reporte,

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

