

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

Santo Domingo, D.N.
30 de mayo de 2023

Al:

Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía:

Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución Palmar de Ocoa**

En la visita técnica realizada el 06 de septiembre del 2022 se validó la ejecución de 304.60 metros cuadrados de aceras y 1,819.20 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 332.85 metros cuadrados de aceras y 1,649.2 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 637.45 metros cuadrados de aceras y 3,468.40 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz

Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020202

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de septiembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Asamín Ferreras


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ Padre Billini				135.40	2		270.8
TRAMO B	C/ Juana De Arco	112.90	1.00	2			225.8	
TRAMO C	C/ Intercepcion Juana Hantton 1				148.70	2		297.4
TRAMO D	Respaldo detrás del Play				253.3	2		506.6
TRAMO E	C/ La Funeraria				46.75	2		93.5
TRAMO F	C/ Proyecto				120.4	2		240.8
TRAMO G	C/ Intercepcion Juana Hantton 2				54.1	2		108.2
TRAMO H	C/ Juana Hanton				79	2		158
TRAMO I	C/ Juana Hanton 3				71.95	2		143.9
TRAMO J	Entrada de Durange Aguida Amador	39.40	1.00	2			78.8	
Total							304.60	1819.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,937,573.43

Monto desembolsado RD\$ 1,468,786.72 (50%)

Avance de obra 172.72%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de septiembre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: LAS CHARCAS

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCCO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 304.60 metros cuadrados de aceras y 1,819.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La modalidad de ejecución fue por contrato.
2. La Alcaldía empleó la mayoría de los fondos en contenes para aprovechar el programa de alfaldado.
3. Se cumplieron con las normas constructivas sugeridas dentro de este programa.
4. Los municipios se encuentran satisfechos con la ejecución del programa de aceras y contenes.

IMÁGENES

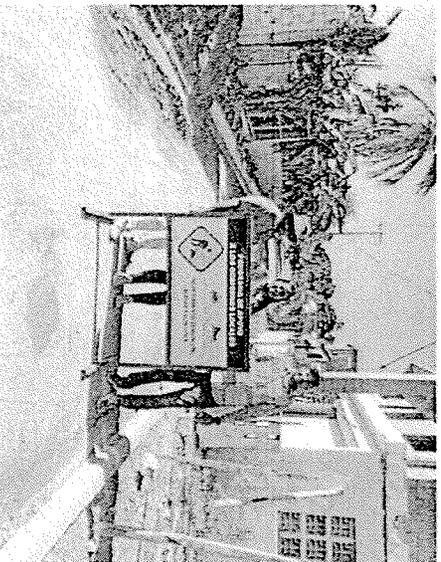




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

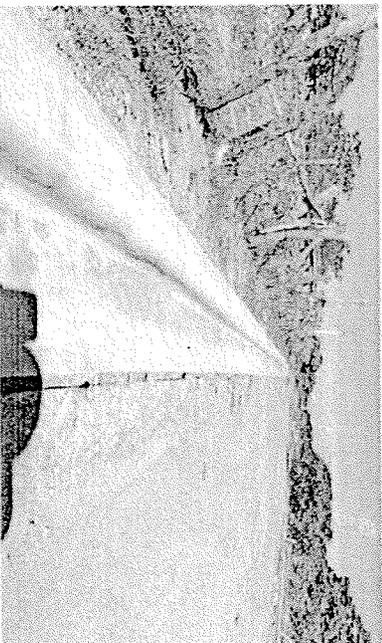

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: AZUA

DISTRITO MUNICIPAL: PALMAR DE OCOA

BARRIO Y/O SECTOR: _____

SECTOR DETRÁS DEL PLAY Y ENTRADA DUVERGE

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
- b. Contratista

Razón Social _____

RNC: ó Cédula: 430055395

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
- b. Incluye demoliciones de tramos:
- c. Incluye badenes:
- d. Otros: _____

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (suma ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	18.294268	-70.585838	18.292744	-70.585822			131.3		262.6
Tramo B	CALLE JUANA DE ARCO	18.292267	-70.585456	18.294936	-70.575390	116.5	0.94		233.00	
Tramo C	CALLE RESPALDO JUANA HATTON	18.291457	-70.583149	18.292282	-70.583149			161.4		322.8
Tramo D	CALLE 2DA DETRÁS DEL PLAY	18.294936	-70.575390	18.293749	-70.582781			114.00		228.00
Tramo E	CALLE 1RA DETRÁS DEL PLAY	18.293756	-70.582770	18.293277	-70.583116			243.25		486.5
Tramo F	CALLE JUANA HATTON Y CALLE LOS VECINOS	18.291457	-70.583149	18.311559	-70.584309			46.5		93.00
Tramo G	CALLE MELYN	18.290711	-70.583854	18.293432	-70.581339			55.8		111.60
Tramo H	CALLE ALEXIS ELIOT	18.291816	-70.573650	18.294508	-70.574074			65.45		130.9
Tramo I	CALLE PRINCIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ENTRADA DUVERGE	18.294525	-70.574256	18.284321	-70.574054	5.25	1.05	6.9	10.25	13.8
Tramo J	CALLE SAN JOSE	18.294525	-70.574359	18.294508	-70.574074	44.8	0.60		89.6	
Tramo K										
Tramo L										

332.85 1,649.2


5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Levantamiento de esta supervisión es para reportar el cierre y finalización de dichos trabajos

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anejar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,



NOMBRE COMPLETO:

CARLOS MODESTO NAVARRO INOA

CÉDULA:

001-1643975-3

CODIA:

34554

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

15/04/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

