



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 020404
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: AZUA
MUNICIPIO: PADRE LAS CASAS
DISTRITO MUNICIPAL: MONTE BONITO


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de febrero de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. César De Los Santos

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | SECTOR LOS PINO | | | | 117.00 | 1.00 | | 117.00 |
| TRAMO B | SECTOR LOS PINO | 151.10 | 1.00 | 1.00 | 157.20 | 1.00 | 151.10 | 157.20 |
| TRAMO C | SECTOR LA CABULLA | 53.60 | 1.00 | 1.00 | 50.50 | 1.00 | 53.60 | 50.50 |
| TRAMO D | SECTOR LA CABULLA | 126.10 | 1.00 | 1.00 | 153.20 | 1.00 | 126.10 | 153.20 |
| TRAMO E | SECTOR EL CORBANO | 107.10 | 1.00 | 1.00 | 112.10 | 1.00 | 107.10 | 112.10 |
| TRAMO F | SECTOR EL CORBANO | 152.70 | 1.00 | 1.00 | 177.90 | 1.00 | 152.70 | 177.90 |
| TRAMO G | SECTOR EL CORBANO | 173.00 | 1.00 | 1.00 | 173.00 | 1.00 | 173.00 | 173.00 |
| TRAMO H | | | | | | | | |
| TRAMO I | | | | | | | | |
| TRAMO J | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 763.60 | 940.90 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,963,494.03
Monto desembolsado RD\$ 2,963,494.03 (100%)
Avance de obra 114.90%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de febrero de 2023

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PADRE LAS CASAS

DISTRITO MUNICIPAL: MONTE BONITO



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 763,60 metros cuadrados de aceras y 940,90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este distrito esta ejecutando por contrato.
2. Todo lo ejecutado cumple con los parametros recomendados.

IMÁGENES

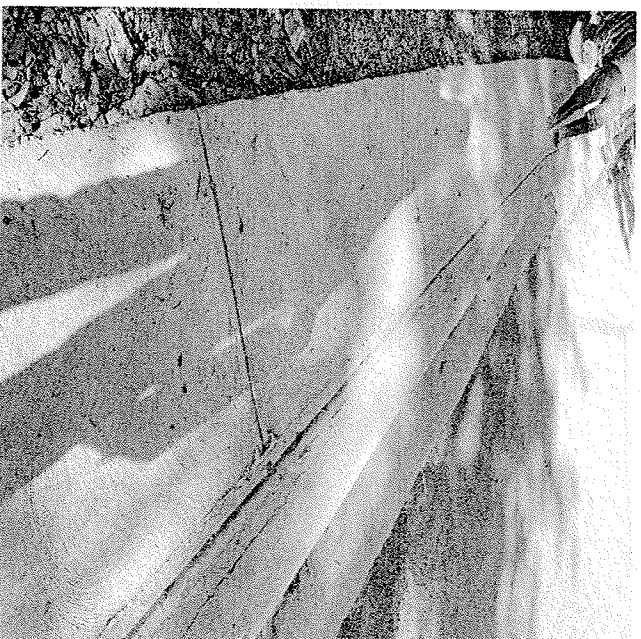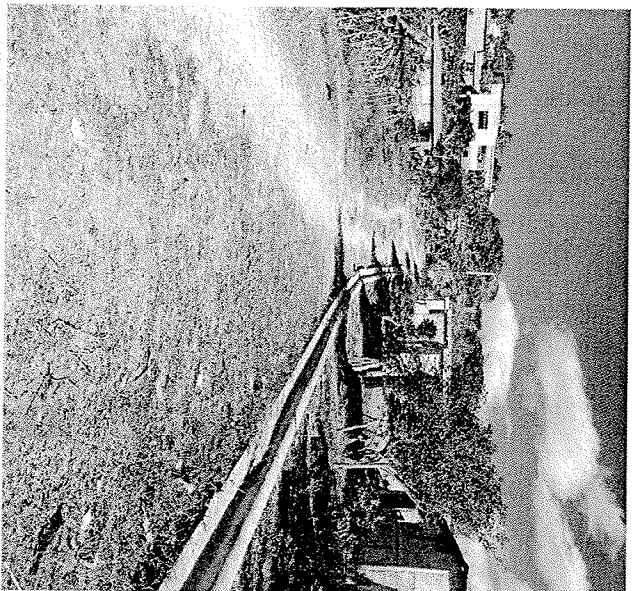





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

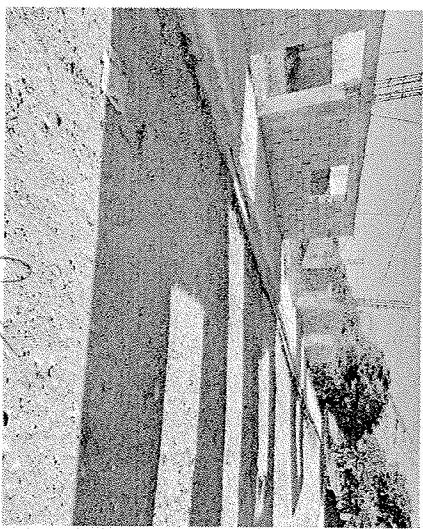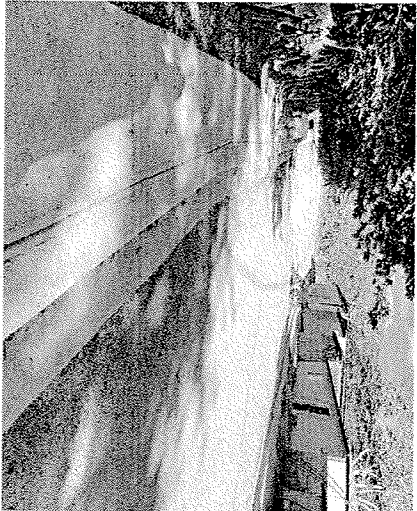

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
