



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 020501

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de octubre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle la mina				67.80	2		135.6
TRAMO B					56.40	2		112.8
TRAMO C					50.10	2		100.2
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	348.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado	RD\$ 4,261,259.34	
Monto desembolsado	RD\$ 2,130,629.67	(50%)
Avance de obra	21.05%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de octubre de 2022

PROVINCIA: AZUA

MUNICIPIO: PERALTA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 12/10/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 348.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 21.05% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este ayuntamiento está construyendo por contrato.
2. Lo presentado aquí es lo construido por el momento.

IMÁGENES

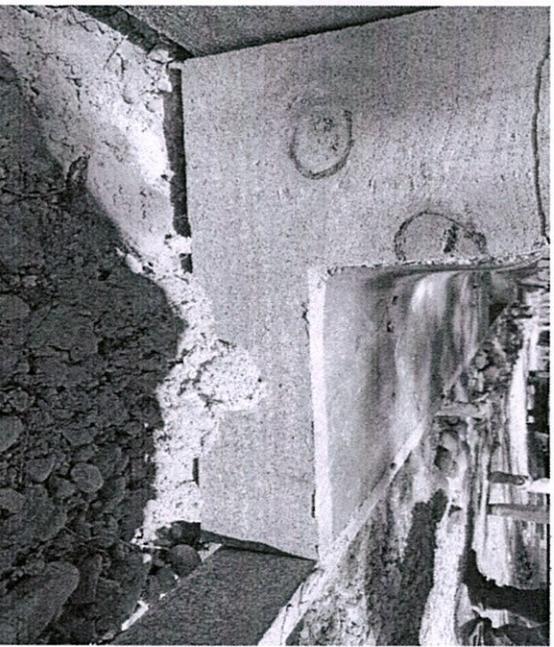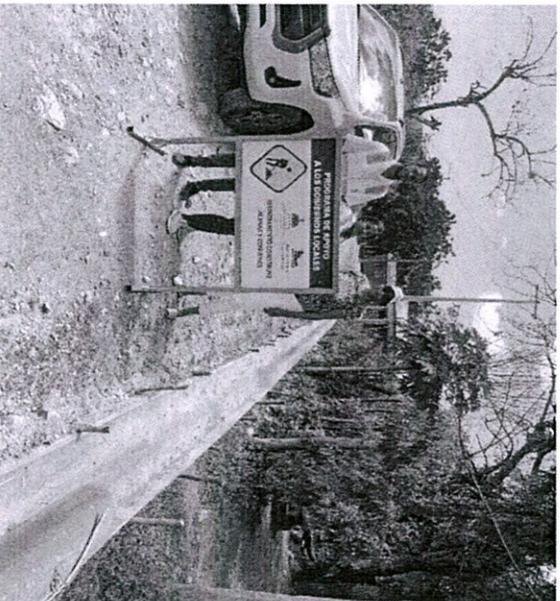



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

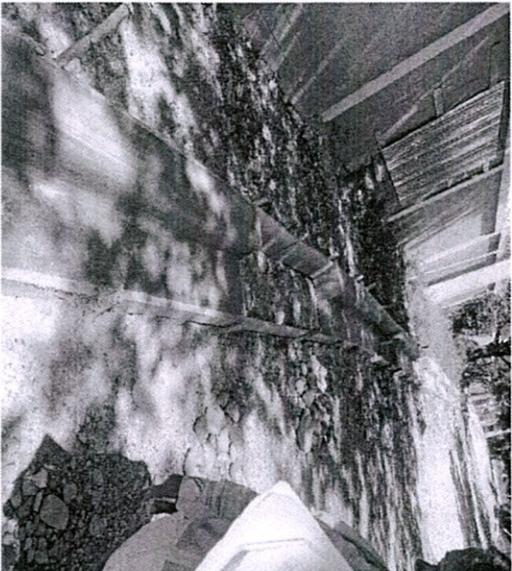

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

