



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030101

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: NEIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PROLOGACION LUIS FELIPE GONZALEZ				423.50	2		847
TRAMO B	CALLE PROYECTO 1				318.30	2		636.6
TRAMO C	CALLE PRIMERO1				247.10	2		494.2
TRAMO D	PROYECTO 2				52.40	2		104.8
TRAMO E	PROLONGACION MELLA 1				303.7	2		607.4
TRAMO F	PROLONGACION MELLA 2				121.3	2		242.6
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	2932.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,546,227.03

Monto desembolsado RD\$ 5,546,227.04 (100%)

Avance de obra 136.98%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022

PROVINCIA: BAHORUCCO

MUNICIPIO: NEIBA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,932.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se realizó vía contrato donde solo construyeron contenes.
2. El proyecto cumple con los estándares recomendado por el programa.
3. Se pudo observar muchas malezas y el relleno cubriendo la base del contén.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

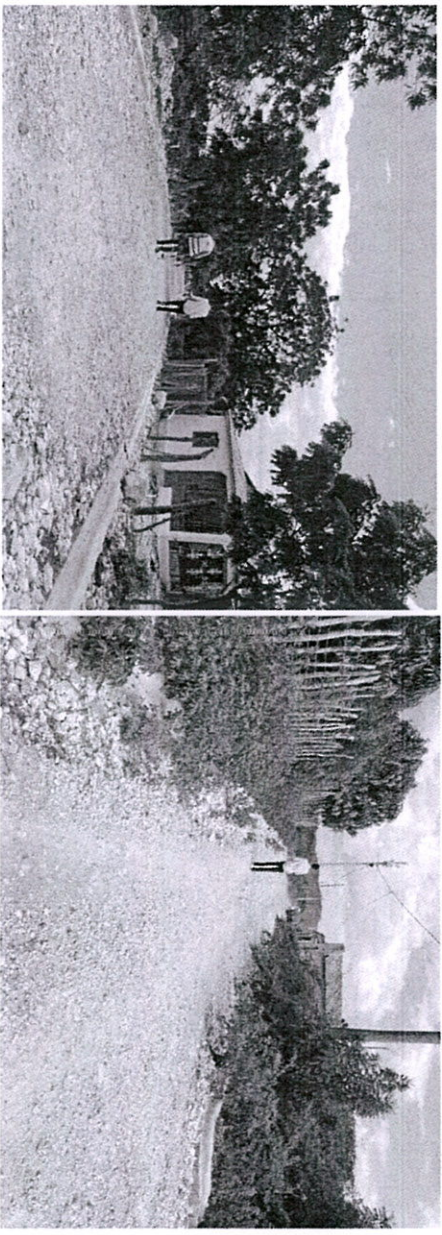

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

