



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030102
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BAHORUCO
MUNICIPIO: NEIBA
DISTRITO MUNICIPAL: EL PALMAR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD LADOS CON CONTENES
TRAMO A	CALLE DEL CORRAL(LA CUCHILLA)				253.40	
TRAMO B	CALLE SEGUNDA				43.00	
TRAMO C	CALLE DE LA IGLESIA				116.10	
TRAMO D	CALLE DE LOS RIELES				328.70	
TRAMO E	CARR. PRINCIPAL				356.48	
Total						

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,626,692.67
Monto desembolsado RD\$ 3,626,692.67 (100%)
Avance de obra 131.35%

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: NEIBA

DISTRITO MUNICIPAL: EL PALMAR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de noviembre de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN



Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,338.88 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. La Obra se ejecutó vía Contrato donde solamente cosntruyeron contenes.
2. El proyecto cumple con los estandares de calidad recomendado por el Programa.

IMÁGENES

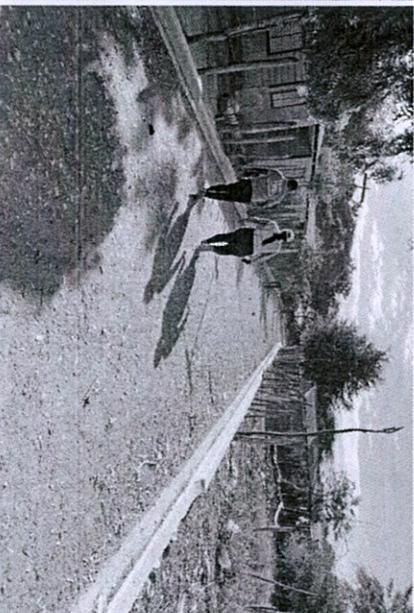

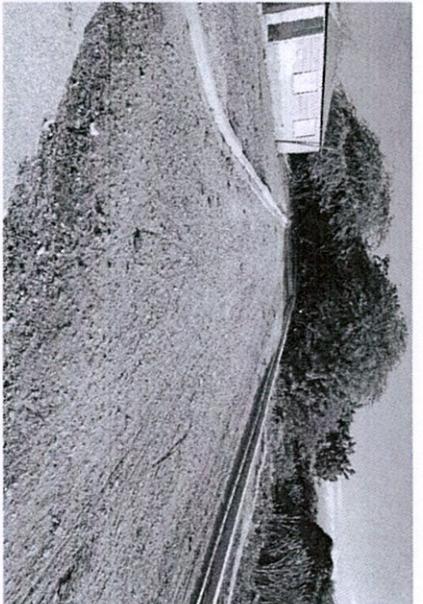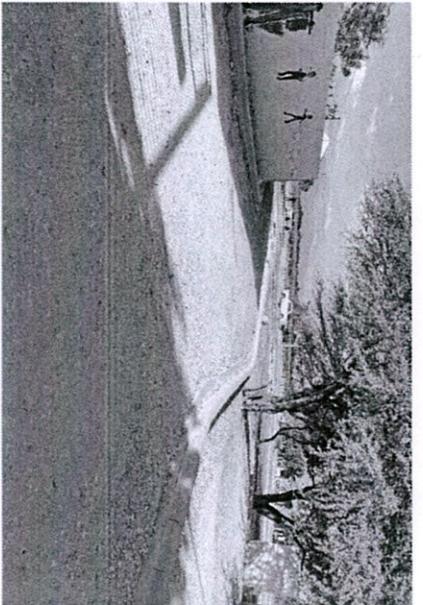

Suministra los datos de este reporte,

Ana Indhira Ramirez
ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico

Daniilo Mercado
ING. DANILLO MERCADO
Técnico

