



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030202

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: GALVÁN

DISTRITO MUNICIPAL: EL SALADO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	VOCA DEL PARMAL (CALLE PRINCIPAL)	230.40	1.04	2.00	14.10	1.00	479.05	14.10
TRAMO B	VOCA DEL PARMAL (CALLE PRINCIPAL)	244.45	1.00	2.00	244.45	2.00	488.90	488.90
TRAMO C	LOS CAYUCOS	75.30	1.00	2.00	75.30	2.00	150.60	150.60
Total							1,118.55	653.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,876,079.79

Monto desembolsado RD\$ 2,876,079.80 (100%)

Avance de obra 108.09%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: GALVÁN

DISTRITO MUNICIPAL: EL SALADO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,118.55 metros cuadrados de aceras y 653.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este gob. Local esta ejecutando esta obra con una calidad buena.
2. Este gob. Local esta ejecutando esta obra por contrato.

IMÁGENES

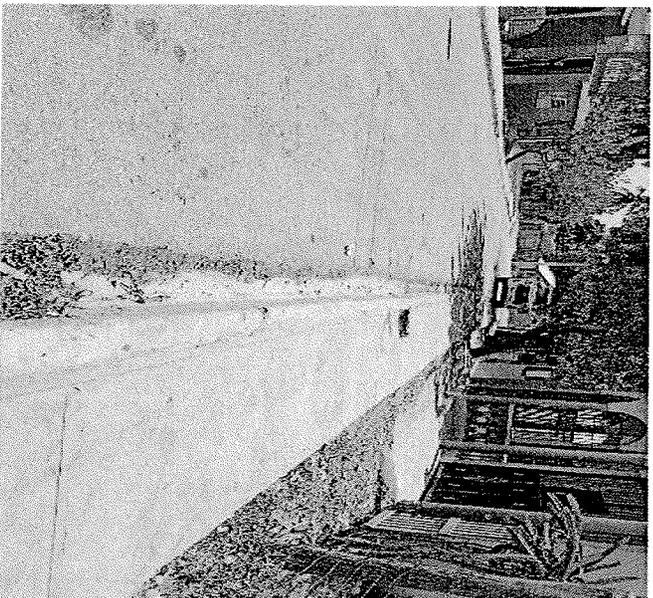




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

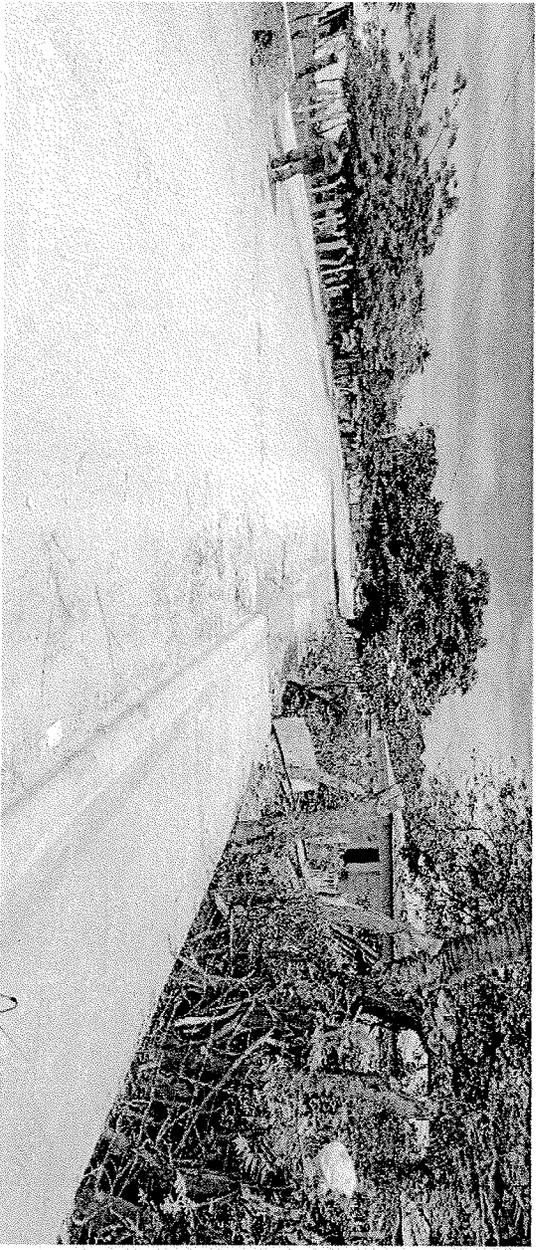

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

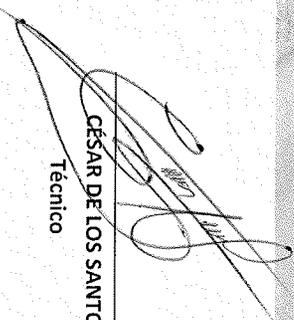
CÉSAR DE LOS SANTOS

Técnico
