

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030305

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: CABEZA DE TORO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de marzo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza

2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE LOLO				165.85	2		331.7
TRAMO B	CALLE OVIDIA	16.00	1.00	1	64.50	2	16	129
TRAMO C	CALLE RESP. 7				76.00	2		152
TRAMO D	CALLE 7				122.80	2		245.6
TRAMO E	CALLE PROYECTO				120	2		240
TRAMO F	CALLE DE CLEMENTE	113.75	0.90	2	111.2	2	204.75	222.4
TRAMO G	CALLE ISRAEL				189.9	2		379.8
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							220.75	1700.50


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,808,729.61

Monto desembolsado RD\$ 2,808,729.61 (100%)

Avance de obra 166.79%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: CABEZA DE TORO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 220.75 metros cuadrados de aceras y 1,700.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada en varias calles del centro del pueblo y del paraje granada.
2. Se pudo observar una buena terminación en la construcción de los contenes.
3. Casi en su totalidad se construyeron contenes.

IMÁGENES

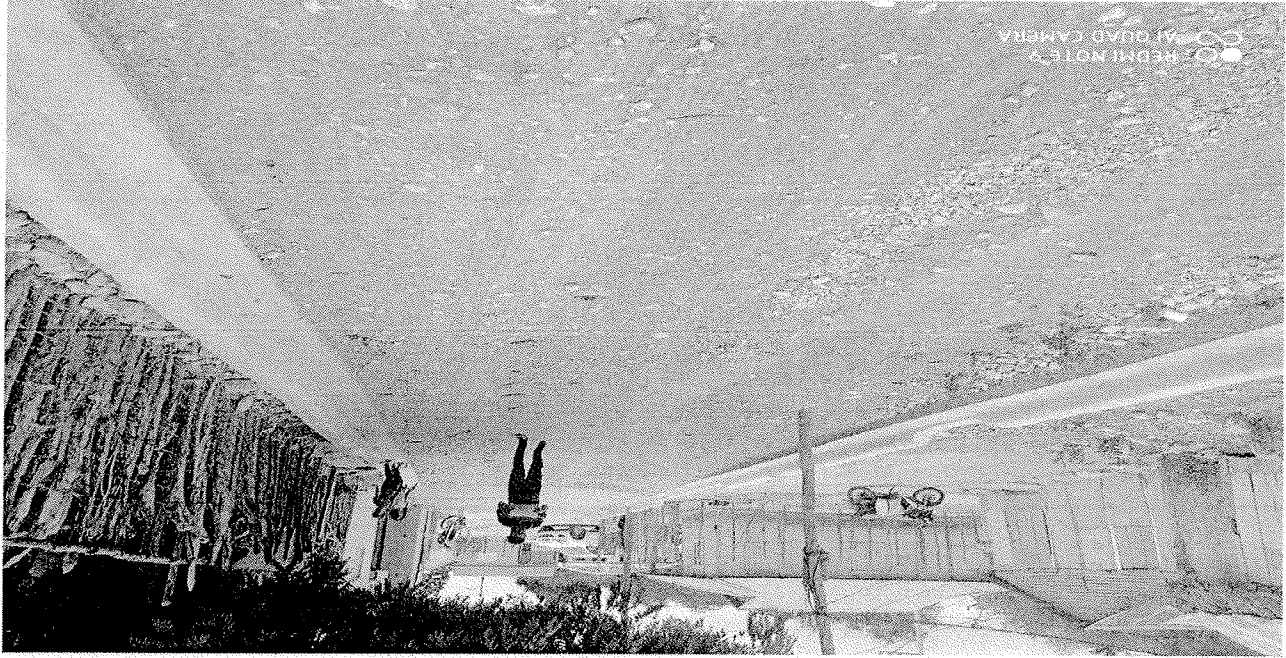


Suministra los datos de este reporte,

Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS

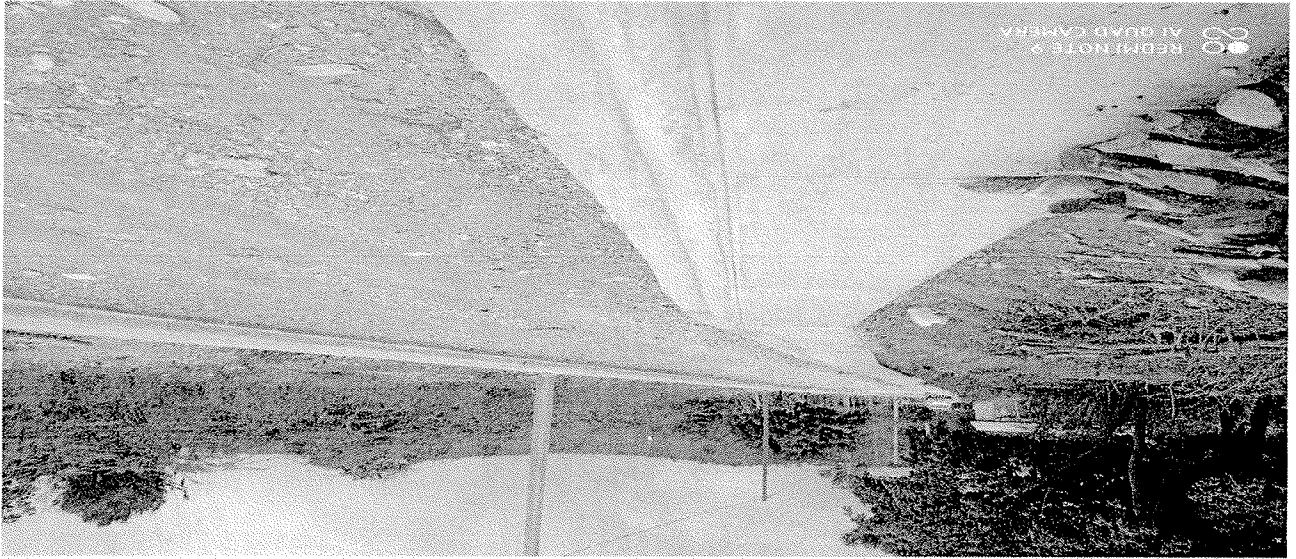

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

