




**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.  
25 de julio de 2023


Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**   
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de la Construcción de un Cementerio en el D.M. Mena**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 21 %

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**

Ingeniera Civil  
Dirección Asesoría Construcciones Municipales

martes, 4 de julio de 2023

## INFORME DE OBRA


### 1. LOCALIZACIÓN

Provincia **BAHORUCO**  
Municipio Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  
Distrito Municipal **DE MENA**  
Barrio y/o sector **CASCO URBANO/CENTRO CIUDAD**

### 2. PROYECTO

Construcción de Cementerio Con Nichos en Hormigón Armado

### 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

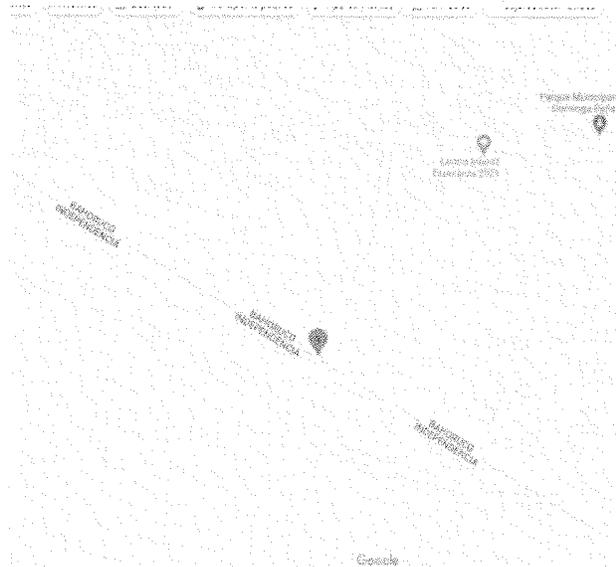

**LATITUD**

18.334351,-71.209862

**LONGITUD**

18.334351, -71.209862

#### 4. ALCANCE DEL PROYECTO

Brindar la comodidad y las mejores facilidades a todas las familias de la localidad, en esos momentos tan necesarios.

#### 5. CONDICIONES DEL TERRENO

Es un suelo arenoso, y las condiciones del terreno no son las mas optimas, ya que el proyecto contempla un terreno en las mejores condiciones para construir y en la realidad la topografía está accidentada. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

#### 6. OBSERVACIONES


Debido a la falta de alineamiento del terreno utilizado, y de problemáticas con los colindantes, los muros no están alineados de la mejor manera.

#### Nota:

Anexo podrán encontrar todos los reportes de seguimiento de avance y cubicaciones levantadas en esta obra.

#### 7. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
**ING. YONATAN TALABERA M.**  
Codia:32038  
Cedula:066-0022819-8  
SUPERVISOR

  
\_\_\_\_\_  
**BRANDY DEBARISTO CUEVAS**  
ALCALDE



## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 1. Datos Generales

<b>Título del Proyecto</b>	Construcción de Cementerio Con Nichos en Hormigón Armado	
<b>Nombre de la autoridad municipal:</b>	Brandy Debaristo Cuevas	
<b>Gobierno Local:</b>	Distrito Municipal de Mena	
<b>Supervisor que prepara el reporte:</b>	Ing. Yonatan Talabera M	
<b>Fecha de inicio del proyecto:</b>	<b>Fecha de finalización del proyecto:</b>	<b>Fecha de elaboración del reporte de Avance actual:</b>
03/06/2023	30/09/2023	04/07/2023

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

**Fecha de elaboración de Informes anteriores**

Informe 1:

Informe 2:

Informe 3:

Informe 4:

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 2. Actividades

#### 2.1 Cronograma de Actividades

*Copiar el cronograma/ o en su defecto partidas y subpartidas presupuestadas y validadas por el gobierno local, tal y como se elaboró en el documento de proyecto. Señalar con distintos colores aquellas actividades/partidas que se han realizado y aquellas que están en ejecución.*

## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

### 2.2 Actividades realizadas

Partidas o tareas	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Porcentaje de ejecución física de Avance %	Observaciones
<i>Según presupuesto del proyecto</i>			<i>Actividad realizada hasta la fecha de elaboración del presente Informe</i>	<i>Porcentaje o grado de avance del indicador</i>	<i>Comentarios sobre posibles modificaciones, ajustes o cambios respecto a lo planificado</i>
Preliminares, Limpieza del Solar, Movimientos de Tierra, Hormigon Armado, Verja perimetral.	03/06/2023	30/09/2023	12	21%	El muro perimetral presenta cambio en la alineación, debido a problemáticas con los colindantes, y para el mejor aprovechamiento del terreno.

Informe de Avance de Proyectos en el Marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales Para Obras de


## REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN		
<b>2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto</b>		
Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Observaciones
Terreno ondulado y deslineado	Seguir la topografía del terreno y su forma	Se mantiene la armonía en el entorno, y se aprovecha mejor el espacio.
<b>3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto</b>		
Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
Ponerse de acuerdo con los colindantes.	Construir de acuerdo a la forma del solar proporcionado para el proyecto y así proporcionar la paz en el entorno.	Mantener buenas relaciones con los comunitarios.

Anexos: evidencias fotográficas en orden cronológico y con descripción de partidas

**1. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:**

  
ING. YONATAN TALABERA M




  
BRANDY DEBARISTO CUEVAS  
ALCALDE

Codia:

Cedula:

**SUPERVISOR**


TRABAJOS VARIOS

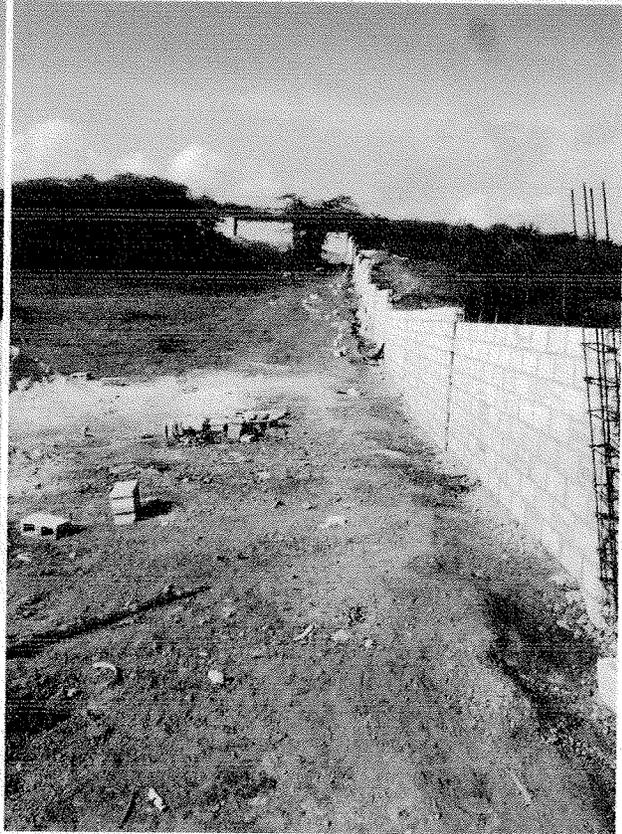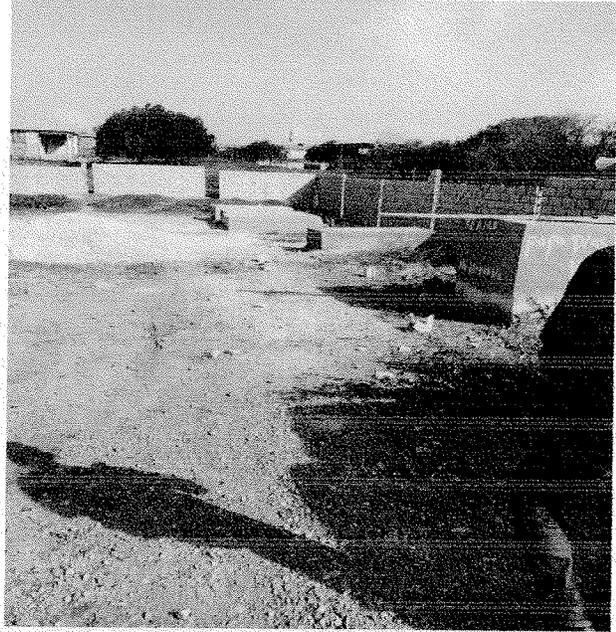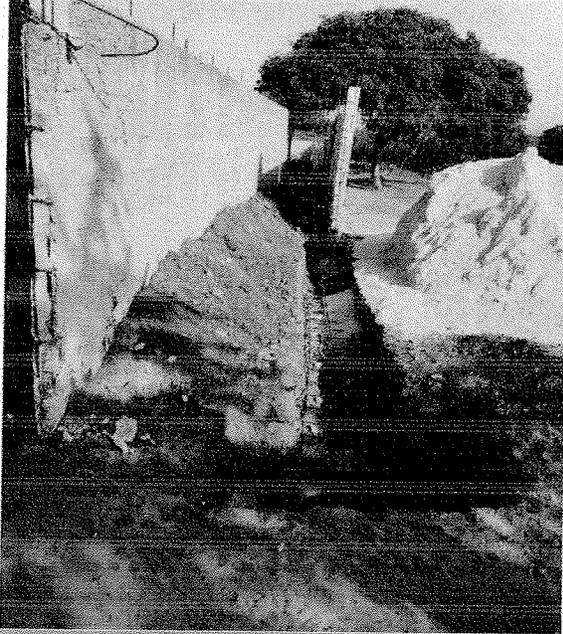



Infraestructuras de Competencia Municipal Página





**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CEDIA)**

**APELLIDOS:**


Talavera Medina

**NOMBRES:**

Yonatan

**PROFESION:**

Ing. Civil



EXEQUATUR 76

DIF: 06/03/2015

CEDULA: 066-0022819-8

COLEGIATURA: 32038

Firma colegiado

Firma Presidente
