

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 030306

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: MENA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de marzo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

2. Arq. Keilin Mora

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | CALLE 17 DE JULIO | 83.50 | 1.00 | 2 | 83.50 | 2 | 167 | 167 |
| TRAMO B | CALLE ANGEL RAMIREZ | 114.20 | 1.00 | 2 | 114.20 | 2 | 228.4 | 228.4 |
| TRAMO C | CALLE CARMEN DE LA CRUZ | 26.35 | 1.00 | 2 | | | 52.7 | |
| TRAMO D | CALLE CARMEN DE LA CRUZ | 13.50 | 1.00 | 1 | | | 13.5 | |
| TRAMO E | CALLE PRIMERA | 71.80 | 1.00 | 2 | | | 143.6 | |
| TRAMO F | CALLE MARGARITA FERANCO | 93.95 | 1.00 | 2 | | | 187.9 | |
| TRAMO G | CALLE MARGARITA FERANCO | 24.30 | 1.00 | 2 | 49.8 | 1 | 48.6 | 49.8 |
| TRAMO H | CALLE MARGARITA FERANCO | 21.90 | 1.00 | 1 | 21.9 | 1 | 21.9 | 21.9 |
| TRAMO I | CALLE MARGARITA FERANCO | 32.90 | 1.00 | 2 | 30.2 | 2 | 65.8 | 60.4 |
| TRAMO J | CALLE MARGARITA FERANCO | 30.35 | 1.00 | 2 | | | 60.7 | |
| TRAMO K | CALLE PRINCIPAL A | 119.60 | 1.19 | 1 | 119.6 | 1 | 142.324 | 119.6 |
| TRAMO L | CALLE PRINCIPAL B | 150.60 | 1.15 | 1 | 11.9 | 1 | 173.19 | 11.9 |
| Total | | | | | | | 1305.61 | 659.00 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,866,318.89

Monto desembolsado RD\$ 2,866,318.90 (100%)

Avance de obra 117.21%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de marzo de 2023

PROVINCIA: BAHORUCO

MUNICIPIO: TAMAYO

DISTRITO MUNICIPAL: MENA

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,305.61 metros cuadrados de aceras y 659.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Con este levantamiento se completó el programa y tiene una buena terminación de la obra.
2. La obra tiene buena ejecución y terminación de estas aceras y contenes.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

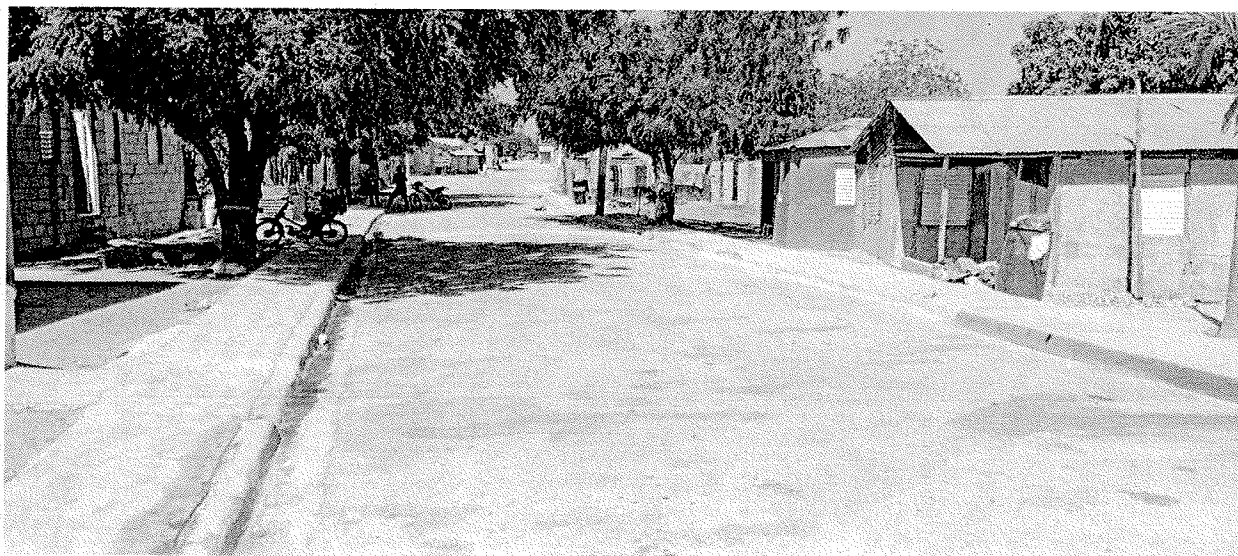

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Técnico
