

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040102
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: BARAHONA
DISTRITO MUNICIPAL: EL CACHÓN


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de octubre de 2022

TÉCNICOS:
 1. Arq. Zúñilda Del Rosario
 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Entrada al Bañeario los Almendros	30.15	0.86	2	118.90	2	51.858	237.8
TRAMO B	Calle Justa Cuello				123.00	2		246
TRAMO C	Los Almendros (Varias Calles)				46.00	1		46
TRAMO D	Sección Los Callejones				390.50	2		781
TRAMO E	Sector: Barrio Nuevo Calle Jose Joaquin Perez				71.45	2		142.9
TRAMO F	Calle 11 de Febrero				102.25	2		204.5
TRAMO G	Calle B				163.25	2		326.5
TRAMO H	Calle A				71.2	2		142.4
Total							51.86	2127.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,828,468.31
 Monto desembolsado RD\$ 2,828,468.31 (100%)
 Avance de obra 197.14%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: BARAHONA
MUNICIPIO: BARAHONA
DISTRITO MUNICIPAL: EL CACHÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de octubre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 51.86 metros cuadrados de aceras y 2,127.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta ejecución esta muy bien realizada, en cuanto a la inspección observamos que todo esta bien.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

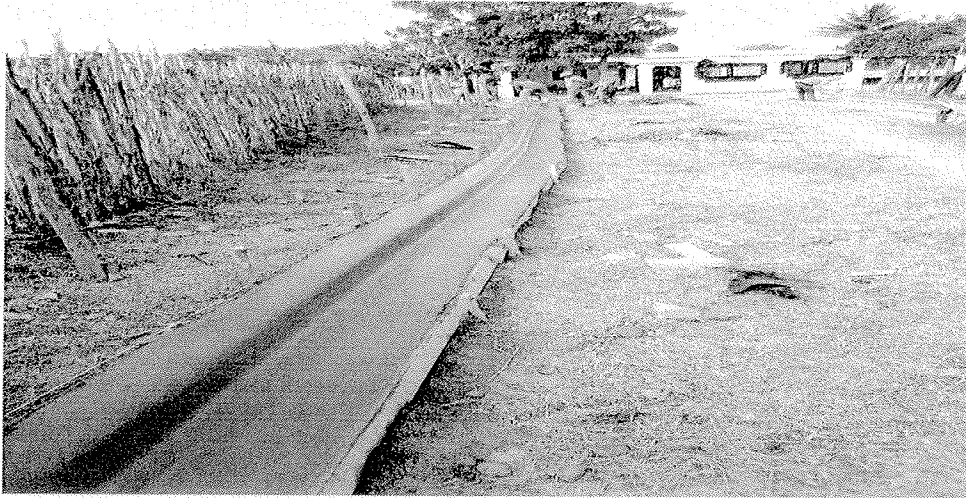

Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario C.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Keilin Mora

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

