

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 040103

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: BARAHONA

MUNICIPIO: BARAHONA

DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁZARA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Arq. Zunilda Del Rosario

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA CARRETERA, CALLE DUARTE	142.50	1.00	2	11.05	2	284.54	22.1
ТКАМО В	SECTOR EL 3, CALLE BERTA PIMENTEL	194.90	1.01	2			394.36	
TRAMO C	SECTOR EL 3, CALLE SR. GILBERTO FELIZ				71.85	2		143.7
TRAMO D	SECTOR LOS MAMEYES, CALLE ROSENDO GARO	115.40	1.03	2			237.56	
TRAMO E	SECTOR LOS MAMEYES, CALLE RAFAEL GARO	21.50	1.19	2	17.8	2	51.18	35.6
TRAMO F	SECTOR BARRIO LOS MAESTROS, CALLE RAMONA FELIZ				80.55	2		161.1
TRAMO G	SECTOR LA Q, CALLE 1				121.5	2		243
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total	entrol (1998) Problem hall som blev betreven der og vinner bleven britisk om grev halve som benem bleven som bleven som stagen have begre benem som bleven betreven bleven betreven bleven betreven bleven betreven bleven	province a committee of constitutional section of the constitution	ann an an m-thaong mga tarahana, ann an ann an tarahan (gair) an dean aige an a	meno manamana fi an sama maya a si fali mana fani (a fali fali fali fali fali fali fali fal		a Phina a me'anna dia mananana da dari dan dan binana di dari dan da dilikula da Elizabia da Elizabia da Candh	967.64	605.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,811,766.33

Monto desembolsado RD\$

2,811,766.34 (100%)

Avance de obra 99.34%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023

MUNICIPIO: BARAHONA PROVINCIA: BARAHONA

DISTRITO MUNICIPAL: LA GUÁZARA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada. Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 967.64 metros cuadrados de aceras y 605.50

NOTAS


- Las aceras y contenes se construyeron bajo los parámetros de construcción recomendados.
- Se construyeron más aceras que contenes debido a que en muchos tramos ya existían contenes.

IMÁGENES







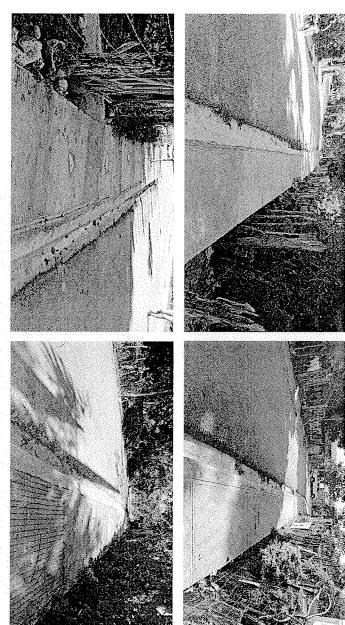

Suministra los datos de este reporte,

ING. EDWARD ACOSTA Técnico

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO Técnico Dul Reservo 6.
