

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 050102
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: DALABÓN
MUNICIPIO: DALABÓN
DISTRITO MUNICIPAL: CAÑONGO


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de mayo de 2023
1. Ing. Ana Indhira Rámirez
TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRINCIPAL, CASCO URBANO}				358.20	1		358.2
TRAMO B	C/1 ERA, BARRIO RAFAEL JIMENEZ				232.50	1		232.5
TRAMO C	C/PRINCIPAL, SECTOR LA COLONIA JAPONESA	197.40	1.13	1	201.40	1	223.062	201.4
TRAMO D	ENTRADA AL CEMENTERIO	147.10	1.00	2	323.95	2	294.2	647.9
TRAMO E	CALLE RAFAEL JIMENEZ A	39.20	1.00	1	116	2	39.2	232
TRAMO F	CALLE RAFAEL JIMENEZ B				118.3	2		236.6
TRAMO G	COLONIA JAPONESA CALLE PRINCIPAL	189.50	1.35	1	359.9	1	255.825	359.9
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							812.29	2268.50


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,913,062.74
Monto desembolsado RD\$ 2,913,062.75 (100%)
Avance de obra 230.97%



Suministra los datos de este reporte,

ING. ANA INDHIRA RAMIREZ


Técnico

ARO. KEILIN MORA


Técnico

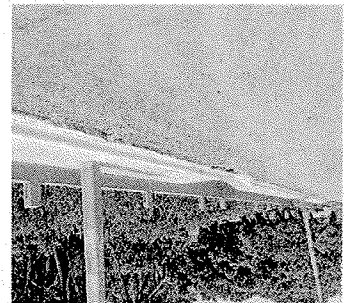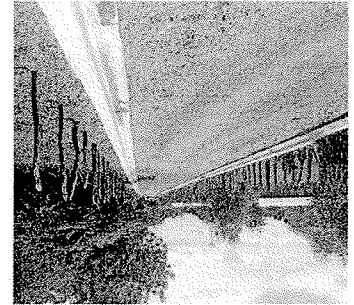

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

