



# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 060101

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. César De Los Santos

TÉCNICOS:


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	FRANKLIN IMBERT	37.00	1.00	2	37.00	2	74	74
TRAMO B	FRANKLIN IMBERT	91.50	1.00	2	91.50	2	183	183
TRAMO C	FRANKLIN IMBERT	70.45	1.00	2	70.45	2	140.9	140.9
TRAMO D	FRANKLIN IMBERT	115.00	1.00	2	115	2	230	230
TRAMO E	FRANKLIN IMBERT				103.15	2		206.3
TRAMO F	FRANKLIN IMBERT				68.6	1		68.6
TRAMO G	FRANKLIN IMBERT	52.70	1.00	1	52.7	1	52.7	52.7
TRAMO H	FRANKLIN IMBERT	20.90	1.00	1	30.45	1	20.9	30.45
TRAMO I	FRANKLIN IMBERT	71.70	1.00	2	71.7	2	143.4	143.4
TRAMO J	FRANKLIN IMBERT	22.32	1.00	1	22.32	1	22.32	22.32
TRAMO DL	Sec. Los Jardines 3era. etapa	190.00	1.00	1	190	1	190	190
TRAMO DM	Sec. Los Jardines 2da. etapa	175.75	1.00	2	175.75	2	351.5	351.5
TRAMO DN	Sec. Jerusalen	45.00	1.00	1			45	
TRAMO DO	Sec. Las Caobas C/ e	155.80	1.00	2	155.8	2	311.6	311.6
TRAMO DP	Sec. Los Toros, Col. Perez C/ 1era	613.20	1.00	1	613.2	1	613.2	613.2
TRAMO DQ	Sec. Madeja 2da. Etapa	176.10	1.00	2	176.1	2	352.2	352.2
TRAMO DR	Bijao Adentro	370.40	1.00	1	370.4	1	370.4	370.4
TRAMO DS	Sec. Valle Verde	230.00	1.00	2	407.4	1	440	407.4
TRAMO DT	Sec. Mata Larga	150.00	1.00	1	300	1		300
TRAMO DU								
Total							3542.12	4047.97

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 18,821,370.53

Monto desembolsado RD\$ 18,821,370.54 (100%)

Avance de obra 82.50%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de marzo de 2023

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: -



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,486.36 metros cuadrados de aceras y 4,029.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS




1. Este ayuntamiento esta construyendo por contrato.
2. Hasta el momento lo ejecutado cumple con los parametros recomendados.
3. En este levantamiento estuvieron presente las autoridades del ayuntamiento.

### IMÁGENES

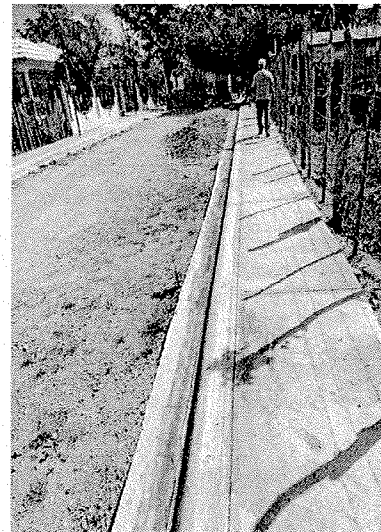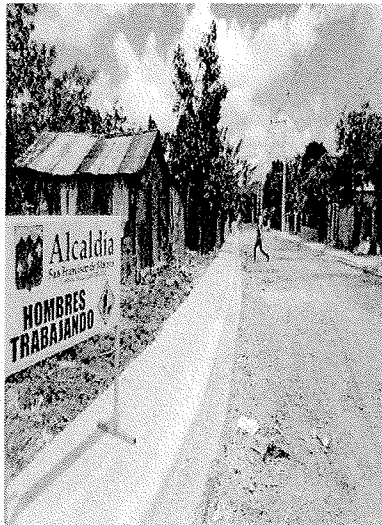





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

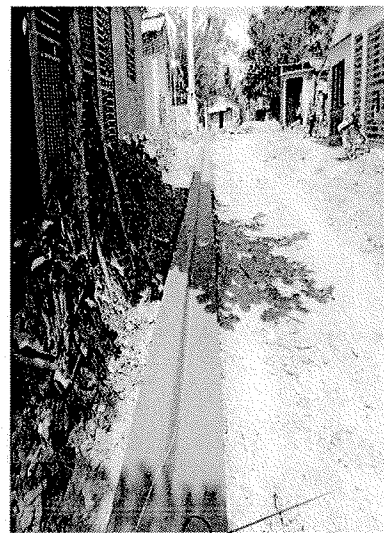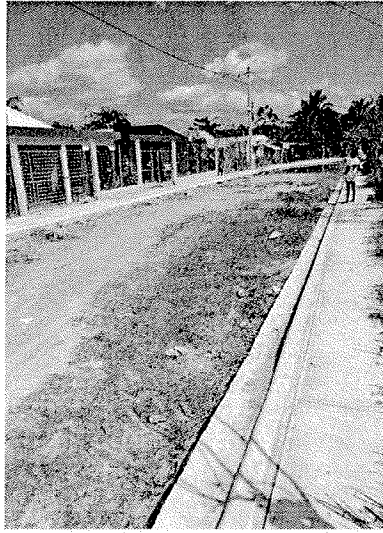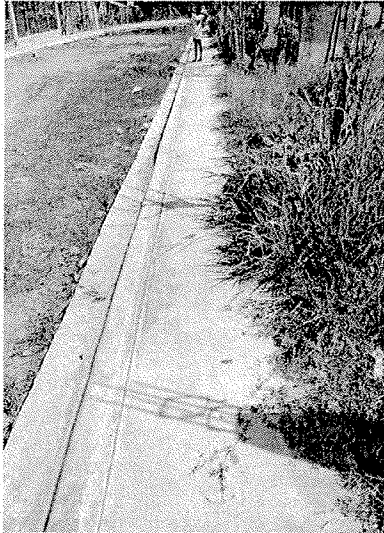

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico
