



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060104

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: JAYA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de mayo de 2023

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ María auxiliadora, Sect. Leona.				126.70	2.00		253.40
TRAMO B	C/ 2da.				48.60	2.00		97.20
TRAMO C	C/ Los Burgos, Sect. Los Burgos				258.60	2.00		517.20
TRAMO D	Callejón Los Burgos				69.40	2.00		138.80
TRAMO E	C/ Principal				24.60	1.00		24.60
TRAMO F	C/ Espinal Ramón, Sec. Los Espinales				243.50	2.00		487.00
TRAMO G	Sec. Mata vieja Cafetería D' J.C.				110.90	2.00		221.80
TRAMO H	Sec. Mata vieja				56.40	2.00		112.80
TRAMO I	Sec. La Laguna (Loma de la jaya)				243.65	2.00		487.30
TRAMO J	C/ 2da				36.10	2.00		72.20
Total							-	2,412.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,199,924.62

Monto desembolsado RD\$ 3,199,924.62 (100%)

Avance de obra 201.91%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de mayo de 2023

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: JAYA


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,412.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La obra se realizó por Administración.
2. Los contenes levantado cumple con los estándares calidad recomendado por el Programa.
3. El ancho de aceras se construyó por debajo del metro(1 m) debido a que los beneficiarios no cedieron el metro de terreno para la construcción de la misma.


IMÁGENES

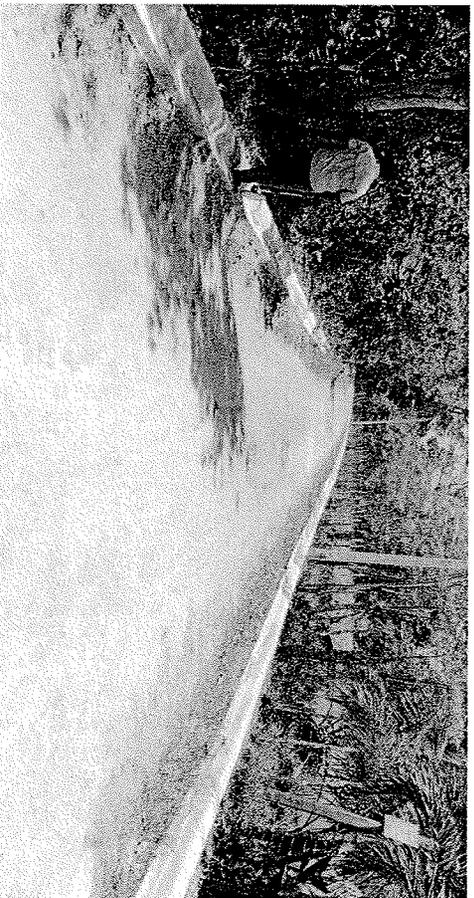




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

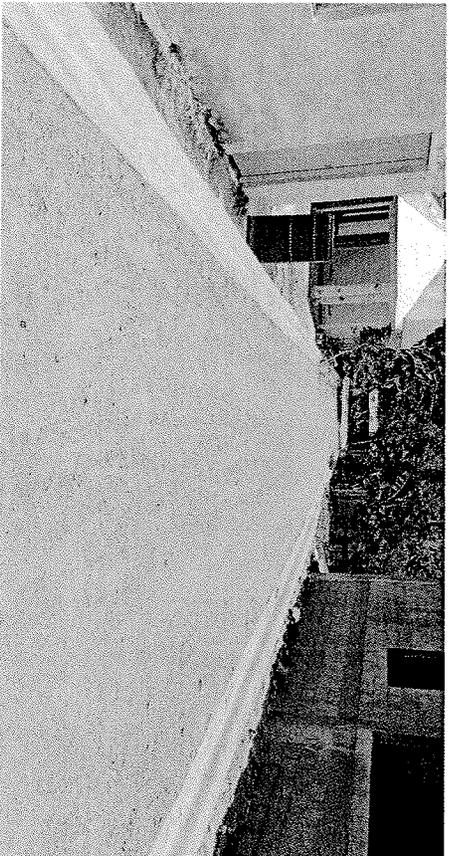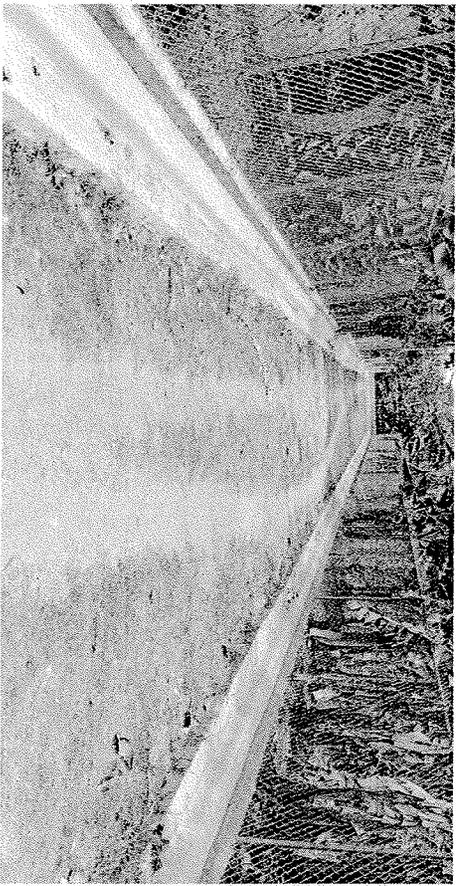





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

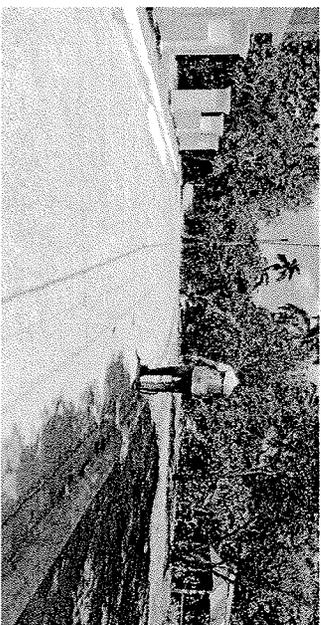

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
