

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060201

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: ARENOSO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de julio de 2022

SUPERVISOR: CRISTIAN JUSTO AQUINO

CODIA: 37847

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ANTONIO CORDOBA	35.67	1.00	1	35.67	1	35.67	35.67
TRAMO B	C/ANTONIO CORDOBA	38.56	1.00	1	38.56	1	38.56	38.56
TRAMO C	C/ANTONIO CORDOBA	37.19	1.00	1	37.19	1	37.19	37.19
TRAMO D	C/TRES FIERAS	119.51	1.00	1	119.51	1	119.51	119.51
TRAMO E	C/ANTONIO CORDOBA	16.70	1.00	1	16.7	1	16.7	16.7
TRAMO F	C/TRES FIERAS				133.14	1		133.14
TRAMO G	C/ANTONIO CORDOBA	11.73	1.00	1	11.73	1	11.73	11.73
TRAMO H	C/MARIA	58.07	0.86	1	131.85	1	49.9402	131.85
TRAMO I	C/MARIA				70.57	1		70.57
TRAMO J	C/BRISA DEL YUNA	43.59	1.00	1	43.59	1	43.59	43.59
TRAMO K	C/BRISA DEL YUNA	34.96	1.00	1	34.96	1	34.96	34.96
TRAMO L	C/ANTONIO CORDOBA	111.00	1.10	1	111	1	122.1	111
TRAMO M	C/ANTONIO CORDOBA	31.50	1.10	1	31.5	1	34.65	31.5
TRAMO N	C/DUARTE	16.40	1.85	1	16.4	1	30.34	16.4
TRAMO O	C/DUARTE	96.00	1.00	1	96	1	96	96
TRAMO P	C/DUARTE	71.50	1.00	1	71.5	1	71.5	71.5
TRAMO Q	C/DUARTE	29.40	1.12	1	29.4	1	32.928	29.4
TRAMO R	C/DUARTE	106.90	1.08	1	106.9	1	115.452	106.9
TRAMO S	C/SAMUEL SANTANA	34.00	0.74	1	34	1	25.16	34
TRAMO T	C/SAMUEL SANTANA	35.50	1.12	1	35.5	1	39.76	35.5
Total							955.74	1205.67

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,071,189.25

Monto desembolsado RD\$ 3,071,189.25 (100%)

Avance de obra 146.30%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23 de julio de 2022

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: ARENOSO

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 955.74 metros cuadrados de aceras y 1,205.67 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.


IMÁGENES

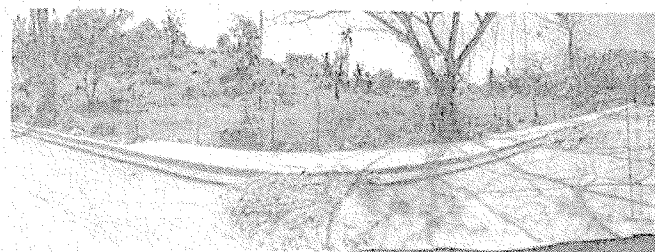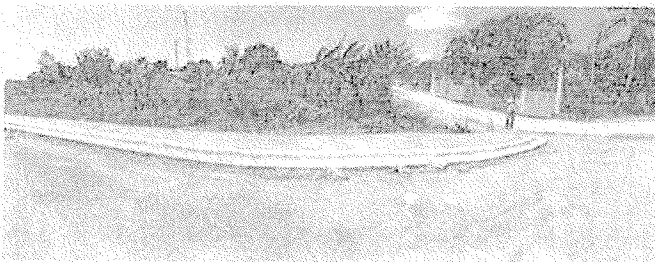



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

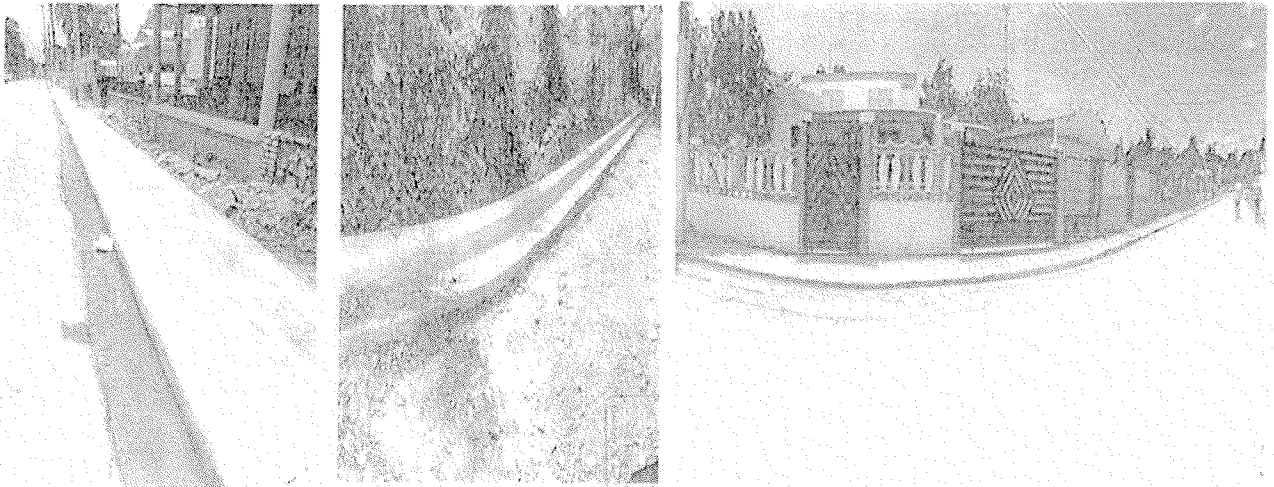



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Arq. Yarissa Pérez
Técnico

