

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070101
REGION: EL VALLE
PROVINCIA: ELÍAS PIÑA
MUNICIPIO: COMENDADOR
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de enero de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	calle 1	112.20	1.00	2			224.4	
TRAMO B	calle 2	58.40	0.80	2			93.44	
TRAMO C	calle 3	207.90	0.90	2			374.22	
TRAMO D	calle 4	111.90	1.00	2			223.8	
TRAMO E	calle 5	101.70	1.04	2			211.536	
TRAMO F	calle 6	69.80	0.70	2			89.32	
TRAMO G	CALLE PRIMERA				48.7	2		97.4
TRAMO H	CALLE PRIMERA				46	2		92
TRAMO I	CALLE PRIMERA				45.6	2		91.2
TRAMO J	CALLE SEGUNDA				35	2		70
TRAMO K	CALLE TERCERA				38.6	2		77.2
TRAMO L	CALLE CUARTA				58.7	2		117.4
TRAMO M	CALLE CUARTA				43.3	1		43.3
TRAMO N	CALLE CUARTA				42.2	1		42.2
TRAMO O	CALLE QUINTA				84.1	2		168.2
TRAMO P	CALLE SEXTA				104.5	2		209
TRAMO Q	CALLE SEXTA				48.2	2		96.4
TRAMO R	CALLE SÉPTIMA				45.5	2		91
TRAMO S	CALLE OCTAVA				119.5	2		239
Total							1216.72	1434.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,704,512.46
 Monto desembolsado RD\$ 2,352,256.24 (50%)
 Avance de obra 108.28%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de enero de 2022

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: COMENDADOR

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,216.72 metros cuadrados de aceras y 1,434.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Algunas partes del relleno sobrepasan las dimensiones del espesor.
2. Algunas esquinas fueron demolidas por otros usuarios.
3. La obra fue ejecutada por contrato.
4. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.

IMÁGENES

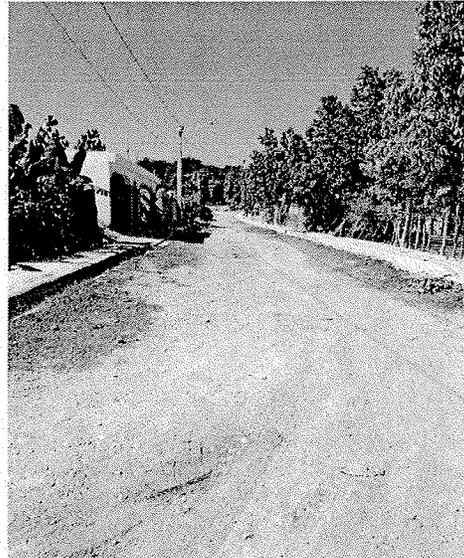



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

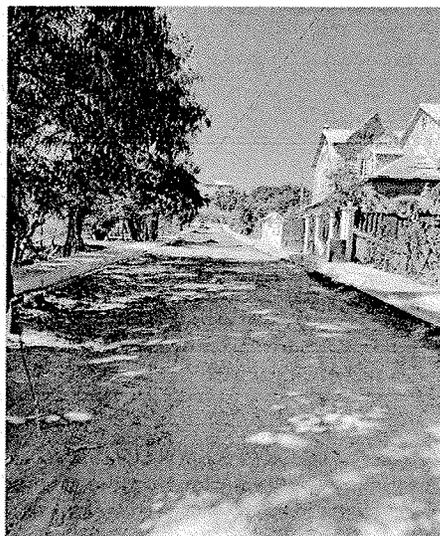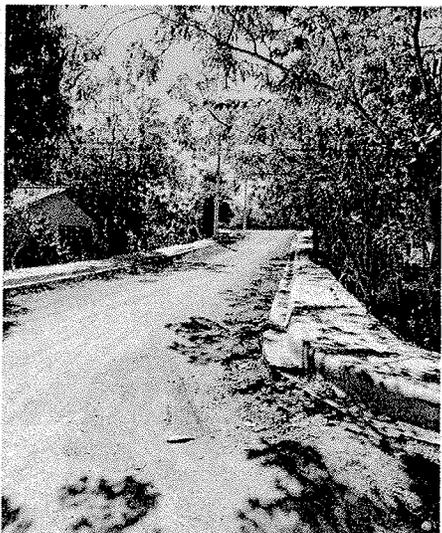

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

FELIPE REYES

Técnico

