



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070201

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: BÁNICA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de noviembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA RECTA	433.30	1.01	2	432.30	2	871.8300003	864.6
Total							871.83	864.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,840,181.38
Monto desembolsado RD\$ 2,835,626.30 (100%)
Avance de obra 114.12%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de noviembre de 2022

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: BÁNICA

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 871.83 metros cuadrados de aceras y 864.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. Una muy buena terminación y calidad en las aceras y contenes.
3. Todo fue ejecutado en un solo sector.

IMÁGENES

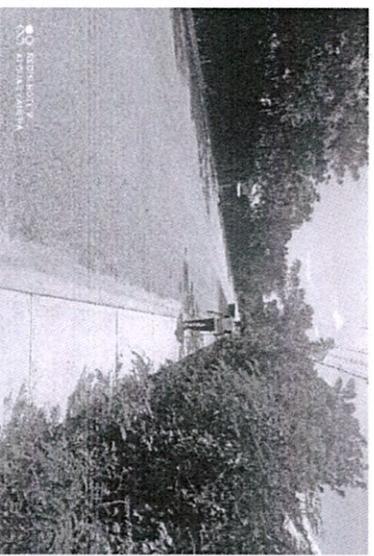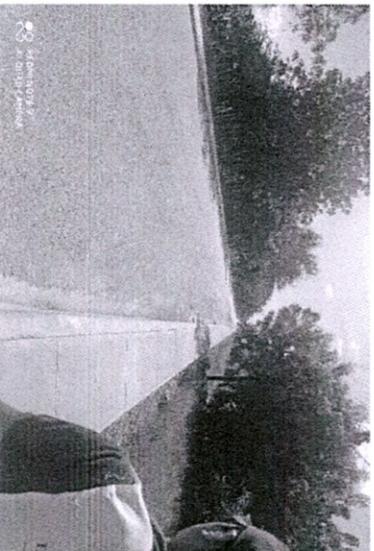




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,



ING. STÁYLIN MENDOZA

Técnico



FELIPE REYES

Técnico

