



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 070203

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 28 de julio de 2022

**REGIÓN:** EL VALLE

**PROVINCIA:** ELÍAS PIÑA

**SUPERVISOR:** Ing. Americo Rosario Diaz

**MUNICIPIO:** BÁNICA

**CODIA:** 28268

**DISTRITO MUNICIPAL:** SABANA HIGÜERO

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LUIS CONTRERAS	1,186.30	1.30	1			1542.19	
TRAMO B	LUIS CONTRERAS	1,186.30	0.20	1	1,186.30	1	237.26	1186.3
Total							1779.45	1186.30

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,852,436.73

Monto desembolsado RD\$ 2,852,436.73 (100%)

Avance de obra 181.07%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: EL VALLE**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de julio de 2022**

**PROVINCIA: ELÍAS PIÑA**

**MUNICIPIO: BÁNICA**



**DISTRITO MUNICIPAL: SABANA HIGÜERO**

## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,779.45 metros cuadrados de aceras y 1,186.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.




### **NOTAS**

1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.

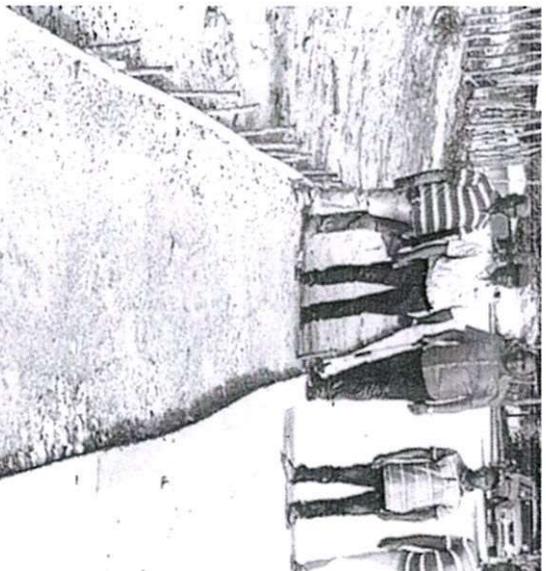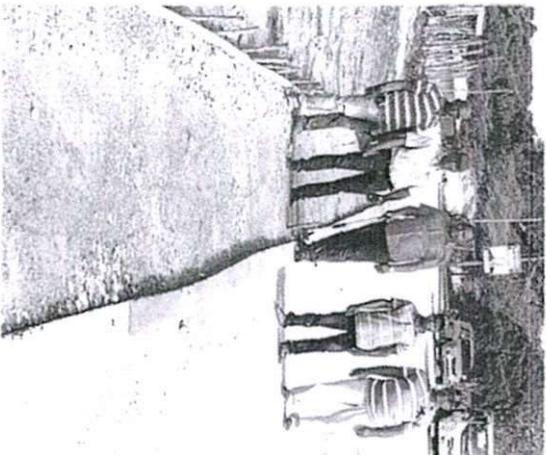

**IMÁGENES**

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

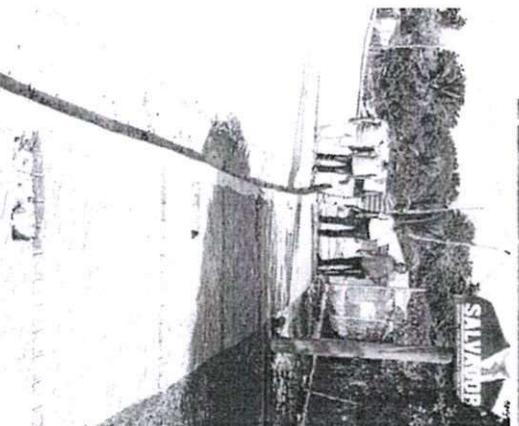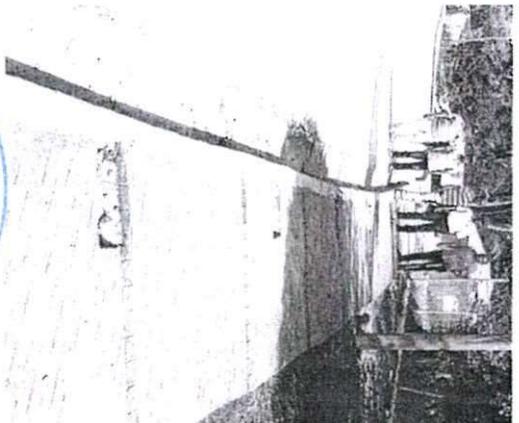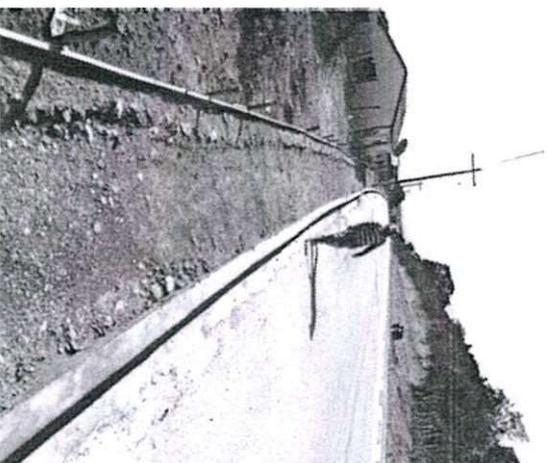

Suministra los datos de este reporte,



Arq. Yajassa Pérez  
Técnico
