



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


**CODIGO:** 070302  
**REGIÓN:** EL VALLE  
**PROVINCIA:** ELÍAS PIÑA  
**MUNICIPIO:** EL LLANO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** GUANITO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 19 de enero de 2023  
**TÉCNICOS:** 1. Ing. Ana Indhira Rámirez  
2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL (FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO CELINDA JIMENEZ)	138.00	1.00	1.00	138.00	1.00	138.00	138.00
TRAMO B	CARRETERA PRINCIPAL (FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO CELINDA JIMENEZ)	84.70	1.81	1.00	87.70	1.00	153.31	87.70
TRAMO C	SECTOR LOS ARROYOS (CALLE ESCUELA LATERAL DERECHO)	26.80	1.00	1.00	46.20	2.00	26.80	92.40
TRAMO D	CALLE ATRÁS DE LA ESCUELA	71.30	1.03	2.00	71.30	2.00	146.88	142.60
TRAMO E	CALLE ESCUELA LATERAL IZQUIERDO	59.50	1.00	2.00	60.50	2.00	119.00	121.00
TRAMO F	CALLE A	45.00	1.00	1.00	45.00	1.00	45.00	45.00
TRAMO G	CALLE B	71.50	1.00	2.00	71.50	2.00	143.00	143.00
TRAMO H	CALLE C	21.20	1.00	2.00	283.90	1.00	42.40	283.90
TRAMO I								
<b>Total</b>							<b>814.39</b>	<b>1,053.60</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,056,764.81  
Monto desembolsado RD\$ 3,056,764.82 (100%)  
Avance de obra 119.22%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: EL LLANO

DISTRITO MUNICIPAL: GUANITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de enero de 2023



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 814.39 metros cuadrados de aceras y 1,053.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS



1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. La obra construida cumple con los parámetros recomendados por la LMD.
3. Los moradores están mas que agradecido por la iniciativa de la junta en tomarlo en cuenta.

### IMÁGENES

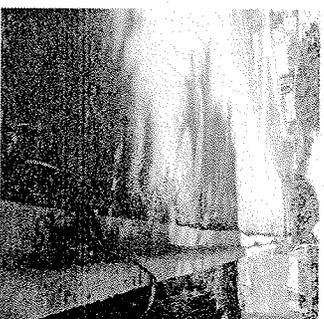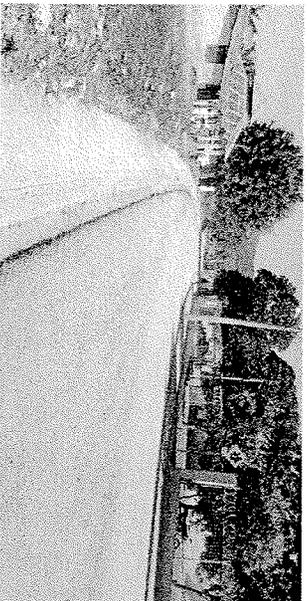




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

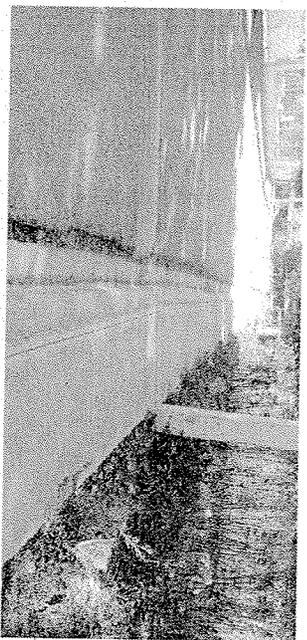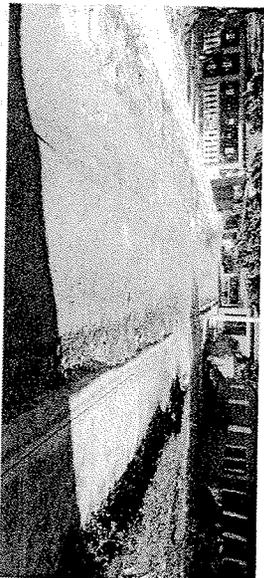

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ING. DANILLO MERCADO  
Técnico
