

# INFORME PROYECTO

01/07/2022  
CONSTRUCCIÓN ACERAS Y  
CONTENES RIO LIMPIO

## INFORME PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Este informe tiene como objeto presentar y edificar a las partes interesadas sobre los avances realizados en el proyecto "Construcción aceras y contenes en Río Limpio", el proyecto tiene como fecha de partida el día 20 de junio del 2022, dos semanas más de la fecha pactada debido a causas externas, siendo la razón protagonista las constantes lluvias que impedian el acceso a la zona, por ende, el movimiento del equipo y la correcta manejabilidad del personal a la zona.

**Modalidad de la ejecución de la obra;** fue realizada por administración.

### **Estatus de ejecucion de la obra**

Cocluida la tempestades climaticas el lunes 20/06/2022 se incio el proceso de corte y nivilacion con equipo mecanico, esto se extendio por 870 metros a ambos lados de la via, este proceso fue realizado acompañado de su respectivo levantamieto topografico, obteniendo asi los niveles necesarios para el correcto control de las aguas.

El proceso de moviemitto tierra abarco 5 días, desde el lunes 20 del junio al viernes 24 de junio.

Culminado este prceso se realiazo otro levantamiento de los niveles topograficos el sabado 25 de junio.

Lunes 27 fueron recibidas los materiales y los equipos, dando incio al proyecto, ejecutandose hasta hoy 30/6/2022 **300** metros de contenes.

Estatus de los fondos recibidos: se esta ejecutando el **25%** del fondo asignado.



### **Estatus de ejecucion de la obra**

Cocluida la tempestades climaticas el lunes 20/06/2022 se incio el proceso de corte y nivilacion con equipo mecanico, esto se extendio por 870 metros a ambos lados de la via, este proceso fue realizado acompañado de su respectivo levantamieto topografico, obteniendo asi los niveles necesarios para el correcto control de las aguas.

El proceso de moviemitto tierra abarco 5 dias, desde el lunes 20 del junio al viernes 24 de junio.

Culminado este prceso se realizo otro levantamiento de los niveles topograficos el sabado 25 de junio.


Lunes 27 fueron recibidas los materiales y los equipos, dando incio al proyecto, ejecutandose hasta hoy 30/6/2022 **300** metros de contenes.


Estatus de los fondos recibidos: se esta ejecutando el **25%** del fondo asignado.



# ANEXOS



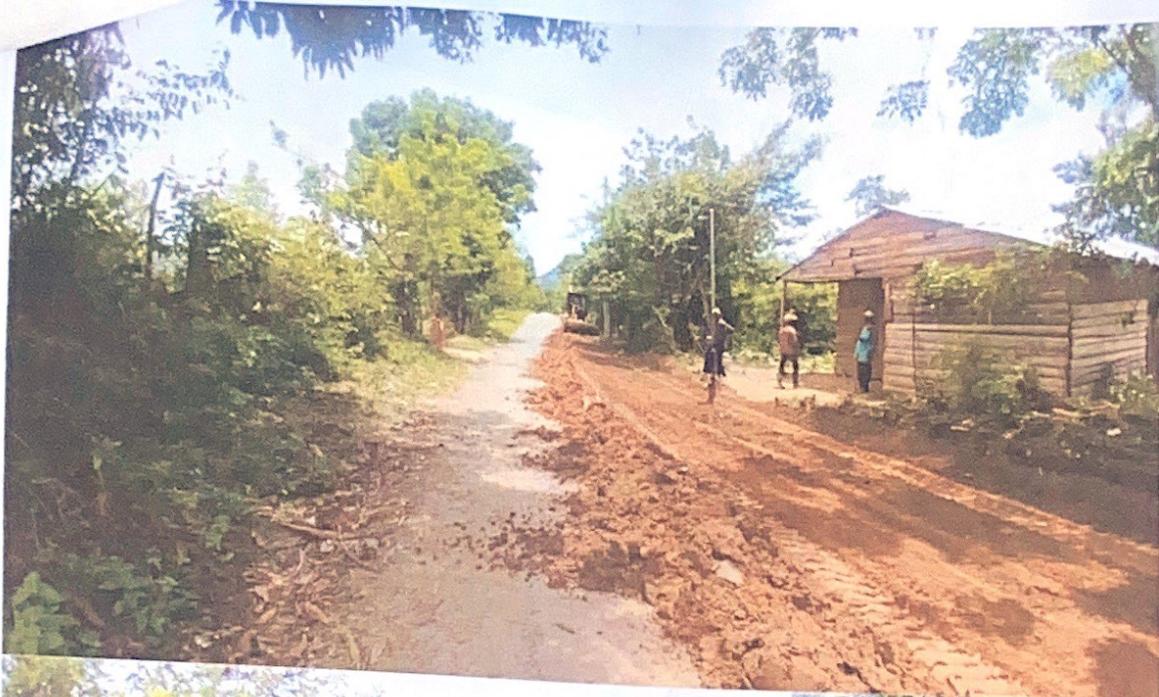

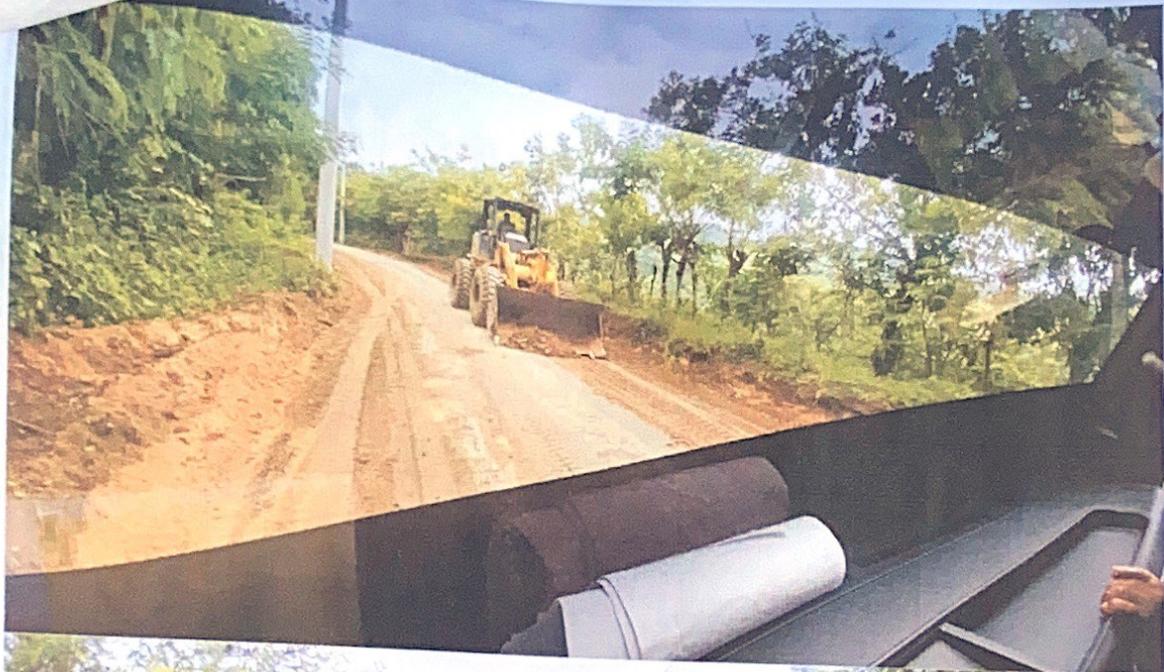



**CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES RIO  
LIMPIO**



CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES RIO LIMPIO





CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES RIO  
LIMPIO





CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES RIO LIMPIO


Firmas:



MIREYA PEREZ DE LOS SANTOS  
SINDICA



EDINSON VALENZUELA JAVIER  
CONTRATISTA



ING. SOCRATES ALBERTO  
SUPERVISOR
