



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 080101
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: EL SEIBO
MUNICIPIO: EL SEIBO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022
1. Ing. Ana Indhira Ramírez
TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	calle 3	67.00	1.00	1	67.00	1	67	67
TRAMO B	calle 4	176.00	0.90	2	176.00	2	316.8	352
TRAMO C	calle 5	59.20	1.00	2	61.90	2	118.4	123.8
TRAMO D	calle 5	40.40	1.00	2	40.40	2	80.8	80.8
TRAMO E	calle 5	60.15	1.00	2	60.15	2	120.3	120.3
TRAMO F	CALLE RESP. 5	44.00	1.00	2	44	2	88	88
TRAMO G	CALLE RESP. 5	183.55	1.00	2	204.65	2	367.1	409.3
TRAMO H	calle 4	82.85	1.00	2	82.5	2	165.7	165
TRAMO I	calle resp. 4	29.20	1.00	1	29.2	1	29.2	29.2
TRAMO J	calle proyecto	56.20	1.00	2	70.7	2	112.4	141.4
TRAMO K	CALLE 1RA LA JAVILLA	172.20	1.00	2	172.2	2	344.4	344.4
TRAMO L	CALLE 1RA LA JAVILLA	205.05	1.00	2	212.1	2	410.1	424.2
TRAMO M	CALLE CON ESQ. CALLE 1RA LA JAVILLA, COLMADO PROVIDENCIA	31.30	1.00	2	31.3	2	62.6	62.6
Total							2282.80	2408.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,626,382.36
Monto desembolsado RD\$ 7,626,382.36 (100%)
Avance de obra 116.42%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: EL SEIBO
MUNICIPIO: EL SEIBO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,282.80 metros cuadrados de aceras y 2,408.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Este proyecto fue ejecutado por contrato.
2. Tienen buenas terminaciones tanto las aceras como los contenes.
3. Este proyecto fue ejecutado en tres (3) sectores.
4. Debido a la topografía de algunos tramos, hay algunos que se utilizaron muro de contenci

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

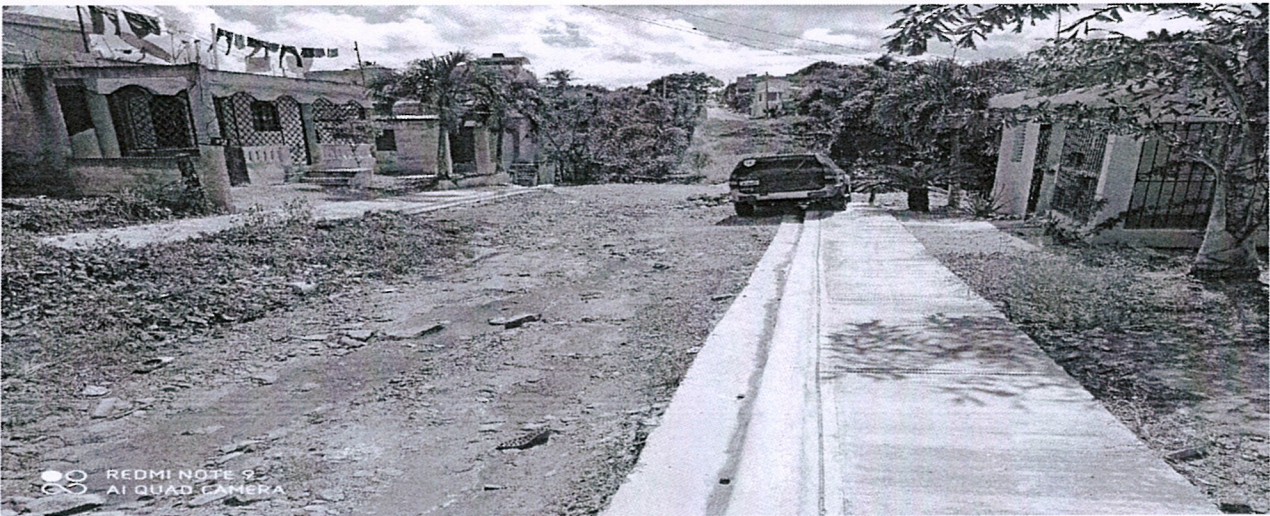

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

