



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 080102

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO SÁNCHEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022


1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO (BARRIO PAPOTE)	98.60	1.00	1	127.70	1	98.6	127.7
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO (BARRIO PAPOTE)	120.20	1.00	1	120.20	1	120.2	120.2
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL LADO DERECHO (BARRIO PAPOTE)	263.10	1.00	1	263.10	1	263.1	263.1
TRAMO D	CALLE A LADO IZQUIERDO (BARRIO PAPOTE)	45.10	1.00	1	45.10	1	45.1	45.1
TRAMO E	CALLE A LADO DERECHO (BARRIO PAPOTE)	48.20	1.00	1	48.2	1	48.2	48.2
TRAMO F	CALLE A AMBOS LADOS (BARRIO PAPOTE)	45.00	1.00	2	51.35	2	90	102.7
TRAMO G	CALLE B (BARRIO PAPOTE)	58.80	1.00	2	122.6	2	117.6	245.2
TRAMO H	CALLE C (BARRIO PAPOTE)	41.50	1.00	2	41.5	2	83	83
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							865.80	1035.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,066,959.53
Monto desembolsado RD\$ 3,066,959.53 (100%)
Avance de obra 119.82%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: PEDRO SÁNCHEZ

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 865.80 metros cuadrados de aceras y 1,035.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Este proyecto fue ejecutado por contrato.
2. Buena terminación y ejecución tanto de las aceras como de los contenes.
3. Considerar 38 ml de contenes afectados por la tormenta Fiona, lo cual tubo un asentamiento en el terreno, lo que conlleva su demolición y posteriormente su construcción.
4. El proyecto fue ejecutado en un mismo sector.
5. Hay algunos tramos que demandó más relleno en acera de lo común.
6. Hay tramos que se tubo que colocar telford bajo acera para el soporte de la misma, y se tubo que talar y extraer varios arboles de diferentes naturalezas para poder ejecutar el proyecto.


IMÁGENES

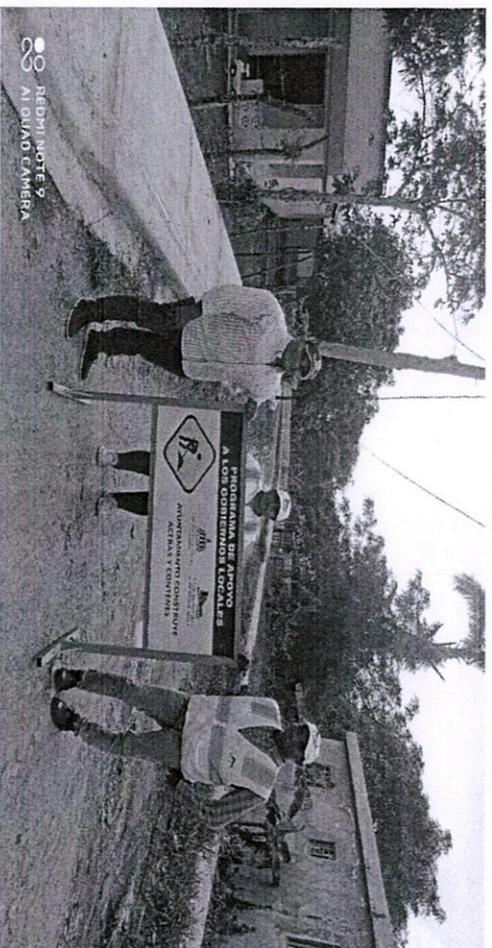


REDMI NOTE 9
AI DUAD CAMERA



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

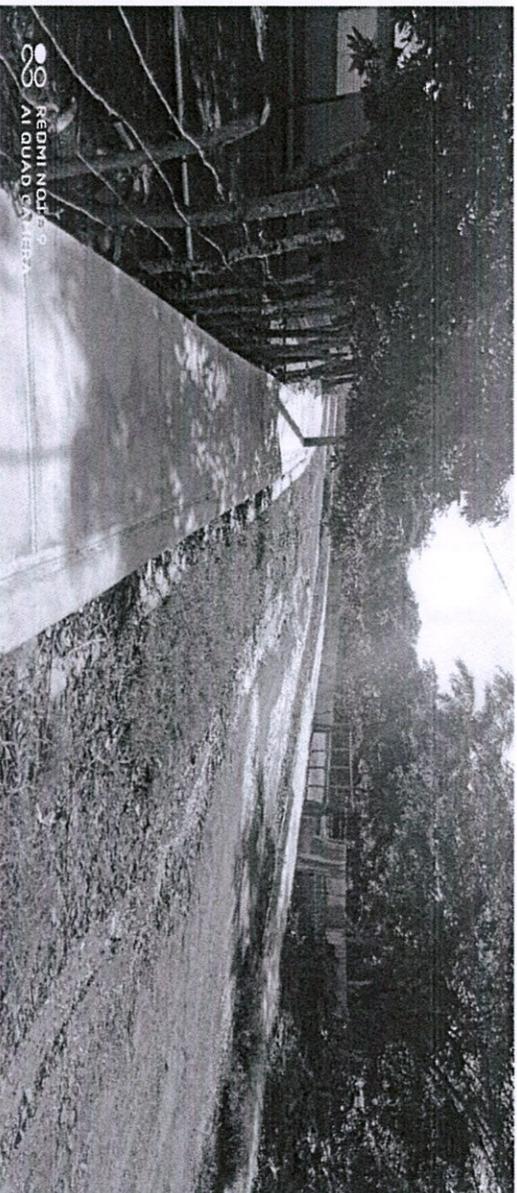

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico

