

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 080203

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de abril de 2022

REGIÓN: YUMA

1. Ing. Edward Acosta

PROVINCIA: EL SEIBO

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera

MUNICIPIO: MICHES

DISTRITO MUNICIPAL: LA GINA

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	JUVENCINO ORTIZ	75.70	1.00	2	75.70	2	151.4	151.4
TRAMO B	PUEBLO NUEVO CEMENTERIO	55.40	1.00	2	55.40	2	110.8	110.8
TRAMO C	PUEBLO NUEVO CALLE IGLESIA	76.40	1.00	2	76.40	2	152.8	152.8
TRAMO D	CALLE SILVIA DIAZ	122.90	1.00	2	122.9	2	245.8	245.8
TRAMO E	CALLE ESTEBAN ARIAS	154.50	1.00	2	154.5	2	309	309
TRAMO F	CALLE DOLORES ROA	75.90	1.00	2	75.9	2	151.8	151.8
TRAMO G	LOS MAURICIO	17.80	1.00	2	17.8	2	35.6	35.6
TRAMO H						5		
TRAMO I	9							ė.
TRAMO J			1-					
Total							1157.20	1157.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,945,165.24

Monto desembolsado RD\$ 2,945,165.24 (100%)

Avance de obra 147.39%



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de abril de 2022

PROVINCIA: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: LA GINA **MUNICIPIO: MICHES**


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,157.20 metros cuadrados de aceras y 1,157.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

El gobierno local realizó una cantidad de aceras y contenes superior a la estimada.

IMÁGENES

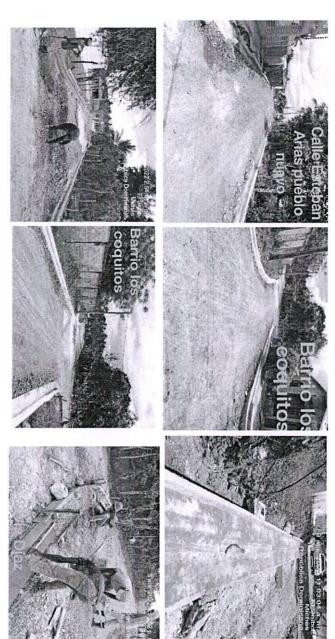




IGA DOMINICANA -MUNICIPAL




















Suministra los datos de este reporte,



ING. RICHARD CABRERA Técnico
