



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE OBRA

CODIGO: 090301

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: GASPARD HERNÁNDEZ

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13 de julio de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

2. Ing. Asamín Ferreras

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO C	Villa Olimpica	253.00	1.84	1	253.00	1	465.52	253
TRAMO D	Candor	10.80	1.90	1			20.52	
TRAMO E	Candor				30.60	1		30.6
TRAMO F	Entrada del Jobo	30.50	1.10	1	18.5	1	33.55	18.5
TRAMO G	Calle Duarte	222.50	1.38	1	222.5	1	307.05	222.5
TRAMO H	Calle Duarte	44.00	1.27	1	44	1	55.88	44
TRAMO I	Calle Duarte	11.60	0.70	1	11.6	1	8.12	11.6
TRAMO J	Villa Hermosa	4.20	2.30	1	167.7	1	9.66	167.7
TRAMO K	Villa Hermosa				82	1		82
TRAMO L	Villa Hermosa				42.4	1		42.4
TRAMO M	Villa Hermosa				42.3	1		42.3
TRAMO N	Villa Hermosa				120.4	1		120.4
TRAMO O	Villa Hermosa				52.5	1		52.5
TRAMO P	Caimán	283.20	0.90	1	283.2	1	254.25696	283.2
Total							1154.55696	1370.7

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,253,125.26

Monto desembolsado RD\$ 885,737.12 (21%)

Avance de obra 115.08%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: ESPAILLAT
MUNICIPIO: GASPAS HERNÁNDEZ
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13 de julio de 2022

REPORTE


A la fecha de 13/07/2022 se ha ejecutado 1,154.56 metros cuadrados de aceras y 1,370.70 metros lineales de contén, lo que corresponde al 115.08% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. En la visita realiza a este municipio pudimos observar que en el tramo de Villa Olímpica la aceras no están violinadas y tienen un ancho promedio mayor debido a que es una zona deportiva.

En el tramo del sector de la Entrada del Jobo pudimos observar que las aceras se ven que fueron
2. construidas antes del programa de aceras y contenes, donde fueron incluido en los proyectos unos 13m2 de acera aproximadamente.
3. En el sector Villa Hermosa solo fueron construidos contenes.
4. En el sector Caimán debido al poco espacio de la vía, el ancho promedio ejecutado es por debajo de lo recomendado.


IMÁGENES

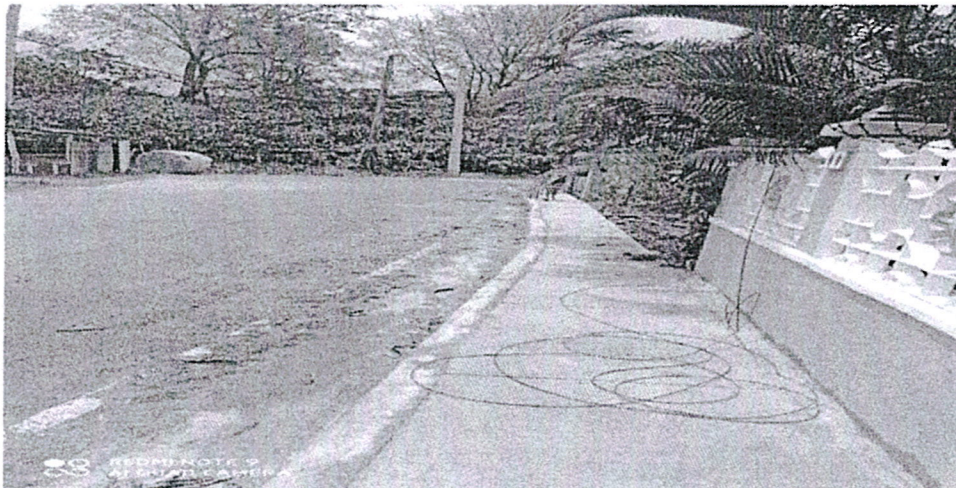





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —







LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

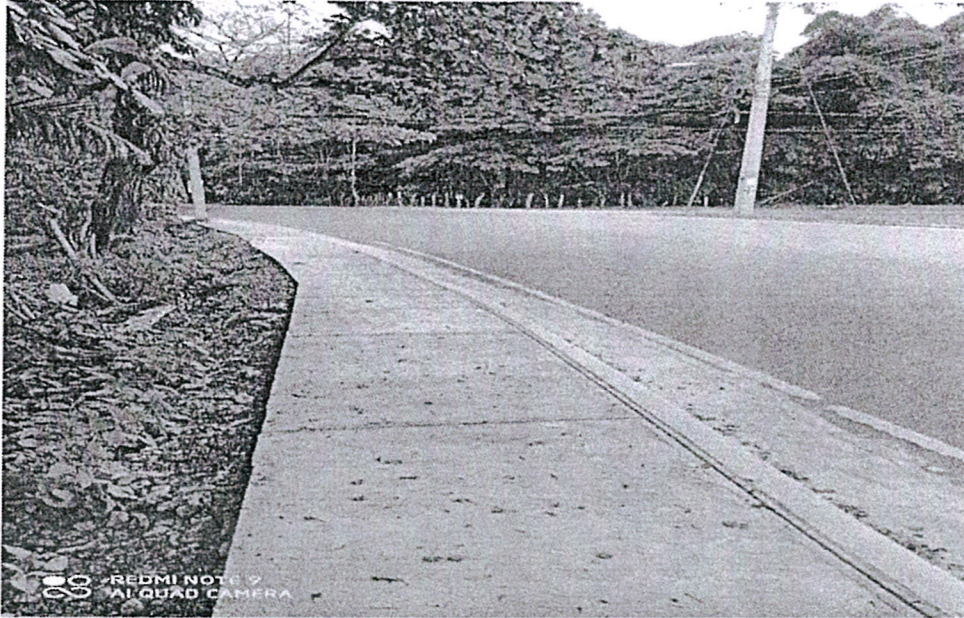



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

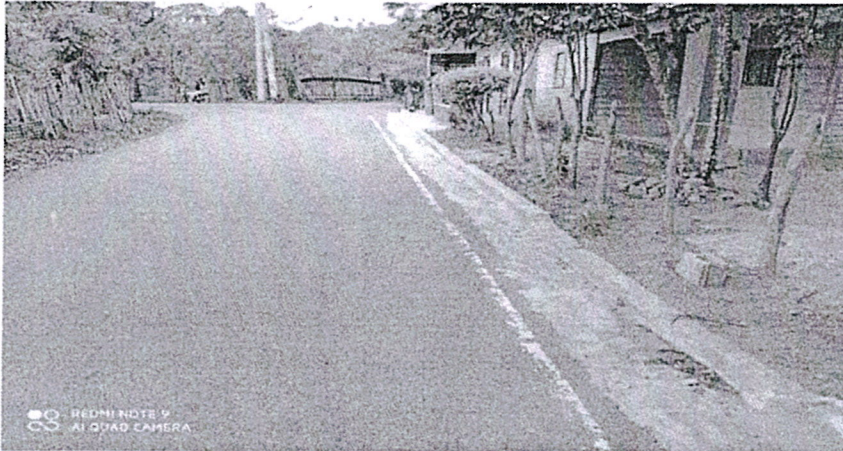





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico




ING. ASAMÍN FERRERAS
Técnico
