

Santo Domingo, D.N.
13 de septiembre de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución de Jamao al Norte**

En la visita técnica realizada el 12 de junio de 2023 se validó la ejecución de 773.33 metros cuadrados de aceras y 1,014.50 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.


La supervisión externa ha validado la ejecución de 324.93 metros cuadrados de aceras y 265.7 metros lineales de contenes, con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1,098.26 metros cuadrados de aceras y 1,280.2 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 090401

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: JAMAO AL NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	c/ RUBI ENRIQUE	6.40	0.46	1.00	6.40	1.00	2.94	6.40
TRAMO B					1.80	1.00		1.80
TRAMO C		20.30	1.00	1.00	20.30	1.00	20.30	20.30
TRAMO D		26.40	0.98	1.00	26.40	1.00	25.87	26.40
TRAMO E		44.30	0.80	1.00	44.30	1.00	35.44	44.30
TRAMO F		44.30	1.05	1.00	44.30	1.00	46.52	44.30
TRAMO G		4.30	0.92	1.00	4.30	2.00	3.96	8.60
TRAMO H		9.50	0.99	1.00	9.50	1.00	9.41	9.50
TRAMO I		9.50	0.54	1.00	9.50	1.00	5.13	9.50
TRAMO J		11.90	0.58	1.00	20.70	1.00	6.90	20.70
TRAMO K		14.70	0.99	1.00	14.70	1.00	14.55	14.70
TRAMO L		14.70	1.00	1.00	14.70	1.00	14.70	14.70
TRAMO M		4.70	1.62	1.00	4.70	1.00	7.61	4.70
TRAMO N		4.70	0.90	1.00	4.70	1.00	4.23	4.70
TRAMO O		27.60	1.00	2.00	27.60	2.00	55.20	55.20
TRAMO P		17.50	1.01	1.00	17.50	1.00	17.68	17.50
TRAMO Q		46.00	1.10	1.00	46.00	1.00	50.60	46.00
TRAMO R		90.00	0.90	1.00	90.00	1.00	81.00	90.00
TRAMO S	SECTOR/ RINCON CALIENTE	73.50	1.05	1.00	73.50	1.00	77.18	73.50
TRAMO T		9.50	2.03	1.00	9.50	1.00	19.29	9.50
TRAMO U				1.00	2.00	1.00	-	2.00
TRAMO V		39.50	1.10	1.00	39.50	1.00	43.45	39.50
TRAMO W				1.00	155.80	1.00	-	155.80
TRAMO X		57.30	1.00	1.00	57.30	1.00	57.30	57.30
TRAMO Y1		7.50	1.50	1.00	7.50	1.00	11.25	7.50
TRAMO Z1				1.00	12.30	1.00	-	12.30



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AA		10.00	1.00	1.00	10.00	1.00	10.00	10.00
TRAMO AB	C/ GABRIEL ESPINAL	17.60	0.95	1.00	17.60	1.00	16.72	17.60
TRAMO AC					5.60	1.00		5.60
TRAMO AD		16.00	0.85	1.00	16.00	1.00	13.60	16.00
TRAMO AE		11.00	0.90	1.00	11.00		9.90	
TRAMO AF		11.00	0.94	1.00	7.20	1.00	10.34	7.20
TRAMO AG		7.20	0.90	1.00	7.20	1.00	6.48	7.20
TRAMO AH		10.50	0.94	1.00	10.50	1.00	9.87	10.50
TRAMO AI		8.00	2.00	1.00	8.00	1.00	16.00	8.00
TRAMO AJ		3.50	1.00	1.00	3.50	1.00	3.50	3.50
TRAMO AK		35.20	1.10	1.00	35.20	1.00	38.72	35.20
TRAMO AL		2.90	0.98	1.00			2.84	
TRAMO AM		2.20	1.30	1.00			2.86	
TRAMO AN		22.00	1.00	1.00	22.00	1.00	22.00	22.00
TRAMO AO	SECTOR / BOCAD E JAMAO				75.00	1.00		75.00
TRAMO AP								
TRAMO AQ								
TRAMO AR								
TRAMO AS								
Total							773.33	1,014.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,454,683.99
Monto desembolsado RD\$ 3,454,684.00 (100%)
Avance de obra 101.95%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de junio de 2023

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: JAMAQ AL NORTE

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 773.33 metros cuadrados de aceras y 1,014.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este Gobierno local ejecutó por contrato.
2. Durante la inspección observamos que variaciones en los anchos de las acera.
3. Hay un tramo de acera que tiene un telford de 0.20m a 0.60m.
4. Los contenes tienen una excavación promedio de 0.15m.

IMÁGENES



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

Felipe Reyes
FELIPE REYES
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: ESPAILLAT
MUNICIPIO: JAMAO AL NORTE
DISTRITO MUNICIPAL: _____
BARRIO Y/O SECTOR: _____

BOCA DE JAMAO Y LA VILLA IVAN GUZMAN

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

- a. Gobierno Local
b. Contratista

Razón Social **ING.TOBIAS BATISTA JOSE**
RNC ó Cédula: **0540014983-6**



3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

- a. Reparación de aceras y contenes:
b. Incluye demoliciones de tramos:
c. Incluye badenes:
d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps

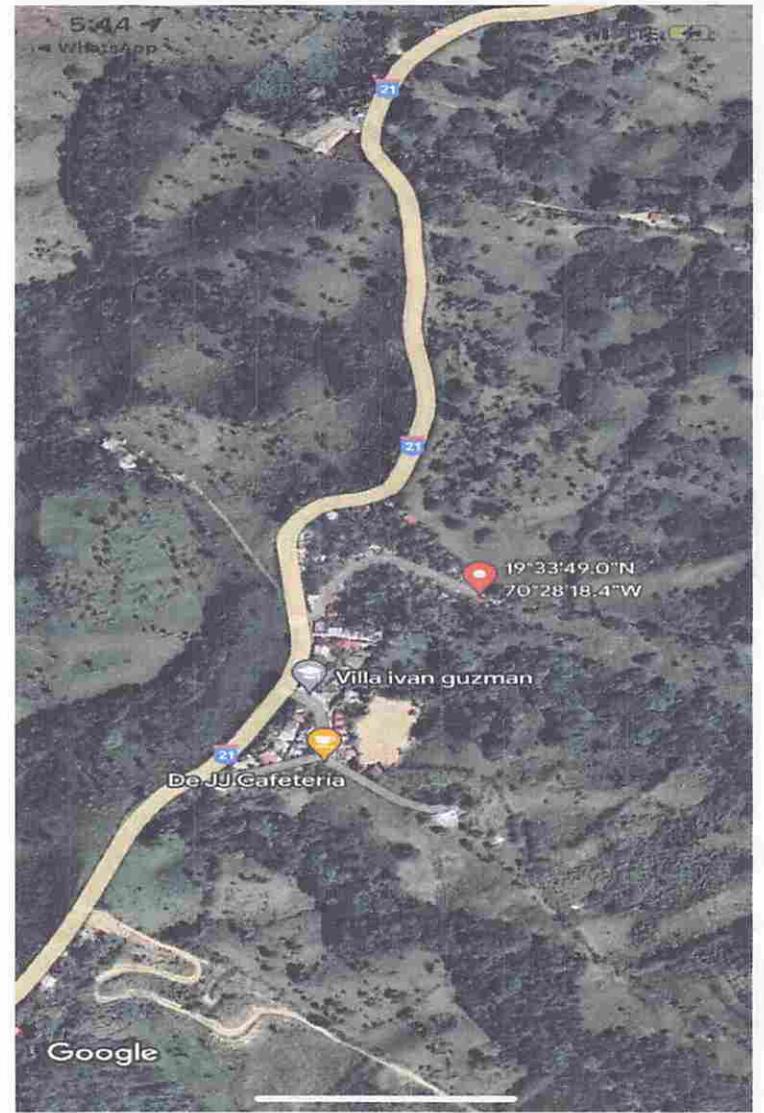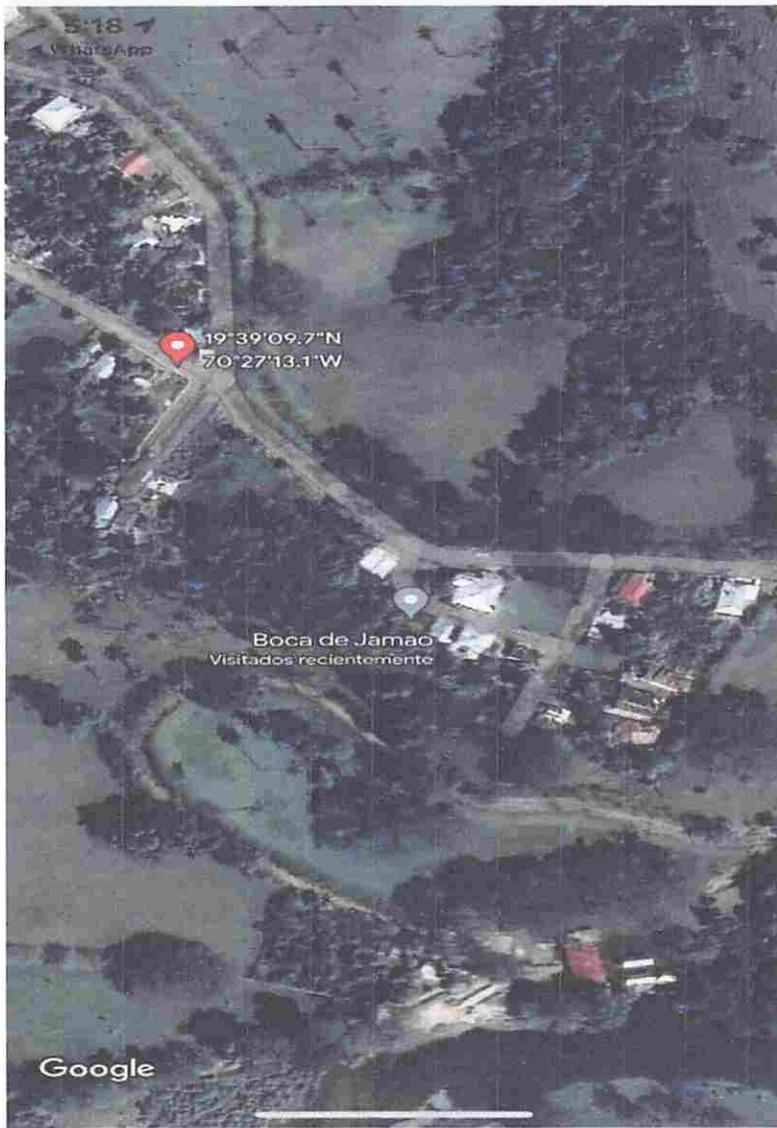

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A Lado Derecho	CALLE ENTRADA BOCA DE JAMAO	19°39'05.0"N	70°27'09.3"O	19°39'06.1"N	70°27'10.3"O	68.5	0.92	76.00	63.02	76
Tramo B Lado Izquierdo	CALLE ENTRADA BOCA DE JAMAO	19°39'07.1"N	70°27'10.7"O	19°39'08.0"N	70°27'13.5"O	82.10	0.93	-----	76.35	---
Tramo C Lado Derecho	CALLE ENTRADA BOCA DE JAMAO	19°39'09.6"N	70°27'13.0"O	19°39'10.6"N	70°27'14.0"O	79.20	0.90	-----	71.28	---
Tramo D Lado izquierdo	CALLE ENTRADA BOCA DE JAMAO	19°39'09.9"N	70°27'12.7"O	19°39'11.3"N	70°27'12.7"O	44	0.92	8.60	40.48	8.60
Tramo F Lado Derecho	CALLE LOS GUANDULES	19°33'48.0"N	70°28'23.2"O	19°33'48.9"N	70°28'18.5"O	47.5	0.90	63.10	73.80	181.10
Lado Izquierdo		19°33'50.0"N	70°28'22.3"O	19°33'49.3"N	70°28'18.6"O	34.50	0.90	118.0		

$\Sigma = 324.93$ $\Sigma = 265.7$

5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

355.80 m2 de Aceras y 265.7m de Contenes

6- FOTOGRAFÍAS DE LA CALLE A INTERVENIR

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:	PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
CÉDULA:	402-2214255-2
CODIA:	38977
FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:	12 DE AGOSTO DEL 2023

Valida y aprueba los datos suministrados,



Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



