



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 100101

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: JIMANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de junio de 2022

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/PRIMERA				212.60	2		425.2
TRAMO B	C/SEGUNDA				82.80	2		165.6
TRAMO C	C/TERCERA				91.00	2		182
TRAMO D	C/CUARTA				102.90	1		102.9
TRAMO E	C/QUINTA				147.8	2		295.6
TRAMO F	C/SEXTA				81.25	2		162.5
TRAMO G	C/SEPTIMA				84.5	2		169
TRAMO H	C/OCTAVA				89.4	2		178.8
TRAMO I	C/NOVENA				81.1	2		162.2
TRAMO J	C/DECIMA				71.4	2		142.8
Total							0.00	1986.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,694,802.03

Monto desembolsado RD\$ 3,694,802.03 (100%)

Avance de obra 139.29%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15 de Junio de 2022

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: JIMANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,986.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. La modalidad de ejecución es por contrato.
2. Se construyeron únicamente contenes con el fin de aprovechar el plan de asfaltado.

IMÁGENES

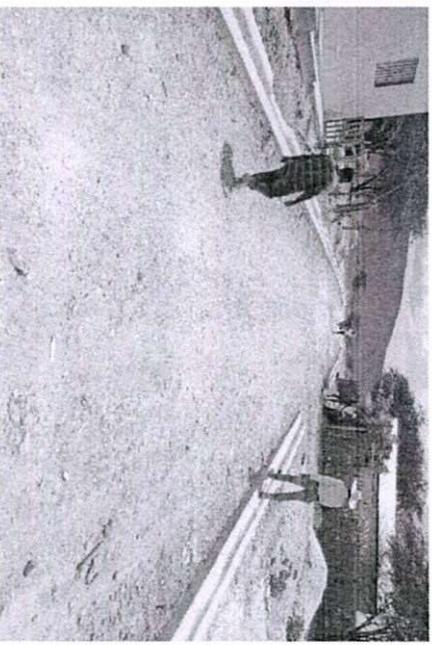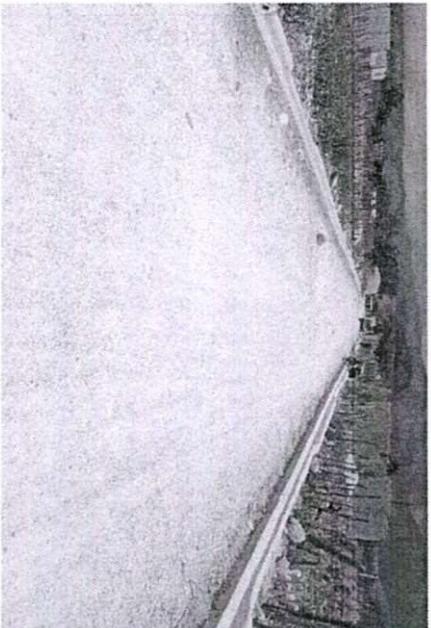

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

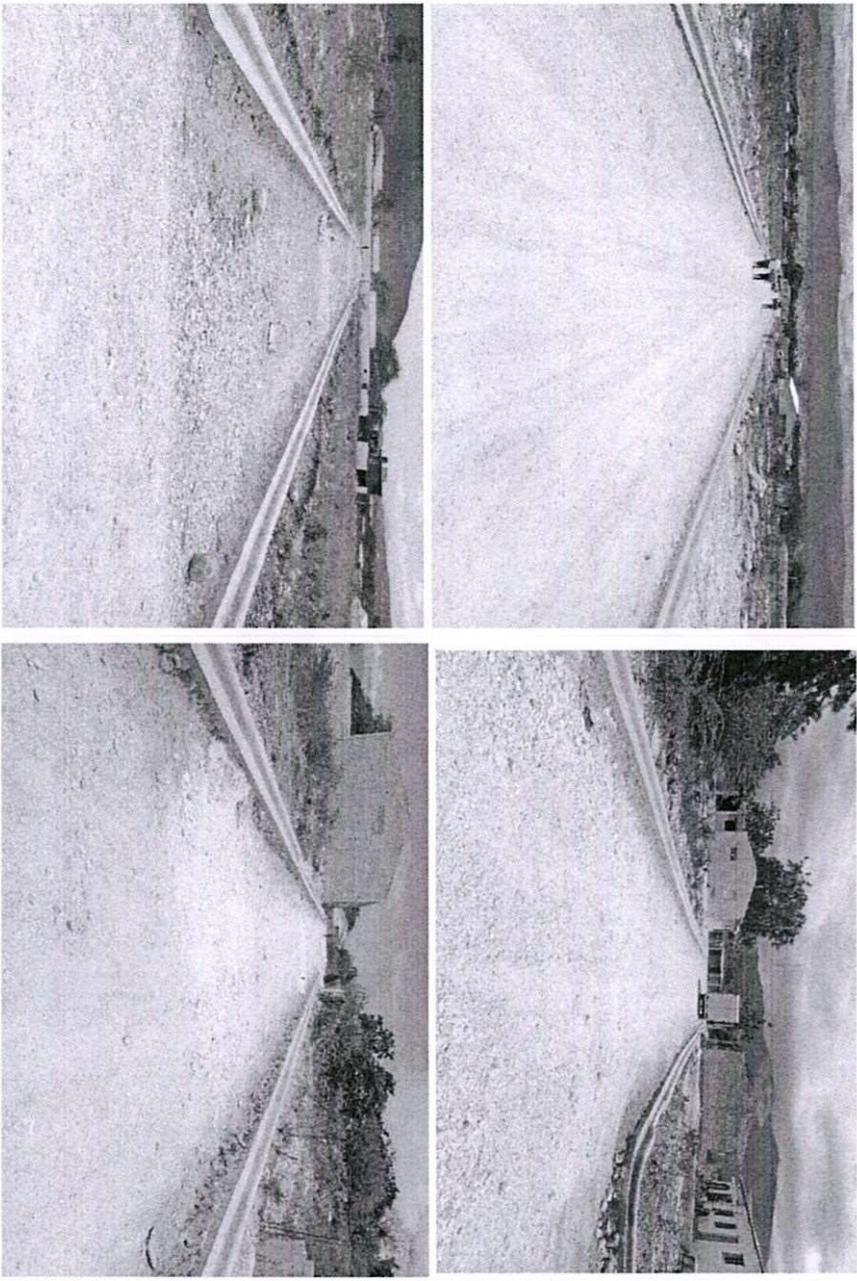

Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

