



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 100402

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**PROVINCIA:** INDEPENDENCIA

**MUNICIPIO:** POSTRER RÍO

**DISTRITO MUNICIPAL:** GUAYABAL

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:**

**TÉCNICOS:**

1. Arq. Keilin Mora

2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/RANCHO FRANCISCO				713.00	1		713
TRAMO B	C/GREGORIO LUPERON				547.50	1		547.5
TRAMO C	C/ANTONIO GUZMAN				721.40	1		721.4
TRAMO D	C/GREGORIO LUPERON				383.20	1		383.2
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	2365.10

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,831,288.12

Monto desembolsado RD\$ 1,415,644.07 (50%)

Avance de obra 216.40%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 0 de enero de 1900

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: POSTRER RÍO

DISTRITO MUNICIPAL: GUAYABAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,365.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. La calidad de los contenes ejecutados cumplen con las normas y criterios de construcción.
2. Esta obra se hizo por contrato.
3. Al momento de la visita solo habian contenes ejecutados en la zona.

### IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

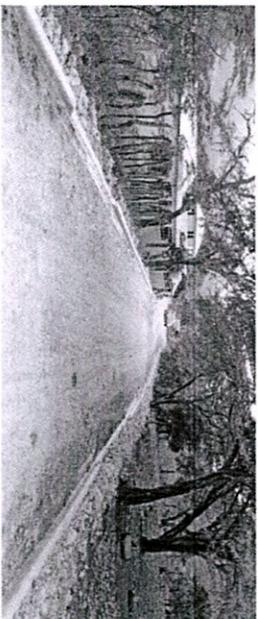

Suministra los datos de este reporte,

  
ARQ. KEILM MORA

Técnico

  
ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

