



**LIGA MUNICIPAL
DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.
20 de julio de 2023


Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución de obra de Construcción de un
Cementerio tipo C en el municipio de Mella**

Mediante el informe presentado por el supervisor de la obra, Validamos que esta se encuentra en un avance del 30 %

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales

martes, 4 de julio de 2023

INFORME DE OBRA



1. LOCALIZACIÓN

Provincia **INDEPENDENCIA**
Municipio **DE MELLA**
Distrito Municipal Haga clic o pulse aquí para escribir texto.
Barrio y/o sector **CARRETERA DUVERGE/BARAHONA**

2. PROYECTO

CONSTRUCCION DE CEMENTERIO TIPO C

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

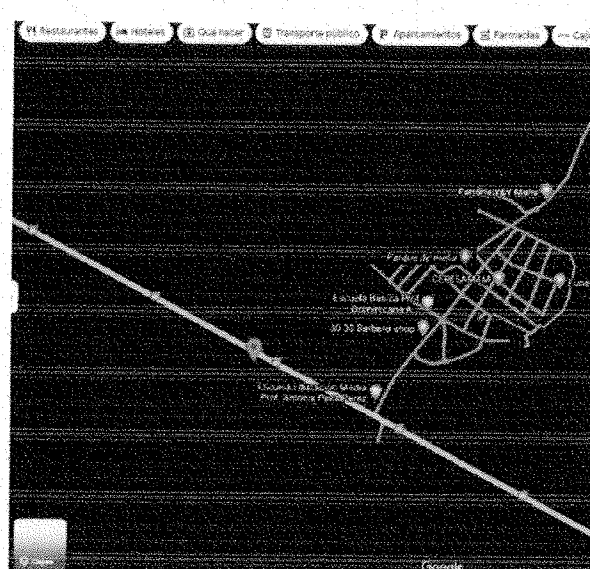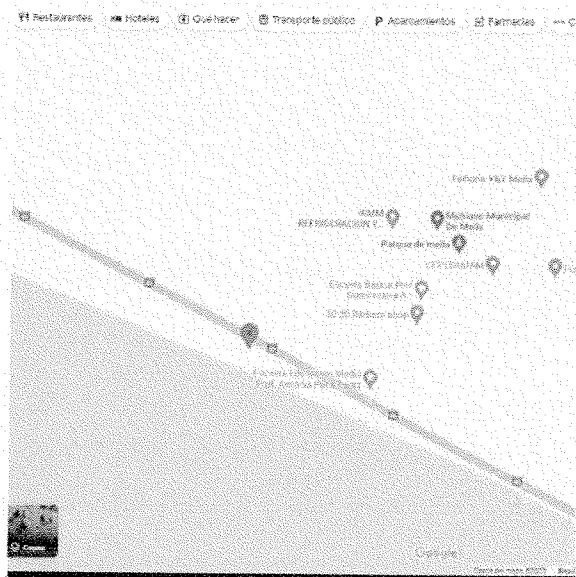

LATITUD

18.356812,-71.423569

LONGITUD

18.356812, -71.423569

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Brindar la comodidad y las mejores facilidades a todas las familias de la localidad, en esos momentos tan necesarios.

5. CONDICIONES DEL TERRENO

Es un suelo arenoso, y las condiciones del terreno son muy considerable, ya que el proyecto contempla un terreno en las mejores condiciones. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.


6. OBSERVACIONES

El proyecto tiene un buen avance en cuanto a su ejecución y desarrollo del proyecto. Es necesario que se mantengan los controlen de calidad y la integridad del proyecto.

Nota:

Anexo podrán encontrar todos los reportes de seguimiento de avance y cubicaciones levantadas en esta obra.


7. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:



ING. YONATAN TALABERA M.
Codia:32038
Cedula:066-0022819-8
SUPERVISOR



LEONIDAS SENA
ALCALDE



REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

1. Datos Generales

Título del Proyecto	Construcción de Cementerio tipo C	
Nombre de la autoridad municipal:	Leonidas Sena	
Gobierno Local:	Municipio de Mella	
Supervisor que prepara el reporte:	Ing. Yonatan Talavera M	
Fecha de inicio del proyecto:	Fecha de finalización del proyecto:	Fecha de elaboración del reporte de Avance actual:
15/02/2023, Con la Limpieza y en el día 10/03/2023 Con la Construcción en si.	Segunda Quincena de septiembre 2023	04/07/2023

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

Fecha de elaboración de Informes anteriores

Informe 1:

Informe 2:

Informe 3:

Informe 4:

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

2. Actividades

2.1 Cronograma de Actividades

Copiar el cronograma/ o en su defecto partidas y subpartidas presupuestadas y validadas por el gobierno local, tal y como se elaboró en el documento de proyecto. Señalar con distintos colores aquellas actividades/partidas que se han realizado y aquellas que están en ejecución.

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

2.2 Actividades realizadas

Partidas o tareas	Fecha de Inicio	Fecha de término	Descripción de avance	Porcentaje de ejecución física de Avance %	Observaciones
<i>Según presupuesto del proyecto</i>			<i>Actividad realizada hasta la fecha de elaboración del presente Informe</i>	<i>Porcentaje o grado de avance del indicador</i>	<i>Comentarios sobre posibles modificaciones, ajustes o cambios respecto a lo planificado</i>
Desmante y talas de arboles , Replanteo, excavaciones Muros y columnas, vaciado de hormigón, colocación de bloques, excavación y construcción cisterna, verja perimetral, entra al cementerio, oficina del mismo..etc.	10/03/2023	30/09/2023	25	30%	Luego de hacer la entrada, se desbarato para hacerla otra vez, con el objetivo de que sea mas amplia y con mejor representación

Informe de Avance de Proyectos en el Marco del Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales Para Obras de

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO EN EJECUCIÓN

--	--	--	--	--	--

2.3 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

Producto del proyecto al que pertenecen	Actividad realizada	Observaciones
Entrada Cementerio	Desmoler los pedestales	Tiene Que ser más ancha


3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto

Limitaciones	Actividades correctivas desarrolladas	Acciones correctivas por desarrollar
Ninguna	Ninguna	No hay

Anexos: evidencias fotográficas en orden cronológico y con descripción de partidas

1. SUMINISTRADO Y VALIDADO POR:


ING. YONATAN TALABERA M


LEONIDAS SENA





Codia:


ALCALDE

Cedula:

SUPERVISOR



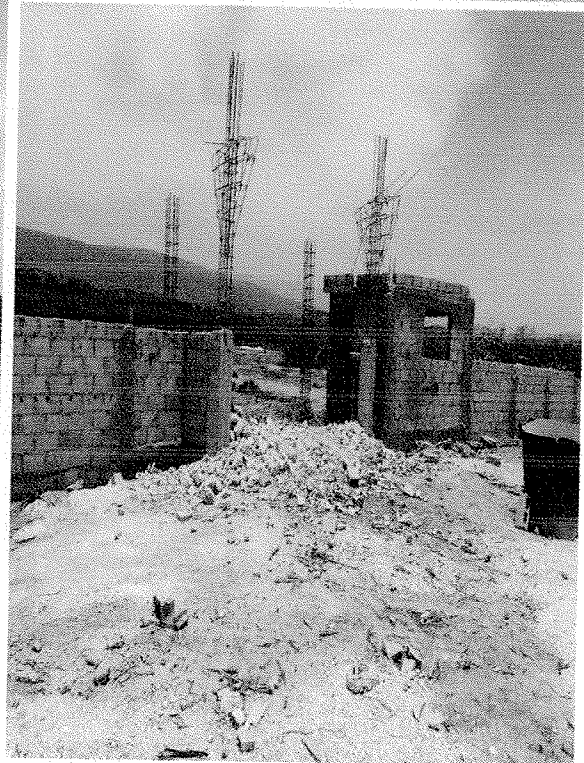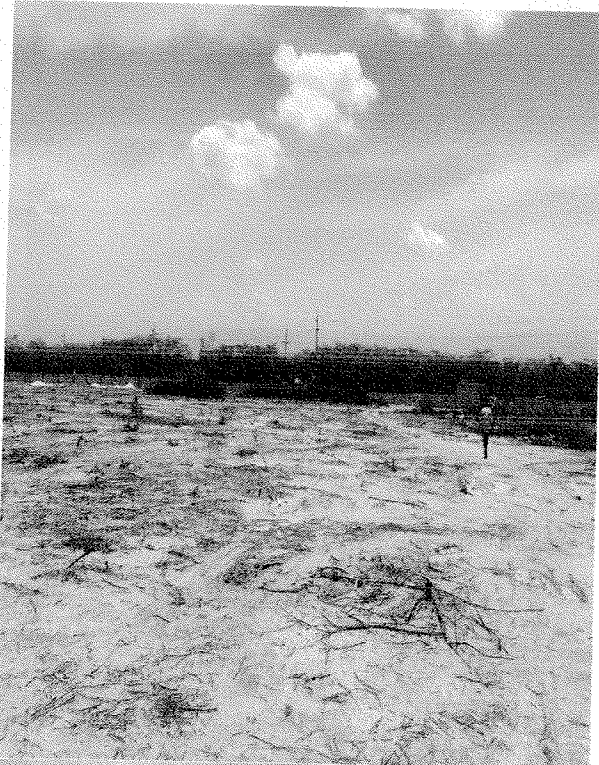



**COLEGIO LUMINICANI
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CULLIA)**

APELLIDOS: Talabera Medina

NOMBRES: Yonatan


PROFESION: Ing. Civil

EXEQUATUR 76

DIF: 06/03/2015

CEDULA: 066-0022819-8

COLEGIATURA: 32038



Firma colegiado

Firma Presidente
