



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 100601

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: MELLA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24/03/2023

1. Ing. Edward Acosta

2. Arq. Keillin Mora

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PROYECTO AGRARIO 151, C/ 3ERA	130.30	1.00	1	130.30	1	130.3	130.3
TRAMO B	PROYECTO AGRARIO 151, C/ PRINCIPAL	373.20	1.00	1	363.70	1	373.2	363.7
TRAMO C	PROYECTO AGRARIO 151, C/ 2DA	124.30	1.00	1	124.30	1	124.3	124.3
TRAMO D	PROYECTO AGRARIO 151, C/ 4TA	229.20	1.00	1	229.20	1	229.2	229.2
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
TOTAL							857.00	847.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA




Monto asignado RD\$ 2,877,815.06

Monto desembolsado RD\$ 1,438,907.53 (50%)


Avance de obra 113.98%




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

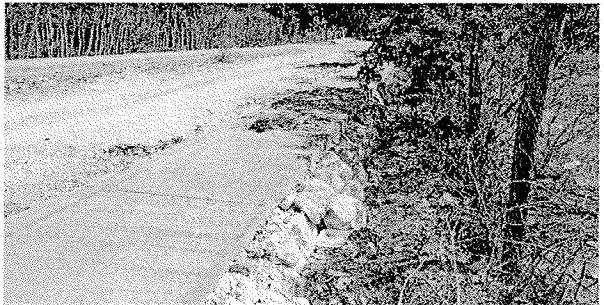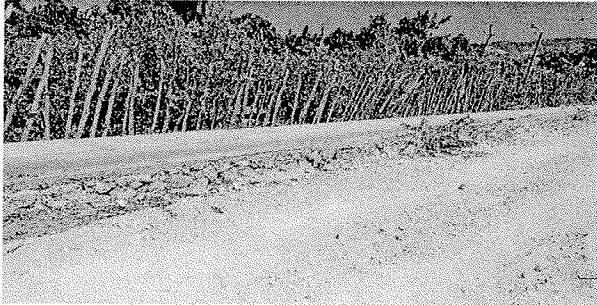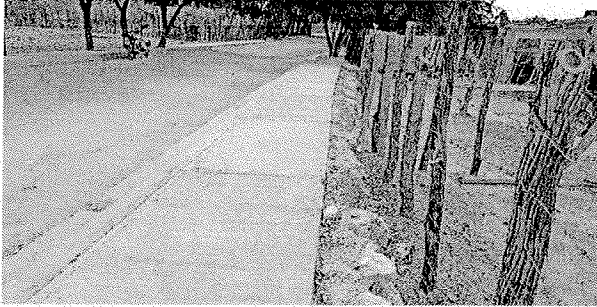

Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico


ARQ. KEILIN MORA
Técnico
