

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 100602
REGIÓN: ENRIQUILLO
PROVINCIA: INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: MELLA
DISTRITO MUNICIPAL: LA COLONIA


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de marzo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta
2. Arq. Keilyn Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE SEGUNDA FRENTE A LA FUNERARIA	43.65	1.00	1	16.00	1	43.65	16
TRAMO B	CALLE 5TA	200.80	1.10	1	203.90	1	220.88	203.9
TRAMO C	CALLE 6TA	35.46	1.00	2	39.40	2	70.92	78.8
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL	110.00	1.00	1	111.00	2	110	222
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL	138.00	1.00	1	92	1	138	92
Total							583.45	612.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,730,208.63
Monto desembolsado RD\$ 2,730,208.63 (100%)
Avance de obra 85.18%

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de marzo de 2023

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: MELLA

DISTRITO MUNICIPAL: LA COLONIA


INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 24/03/2023 se ha ejecutado 583.45 metros cuadrados de aceras y 612.70 metros lineales de contén, lo que corresponde al 85.18% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. La ejecución de estas aceras y contenes tienen muy buena terminación, cumpliendo así con lo recomendado por el programa.

IMÁGENES

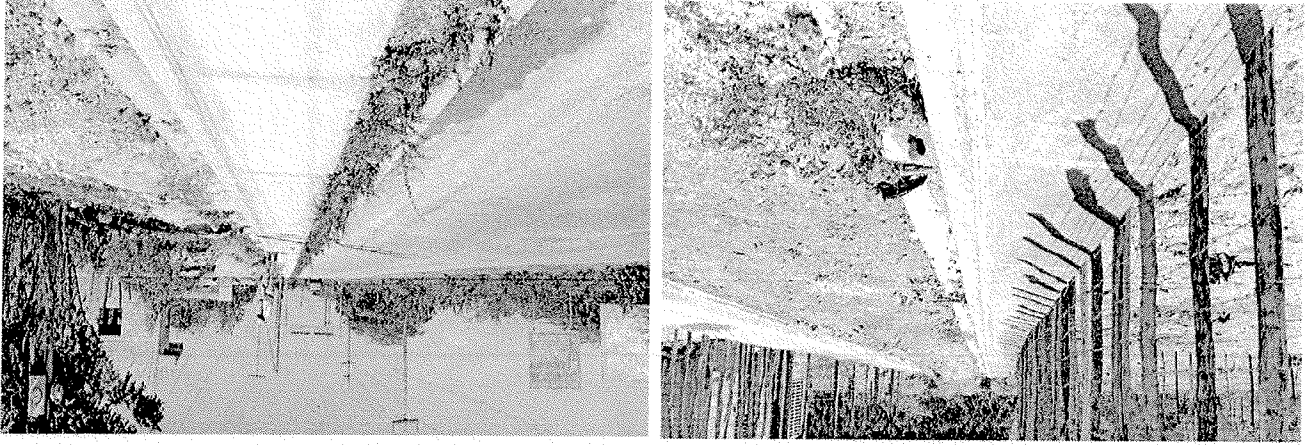

Técnico

ING. EDWARD ACOSTA




Técnico

ARQ. KEILIN MORA



Suministra los datos de este reporte,

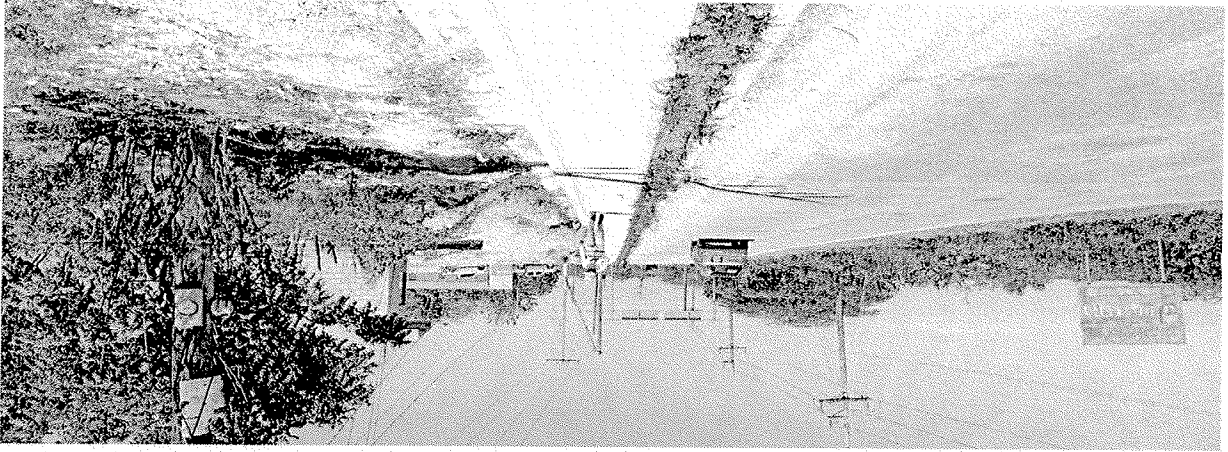

LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—

