



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 110102

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: HIGÜEY

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS DE NISIBÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Ing. Edward Acosta

| TRAMOS | NOMBRE DE LA CALLE | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|----------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | SECTOR LA SANJA (CALLE PRINCIPAL) | | | | 232.90 | 1 | | 232.9 |
| TRAMO B | CALLE 2DA | | | | 274.20 | 2 | | 548.4 |
| TRAMO C | CALLE 7MA | | | | 109.10 | 2 | | 218.2 |
| TRAMO D | CALLE 12 | | | | 44.50 | 2 | | 89 |
| TRAMO E | CALLE 12 | | | | 88.8 | 2 | | 177.6 |
| TRAMO F | CALLE 12 | | | | 40.5 | 2 | | 81 |
| TRAMO G | CALLE 3 ERA | | | | 115 | 2 | | 230 |
| TRAMO H | CALLE 4 TA | | | | 94.5 | 2 | | 189 |
| TRAMO I | CALLE 5TA | | | | 98.6 | 2 | | 197.2 |
| TRAMO J | CALLE 6TA | | | | 52.85 | 2 | | 105.7 |
| TRAMO DF | EL PEÑON (CALLE PRINCIPAL) | 144.40 | 1.05 | 1 | 144.4 | 1 | 151.62 | 144.4 |
| TRAMO DG | EL PEÑON (CALLE PRINCIPAL) | 73.90 | 1.00 | 1 | 73.9 | 1 | 73.9 | 73.9 |
| TRAMO DH | | | | | | | | |
| TRAMO DI | | | | | | | | |
| TRAMO DJ | | | | | | | | |
| TRAMO DK | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | 225.52 | 2287.30 |

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,672,785.79

Monto desembolsado RD\$ 3,672,785.79 (100%)

Avance de obra 164.55%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: HIGÜEY

DISTRITO MUNICIPAL: LAS LAGUNAS DE NISIBÓN



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 225.52 metros cuadrados de aceras y 2,287.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Este Distrito Municipal esta construyendo por contrato.
2. Este levantamiento reportado es lo que se ha construido hasta el momento de la visita.

IMÁGENES

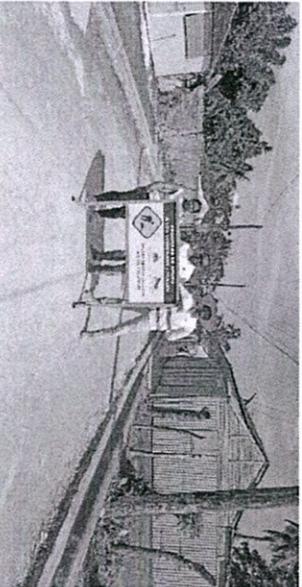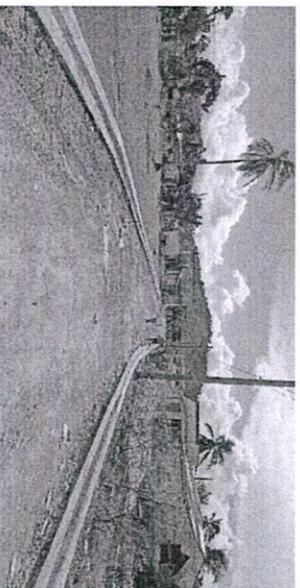



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

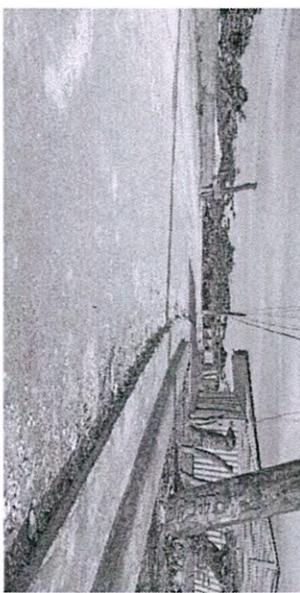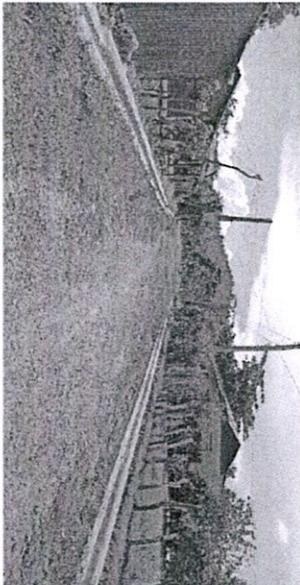

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RAMIREZ
Técnico


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

