



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 110203

**REGIÓN:** YUMA

**PROVINCIA:** LA ALTAGRACIA

**MUNICIPIO:** SAN RAFAEL DEL YUMA

**DISTRITO MUNICIPAL:** BAYAHIBE

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 21 de octubre de 2022

1. Ing. Richard Cabrera

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE GENOVA	169.15	0.80	2	184.70	2	270.64	369.4
TRAMO B	CASCO URBANO (SCUOLA)	182.70	0.78	2	182.70	2	285.012	365.4
TRAMO C	CASCO URBANO (SCUOLA)	80.90	0.75	2	80.90	2	121.35	161.8
TRAMO D	MANANTIAL LA MUERTE	39.50	1.06	2	39.50	2	83.74	79
TRAMO E	CALLE LA BAHIA	30.00	1.00	1			30	
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							790.74	975.60

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,851,677.55

Monto desembolsado RD\$ 2,851,677.55 (100%)

Avance de obra 120.36%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: SAN RAFAEL DEL YUMA

DISTRITO MUNICIPAL: BAYAHIBE


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 790.74 metros cuadrados de aceras y 975.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS

1. en este programa tantos los contenes como las aceras fueron ejecutados bajo los parametros requerid

### IMÁGENES

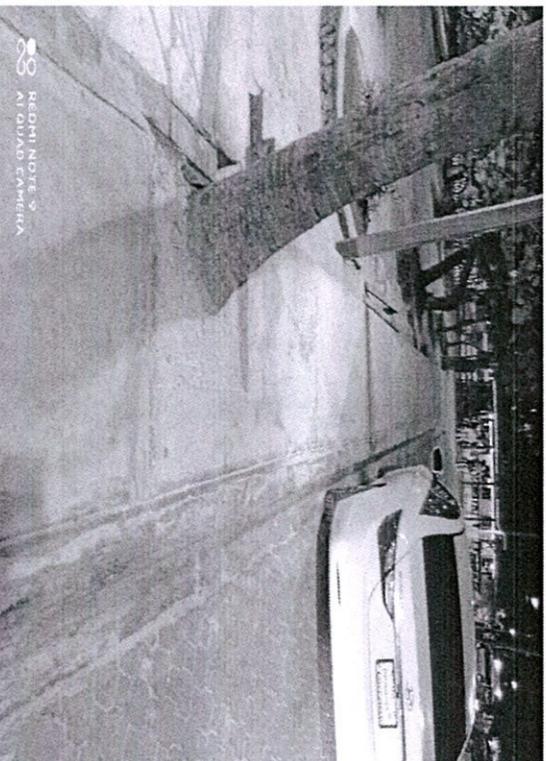



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,



ING. RICHARD CABRERA

Técnico



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

