



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 120101  
**REGIÓN:** YUMA  
**PROVINCIA:** LA ROMANA  
**MUNICIPIO:** LA ROMANA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 1 de noviembre de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/Principal Seccion A	91.20	1.00	1.00			91.20	
TRAMO B	Calle 1 era	276.45	1.00	1.00			276.45	
TRAMO C	Callejon	86.60	1.00	1.00			86.60	
TRAMO D	C/Principal Seccion B	114.00	1.00	1.00			114.00	
TRAMO E	Calle 2 da	322.50	1.00	1.00	322.50	1.00	322.50	322.50
TRAMO F	Calle 3 era				318.60	1.00		318.60
TRAMO G	C/Principal Seccion C				95.50	1.00		95.50
TRAMO H	C/Principal Seccion D				74.20	1.00		74.20
TRAMO I	Calle 4 ta				284.00	1.00		284.00
TRAMO J	Calle Transverzal #1				54.00	1.00		54.00
TRAMO K	Calle Transverzal #2				77.30	1.00		77.30
TRAMO L	Calle 5ta A				28.40	1.00		28.40
TRAMO M	Calle 5ta B				266.80	1.00		266.80
TRAMO N	Calle Transverzal #3				54.64	1.00		54.64
TRAMO O	Calle 6 ta				196.70	1.00		196.70
TRAMO P	C/Principal Norte #1				117.20	1.00		117.20
TRAMO Q	C/Principal Norte #2				88.44	1.00		88.44
TRAMO R	C/Principal Norte #3				82.60	1.00		82.60
TRAMO S	C/Principal Norte #4				39.86	1.00		39.86
TRAMO T	Calle #4				217.06	1.00		217.06
TRAMO U	C/Principal #2				32.40	1.00		32.40
TRAMO V	Calle #3				211.00	1.00		211.00
TRAMO W	Calle #3 Este				165.00	1.00		165.00
TRAMO X	Calle #2				197.60	1.00		197.60
TRAMO Y1	Calle #2 Este				166.00	1.00		166.00




## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO Z1	C/Transversal Este(Entre la C/2 y C/3)				100.00	1.00		100.00
TRAMO AA	Calle #1				30.50	1.00		30.50
TRAMO AB	Calle Joel				144.00	1.00		144.00
TRAMO AC	C/Principal #2 a				60.70	1.00		60.70
TRAMO AD	C/Principal #2 b				84.80	1.00		84.80
TRAMO AE	C/Principal #2 c				81.70	1.00		81.70
TRAMO AF	C/Principal #2 d				33.95	1.00		33.95
TRAMO AG	Calle #3				210.40	1.00		210.40
TRAMO AH	Calle #2				198.15	1.00		198.15
TRAMO AI	C/Transversal #1				121.00	1.00		121.00
TRAMO AJ	C/Transversal #2				125.95	1.00		125.95
TRAMO AK	Proyecto x1				45.15	2.00		90.30
TRAMO AL	Calle c-b				69.50	2.00		139.00
TRAMO AM	VILLA SAN CARLOS PARTE NORTE X1				56.80	2.00		113.60
TRAMO AN	VILLA SAN CARLOS PARTE NORTE X2				165.00	2.00		330.00
TRAMO AO	VILLA SAN CARLOS (PICA POLLO MI SABOR)				55.90	2.00		111.80
TRAMO AP	VILLA SAN CARLOS CALLE E	74.20	1.03	1.00	130.40	1.00	76.43	130.40
TRAMO AQ	VILLA SAN CARLOS CALLE COMERCIAL WILIAN				86.20	2.00		172.40
TRAMO AR	VILLA SAN CARLOS CALLE RESP. E 1				85.10	1.00		85.10
TRAMO AS	VILLA SAN CARLOS. CALLE RESP. E 2				178.20	2.00		356.40
TRAMO AT	VILLA SAN CARLOS MANZANA 12				43.90	2.00		87.80
TRAMO AU	VILLA SAN CARLOS MANZANA 12				130.00	2.00		260.00
TRAMO AV	VILLA SAN CARLOS MANZANA 1	72.00	1.00	1.00			72.00	
TRAMO AW	VILLA SAN CARLOS MANZANA 15	15.50	1.00	2.00			31.00	
<b>Total</b>							<b>1,070.18</b>	<b>6,157.75</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 16,751,843.74  
Monto desembolsado RD\$ 16,751,843.75 (100%)  
Avance de obra 100.52%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: LA ROMANA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,070.18 metros cuadrados de aceras y 6,157.75 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. En esta visita se pudo observar una sección adecuada de los contenes, con las especificaciones del programa.
2. En los sectores que se ejecutaron dichas aceras y contenes se encuentran asfaltadas.
3. Esta obra ha estado ejecutandose por contrato.
4. Este proyecto finalizo en su totalidad en dos sectores colindante

### IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

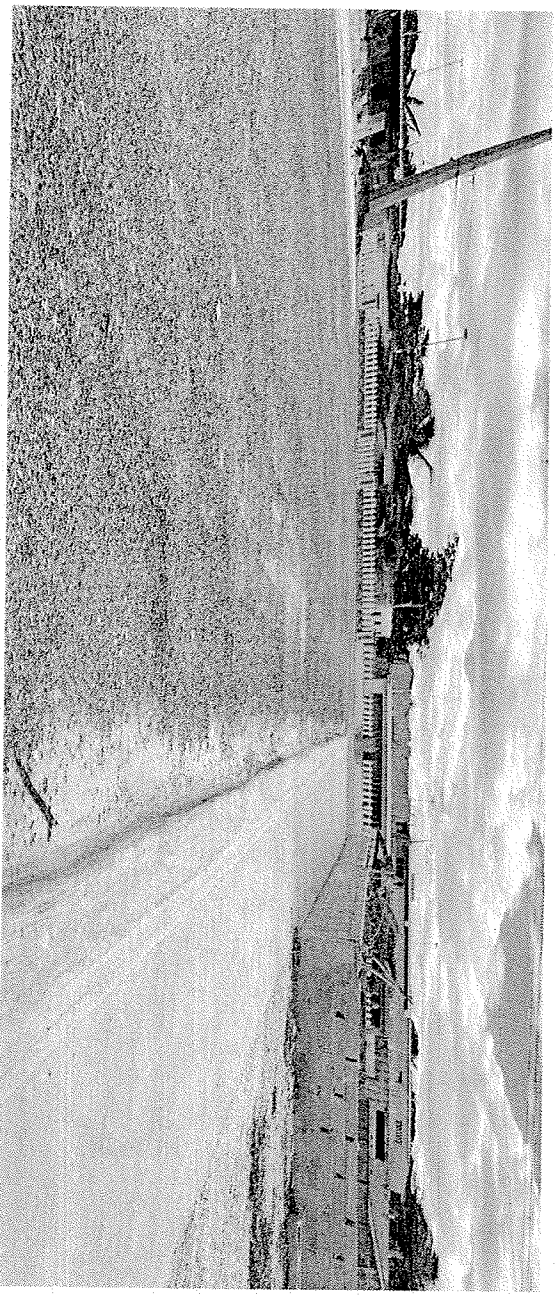

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

  
FELIPE REYES

Técnico
