



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 120301

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: VILLA HERMOSA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	calle almacen ana	232.00	0.98	2	232.20	2	454.72	464.4
TRAMO B	calle 4ta	72.50	1.00	2	72.50	2	145	145
TRAMO C	calle 4ta A	214.40	1.00	2	214.40	2	428.8	428.8
TRAMO D	calle venezuela	323.05	1.10	2	323.05	2	710.71	646.1
TRAMO E	calle henry segura	76.00	1.00	2	76	2	152	152
TRAMO F	calle henry segura A	166.40	1.00	2	182.3	2	332.8	364.6
TRAMO G	Sector villa progreso calle a	224.10	1.00	2	199.1	2	448.2	398.2
TRAMO H	calle guarionex	81.90	1.00	2	81.9	2	163.8	163.8
TRAMO I	calle la antena	157.20	1.00	2	157.2	2	314.4	314.4
TRAMO J	calle juan pablo duarte	251.40	1.00	2	251.4	2	502.8	502.8
Total							3653.23	3580.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 10,983,696.66

Monto desembolsado RD\$ 10,983,696.66 (100%)

Avance de obra 123.09%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: VILLA HERMOSA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,653.23 metros cuadrados de aceras y 3,580.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Pudimos observar en la visita que la calidad y terminación de las aceras y contenes con una buena calidad
2. Han ejecutado tanto las aceras y contenes con los parámetros recomendados.
3. Este municipio ejecuto por administración.
4. El alcalde nos expresa que fuero intervenido 5 sectores de los cuales solo visitamos 3, por lo tanto quedan al pendiente dos sectores..

IMÁGENES

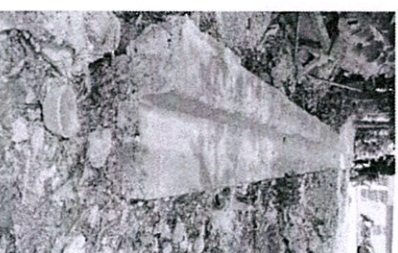



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

