


LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 130101
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: LA VEGA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilín Mora
 2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LAS CLAVELLINAS	205.40	1.46	2.00	459.00	2.00	600.28	918.00
TRAMO B	AVENIDAD JOSE MARTI	13.60	1.10	1.00			14.96	
TRAMO C	CALLE GREGORIO LUPERON	624.80	0.83	2.00	624.80	2.00	1,041.10	1,249.60
TRAMO D	CALLE CASA ALTAGRACIA CONIL	37.50	0.89	2.00	48.20	2.00	66.38	96.40
TRAMO E	CALLE CENTRAL	21.30	0.75	2.00	31.30	2.00	31.95	62.60
TRAMO F	LAS CLAVELLINAS	253.90	0.85	2.00	268.50	2.00	431.63	537.00
TRAMO G	CALLE TRANSVERSAL	59.40	0.96	2.00	136.75	2.00	114.31	273.50
TRAMO H	CALLE DE LA ESCUELA	107.40	0.92	1.00	64.30	2.00	98.94	128.60
TRAMO I	CALLE 11	16.80	0.85	2.00	16.80	2.00	28.56	33.60
TRAMO J	CALLE RESP. 13	148.20	1.02	2.00	148.20	2.00	303.07	296.40
TRAMO K	CALLE RESP. 13	21.20	0.90	2.00	21.20	2.00	38.16	42.40
TRAMO L	CALLE DON FAUTO	12.45	0.80	2.00	12.45	2.00	19.92	24.90
TRAMO M	CALLE RHINA ESPAILLAT	201.70	2.00	1.00	201.70	1.00	403.40	201.70
TRAMO N	CALLE UASD	15.20	1.20	1.00	41.90	1.00	18.24	41.90
TRAMO O	AVENIDAD RIVAS	27.90	2.70	1.00	39.50	1.00	75.33	39.50
TRAMO P								
TRAMO Q	CALLE SAVADOR VEATO	48.40	1.61	1.00	48.40	1.00	77.92	48.40
TRAMO R	CALLE FRENTE A LA BANCA CHICHO	91.10	0.60	1.00	91.10	1.00	54.66	91.10




**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO S	CALLE 2 FRENTE A LA BANCA CHICHO	39.70	1.15	2.00	39.70	2.00	91.31	79.40
TRAMO T	CALLE 3 FRENTE A LA BANCA CHICHO	106.20	1.24	2.00	106.20	2.00	263.38	212.40
TRAMO U	CALLE BAUTISTA EL EBANISTA URBANIZACION IRIS ALEXANDRA	112.70	0.69	2.00	112.70	2.00	155.53	225.40
TRAMO V	CALLE 1 A	157.60	1.32	2.00	157.60	2.00	416.06	315.20
TRAMO W	CALLE 2 B	172.30	0.96	2.00	172.30	2.00	330.82	344.60
TRAMO X	CALLE 3 C	226.00	0.98	2.00	226.00	2.00	442.96	452.00
Total							5,118.86	5,714.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 23,814,936.31
Monto desembolsado RD\$ 23,814,936.31 (100%)
Avance de obra 86.07%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: LA VEGA

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 22/06/yyyy se ha ejecutado 5,118.86 metros cuadrados de aceras y 5,714.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 86.07% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Estas acera y contenes fueron ejecutadas con los fondos asignados del programa de la liga municipal dominicana.
2. Están bien ejecutadas, aunque hay tramos en los que solo hay contenes debido a las cercanías de las viviendas ya hechas en el lugar.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

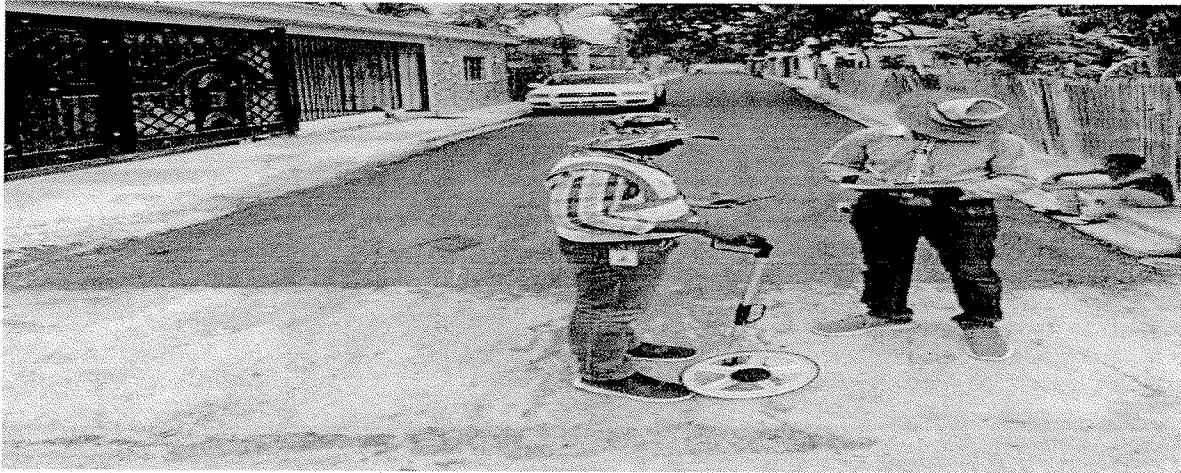

Suministra los datos de este reporte,



ARQ. KEILÍN MORA

Técnico



ING. RICHARD CABRERA

Técnico
