



**LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.  
07 de julio de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**  
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de avance de ejecución del D.M. La Cuaba**

En la visita técnica realizada el 28 de junio del 2023 se validó la ejecución de 442.00 metros cuadrados de aceras y 1,250.50 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 960.40 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 442.00 metros cuadrados de aceras y 2,210.9 metros lineales de contenes lo que corresponde al 96 % de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,

  
**Stephany Castro de la Cruz**

Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320703  
REGIÓN: OZAMA  
PROVINCIA: SANTO DOMINGO  
MUNICIPIO: PEDRO BRAND  
DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de junio de 2023

- TÉCNICOS:
1. Ing. Ana Indhira Ramírez
  2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL EL AGUACATE-LA CUABA	221.00	1.00	2.00	221.00	2.00	442.00	442.00
TRAMO B	LA ROTONDA				162.30	1.00		162.30
TRAMO C	LA ROTONDA				121.30	1.00		121.30
TRAMO D	SECTOR LA ESPERANZA LOS MACOS				171.30	1.00		171.30
TRAMO E	CARRETERA PRINCIPAL EL AGUACATE-LA CUABA				353.60	1.00		353.60
TRAMO F								
<b>Total</b>							<b>442.00</b>	<b>1,250.50</b>

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,672,026.61  
Monto desembolsado RD\$ 3,672,026.61 (100%)  
Avance de obra 100.37%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 28 de junio de 2023

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: PEDRO BRAND

DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 442.00 metros cuadrados de aceras y 1,250.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. La mayor parte de los recursos fueron destinados a la construcción de contenes.
2. En esta visita pudimos observar que tanto las aceras como los contenes presentan buena terminación y buena calidad constructiva.

### IMÁGENES

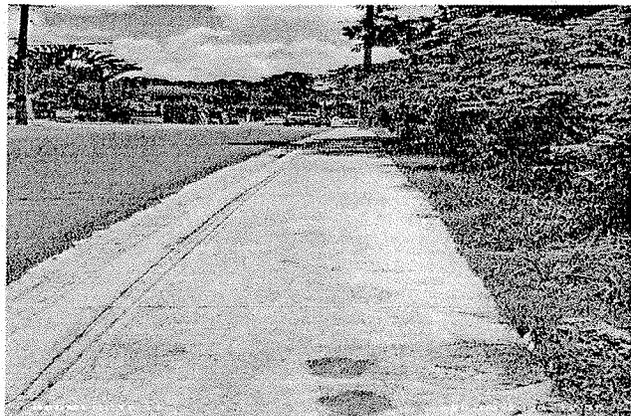





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

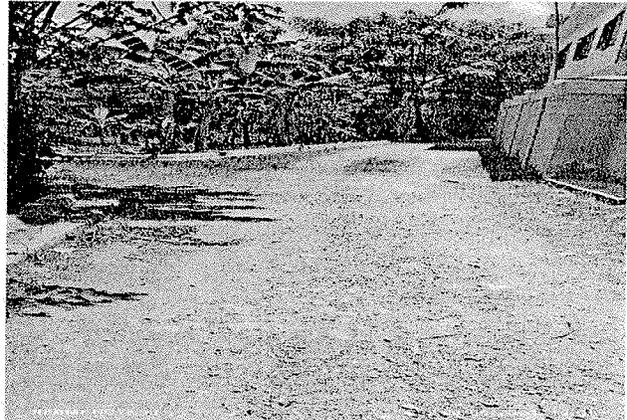

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
ELIZABETH GARCÍA  
Técnico





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES

3ER COMPONENTE

REPORTES DE AVANCE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LA CUABA

DISTRITO MUNICIPAL: LA CUABA

BARRIO Y/O SECTOR: EL BÉLICO

FUDESCO/TIPIDI

2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social: ING.PEDRO REYES

RNC ó Cédula: 092-0009697-3

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes: X

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:


d. Otros:

CONSTRUCCION DE CONTENES NUEVOS

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL, DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL, DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	C. Las Mercedes	18.590585	-70.080924	18.594935	-70.081527	-	-	960.40	-	960.40
Tramo B										
Tramo C										
Tramo D										
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										
Totales									-	960.40m



Manuel A. Delgado Durán  
 Ingeniero Civil  
 Cédula 31150  
 Santo Domingo, Rep. Dom.

**Detalle de ubicación y avance de trabajos realizados por contratista.**

Map view (Satellite)

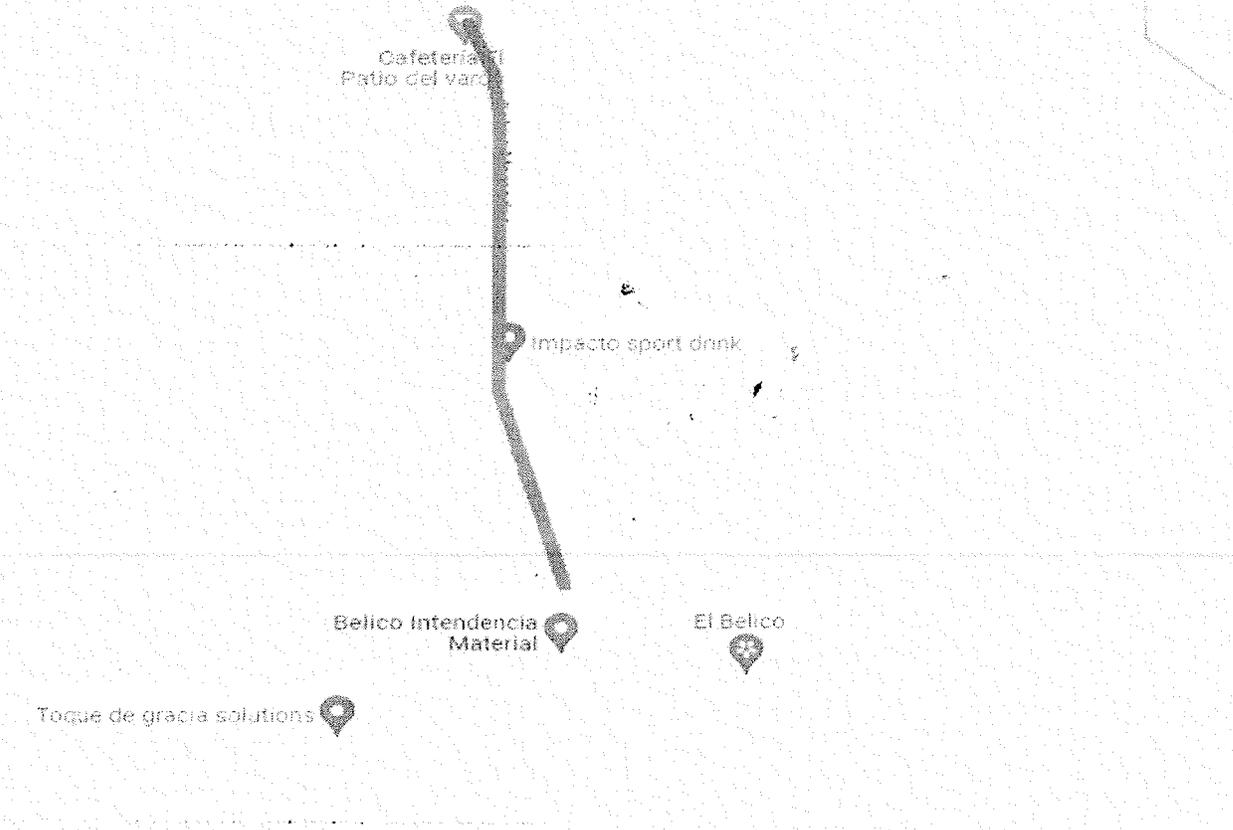

En la imagen se visualiza con una línea azul el progreso de Construcción de contenes, trabajados por el contratista en cuestión, trabajando toda la línea de ambos lados de las calles Las Mercedes sector El Bélico.

**Manuel A. Delgado Durán**  
Ingeniero Civil  
Codia 31150  
Santo Domingo Rep. Dom.

## 5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se observa la construcción de contenes y aceras, mezclado en situ con trompo, Corregir secciones en donde no se considero la pendiente y se acumula agua, de ser necesario reacer secciones donde se acumula agua.

## 6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

*Suministra los datos de este reporte el Supervisor,*

NOMBRE COMPLETO: Manuel Delgado Duran

CÉDULA: 001-1812369-4

CODIA: 31150

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA: 17/05/2023

Manuel A. Delgado Durán  
Ingeniero Civil  
Codia 31150  
Santo Domingo Rep. Dom.

*Valida y aprueba los datos suministrados,*


Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal
