



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140104

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO AL MEDIO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

1. Arq. Zunilda Del Rosario

TÉCNICOS: 2. Ing. Félix Tavárez


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/A				89.00	1		89
TRAMO B	C/B				69.00	1		69
TRAMO C	C/C				152.30			
TRAMO D	C/D				90.00	1		90
TRAMO E	C/E	42.20	1.00	1	84	1	42.2	84
TRAMO F	C/F	58.60	1.00	1	156.4	1	58.6	156.4
TRAMO G	C/G	9.00	1.00	1	23	1	9	23
TRAMO H	C/H				240	1		240
TRAMO I	C/I				304	1		304
TRAMO J	C/J				252.6	1		252.6
TRAMO K	C/K				52	1		52
TRAMO L	C/L				253.3	1		253.3
TRAMO M	El Chucho de Drago				384.4	1		384.4
TRAMO N	D/ Duficil				186.4	1		186.4
TRAMO O	Otra calle				90	1		90
TRAMO P	Calle perpendicular				164.2	1		164.2
TRAMO Q	Paraje Villa Alegre, Calle principal	136.86	1.00	1	145.6	1	136.86	145.6
TRAMO R	C/R	359.95	1.00	1	322.2	1	359.95	322.2
TRAMO S	C/S	94.40	1.00	1	106.7	1	94.4	106.7
TRAMO T	Calle de escuela villa alegre				183.4	1		183.4
Total							701.01	3196.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,738,509.15

Monto desembolsado RD\$ 3,738,509.16 (100%)

Avance de obra 253.78%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 4 de octubre de 2022

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO AL MEDIO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 701.01 metros cuadrados de aceras y 3,196.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La construcción de aceras y contenes se visualizan con buena calidad.
2. Este replanteo fue bajo el criterio contemplado y con las dimensiones operacionales.

IMÁGENES

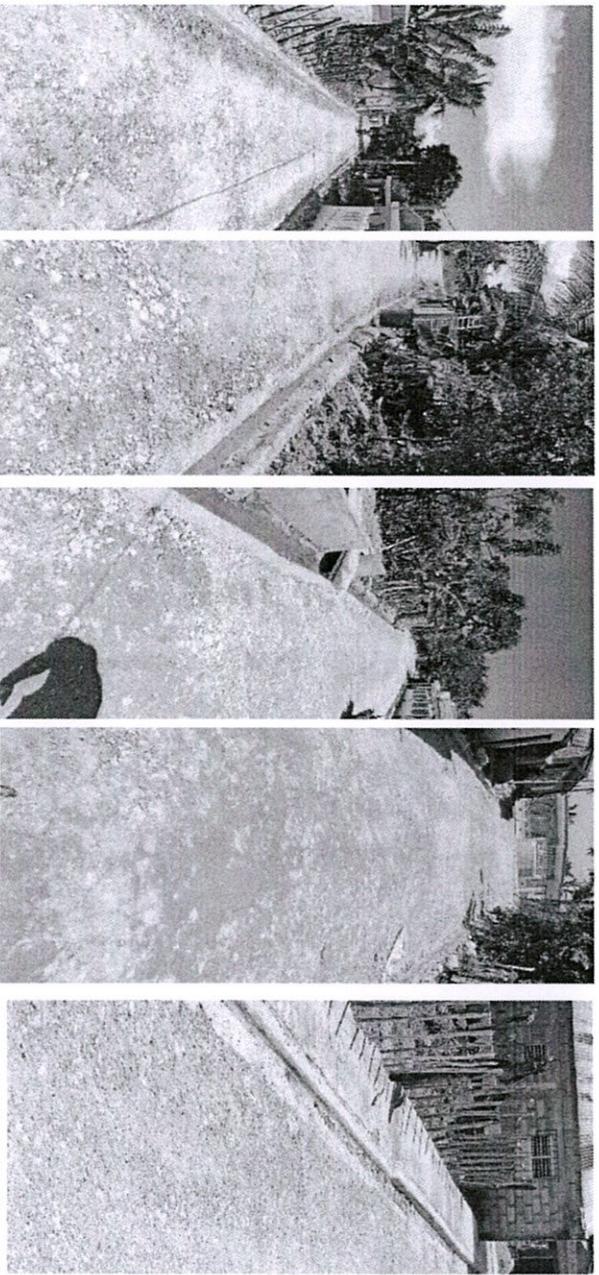



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

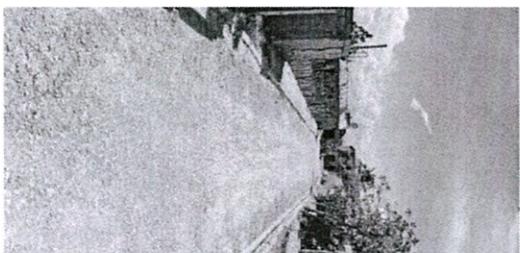

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico


ING. FÉLIX TAVÁREZ

Técnico

