

## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140202

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO SALADO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2022

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (M)	ANCHO DE ACERAS (M)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (M <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (M)
TRAMO A	CALLE 2	149.90	1.19	1	536.45	1	177.73643	536.45
TRAMO B	CALLE 3	40.20	1.00	1	530.00	1	40.2	530
TRAMO C	CALLE 4				154.10	1		154.1
<b>Total</b>							<b>217.94</b>	<b>1220.55</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,378,657.46

Monto desembolsado RD\$ 3,378,657.46 (100%)

Avance de obra 105.29%

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE  
FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17 de mayo de 2022

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: CABRERA

DISTRITO MUNICIPAL: ARROYO SALADO


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 217,94 metros cuadrados de aceras y 1,220,55 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS

1. La construcción de las aceras y contenes se esta ejecutando bajo los parametros recomendados, haciendo referencia tanto en la volumetría como en la calidad de estos.

## IMÁGENES

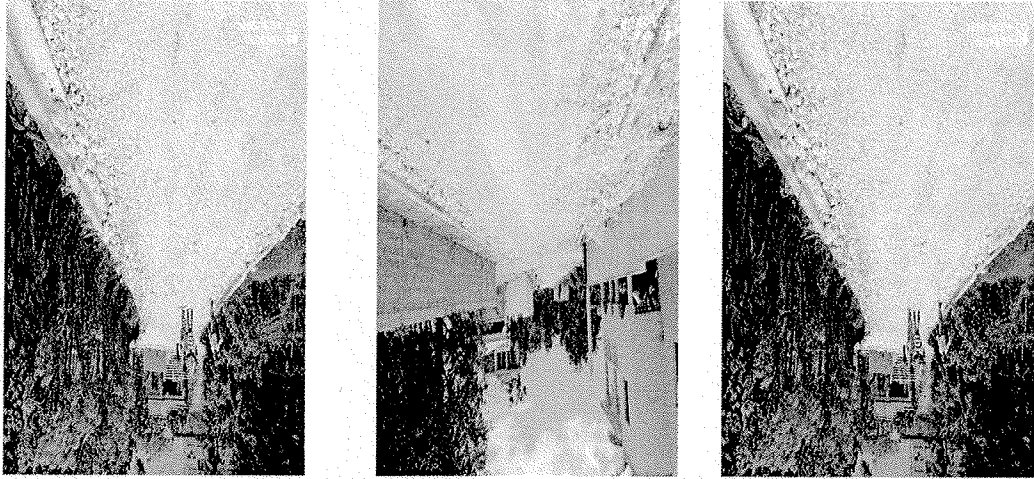

Suministra los datos de este reporte,

Técnico

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA
