



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150302

FECHA DE VISITA TÉCNICA: Junio - Julio 2022

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

PROVINCIA: MONTE CRISTI

SUPERVISOR: Jorge Báez Carpio

MUNICIPIO: GUAYUBÍN


CODIA: 29068

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA ELISA

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ENTRADA LICEO PRINCIPAL	73.14	1.00	1	73.14	1	73.14	73.14
TRAMO B	C/ENTRADA LICEO PRINCIPAL	46.74	1.00	1	46.74	1	46.74	46.74
TRAMO C	C/ENTRADA LICEO PRINCIPAL	239.84	1.00	2	239.84	2	479.68	479.68
TRAMO D	C/ENTRADA LICEO PRINCIPAL	122.56	1.00	1	122.56	1	122.56	122.56
TRAMO E	CALLE 1RA	108.46	1.00	1	108.46	1	108.46	108.46
TRAMO F	CALLE 1RA	123.60	1.00	1	123.6	1	123.6	123.6
TRAMO G	CALLE 2DA	179.02	1.00	2	179.02	2	358.04	358.04
TRAMO H	CALLE 2DA				95.78	1		95.78
TRAMO I	CALLE 2DA	95.78	0.50	1	95.78	1	47.89	95.78
TRAMO J	CALLE OLIVER MENDEZ				56.96	1		56.96
TRAMO K	LA GUAJACA CALLE 1	15.26	1.00	1			15.26	
TRAMO L	LA GUAJACA CALLE 1	124.72	1.00	1			124.72	
TRAMO M	LA GUAJACA CALLE 1	279.98	1.00	1			279.98	
TRAMO N	LA GUAJACA CALLE 1	335.54	1.00	1			335.54	
TRAMO O	LA GUAJACA CALLE 1				49.37	1		49.37
Total							2115.61	1610.11

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,412,386.78
Monto desembolsado RD\$ 3,412,386.78 (100%)
Avance de obra 195.83%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: Junio - Julio 2022

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA ELISA



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,115.61 metros cuadrados de aceras y 1,610.11 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.

IMÁGENES

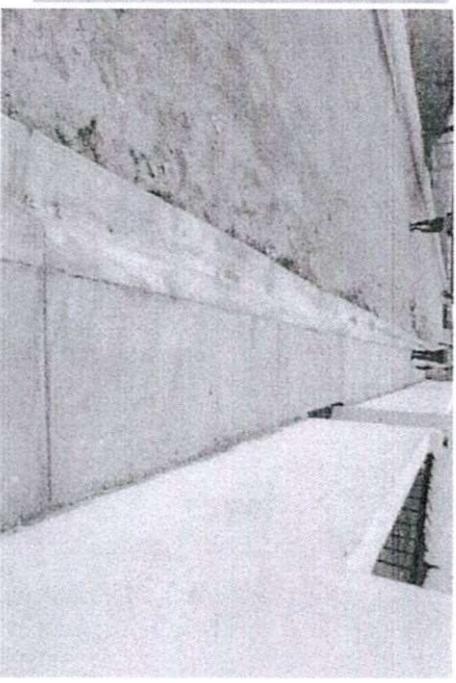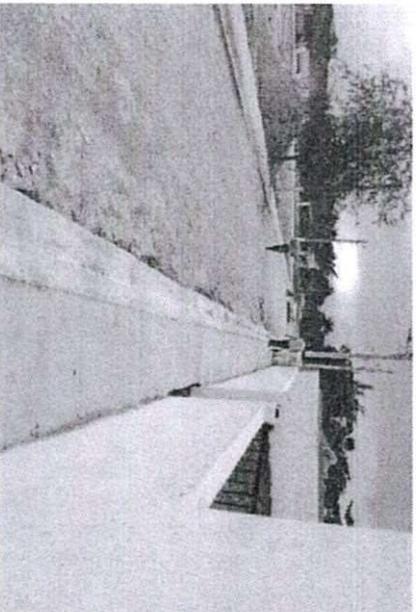



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

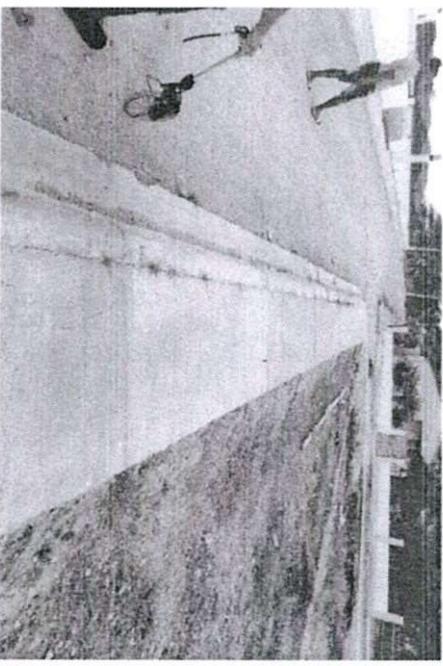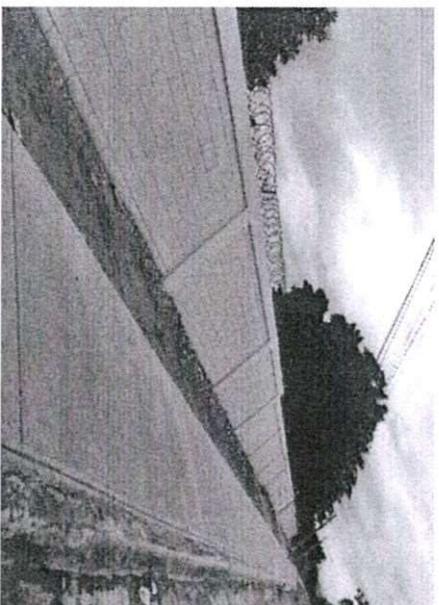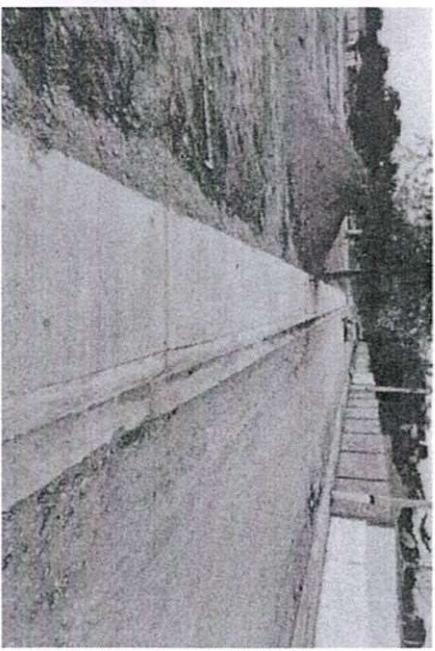

Suministra los datos de este reporte;



Arq. Yarissa Pérez
Técnico
