

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 150303

**REGIÓN:** CIBAO NOROESTE

**PROVINCIA:** MONTE CRISTI

**MUNICIPIO:** GUAYUBÍN

**DISTRITO MUNICIPAL:** HATILLO PALMA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13 de junio de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ ROGER MORETA				92.20	2.00		184.40
TRAMO B	C/ GREGORIO FOUNDEUR				75.40	2.00		150.80
TRAMO C	C/ GREGORIO FOUNDEUR				74.00	2.00		148.00
TRAMO D	C/ ROSA E. CRUZ				83.00	2.00		166.00
TRAMO E	C/ ROSA E. CRUZ				38.80	1.00		38.80
TRAMO F	C/ ROSA E. CRUZ				40.80	1.00		40.80
TRAMO G	C/ GREORIO VALVERDE				109.60	2.00		219.20
TRAMO H	C/ DOMINGO CRUZ				52.50	2.00		105.00
TRAMO I	C/ MARIA BERRIOS				30.00	2.00		60.00
TRAMO J	C/ FRENTE A LA ESCUELA				50.00	2.00		100.00
TRAMO DL	C/ EL PLAY				47.50	2.00		95.00
TRAMO DM	C/ DANIEL FERMIN				30.20	2.00		60.40
TRAMO DN	C/ DEL CEMENTERIO				42.70	1.00		42.70
TRAMO DO								
<b>Total</b>								<b>1,419.10</b>

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA


Monto asignado RD\$ 3,561,186.21  
Monto desembolsado RD\$ 3,561,186.22 (100%)  
Avance de obra 100.51%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

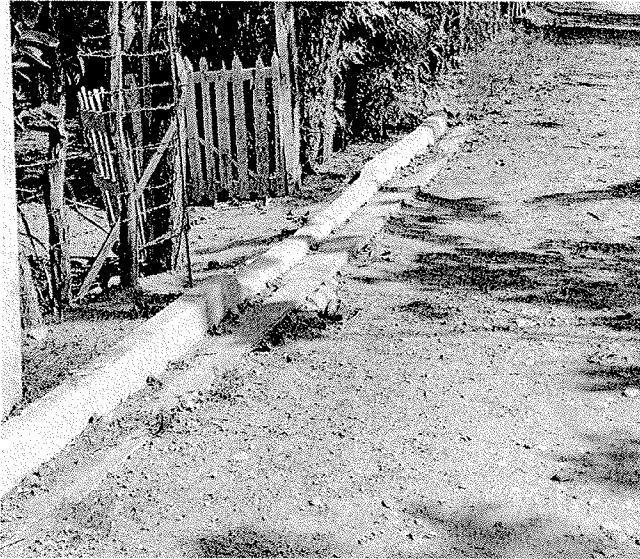

*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico
