

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150501
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO)
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle Almonte				68.60	1		68.6
TRAMO B	Ilda Colon				25.60	1		25.6
TRAMO C	Ilda Colon				15.00	1		15
TRAMO D	Ilda Colon				13.70	1		13.7
TRAMO E	Proyecto Sector Manhatan				86.5	1		86.5
TRAMO F	Sector Pueblo Nuevo				67.3	1		67.3
TRAMO G	Calle Almonte				78.5	1		78.5
TRAMO H	Ilda Colon				121.1	2		242.2
TRAMO I	Calle Almonte				57.7	2		115.4
TRAMO J	Calle Proyecto				74.3	1		74.3
TRAMO K								
TRAMO L	SECTOR VILLA RAY CALLE 1	334.40	1.22	2	6.4	1	815.936	6.4
TRAMO M	SECTOR VILLA RAY CALLE 2	131.70	1.00	1			131.7	
TRAMO N	SECTOR VILLA RAY CALLE 3	264.70	1.28	2			675.5144	
TRAMO O	SECTOR VILLA RAY CALLE 4	74.10	1.00	1			74.1	
TRAMO P	SECTOR VILLA RAY CALLE 5	305.80	0.92	2			564.512	
TRAMO Q	SECTOR VILLA RAY CALLE 6	294.90	1.43	2			840.465	
TRAMO R	SECTOR VILLA RAY CALLE 7				46	2		92
Total							3102.23	885.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,174,437.83
Monto desembolsado RD\$ 3,174,437.83 (100%)
Avance de obra 191.45%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO)

DISTRITO MUNICIPAL: -

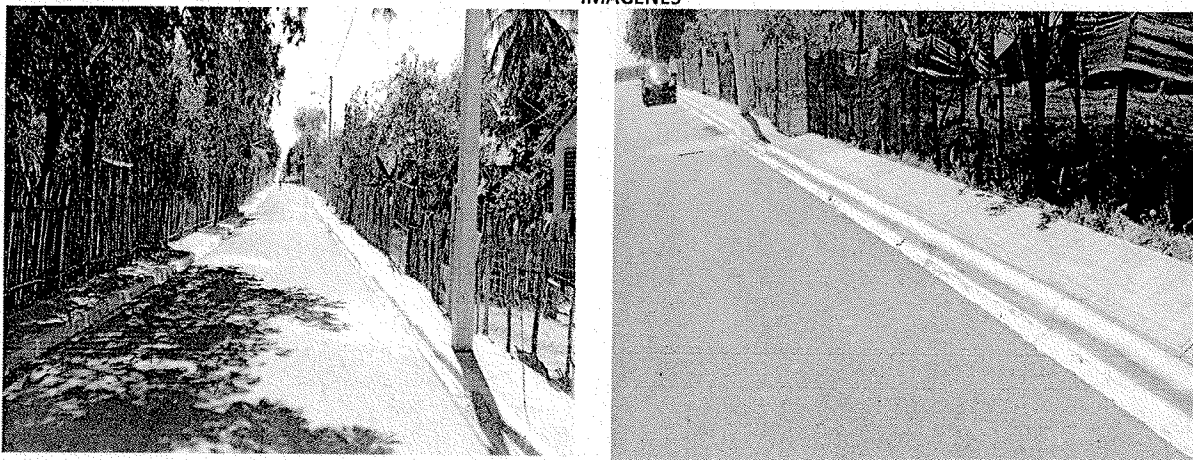
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,102.23 metros cuadrados de aceras y 885.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Estas aceras fuerón construidas por administración.
2. Tienen buena terminacion y cumplen con lo recomendado por el programa.

IMÁGENES







LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ARQ. KEILIN MORA
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico
