



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

Santo Domingo, D.N.
15 de mayo de 2023

Al: Ingeniero
Valentín Santos García
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y
Ordenamiento Territorial
Su Despacho-

Vía: Ingeniero
Nelson D. Peña Luna
Director Asesoría Construcciones Municipales
Su Despacho


Asunto: **Remisión de reporte de cierre de ejecución de Pepillo Salcedo**

En la visita técnica realizada el 07 de marzo del 2023 se validó la ejecución de 3,102.23 metros cuadrados de aceras y 885.5 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución de 441.428 metros cuadrados de aceras y 758.1 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.

Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 3,543.66 metros cuadrados de aceras y 1,643.60 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,


Stephany Castro de la Cruz
Ingeniera Civil
Dirección Asesoría Construcciones Municipales



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150501
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO)
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Keilin Mora
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calin Almonte				68.60	1		68.6
TRAMO B	Ilda Colon				25.60	1		25.6
TRAMO C	Ilda Colon				15.00	1		15
TRAMO D	Ilda Colon				13.70	1		13.7
TRAMO E	Proyecto Sector Manhathan				86.5	1		86.5
TRAMO F	Sector Pueblo Nuevo				67.3	1		67.3
TRAMO G	Calin Almonte				78.5	1		78.5
TRAMO H	Ilda Colon				121.1	2		242.2
TRAMO I	Calin Almonte				57.7	2		115.4
TRAMO J	Calle Proyecto				74.3	1		74.3
TRAMO K								
TRAMO L	SECTOR VILLA RAY CALLE 1	334.40	1.22	2	6.4	1	815.936	6.4
TRAMO M	SECTOR VILLA RAY CALLE 2	131.70	1.00	1			131.7	
TRAMO N	SECTOR VILLA RAY CALLE 3	264.70	1.28	2			675.5144	
TRAMO O	SECTOR VILLA RAY CALLE 4	74.10	1.00	1			74.1	
TRAMO P	SECTOR VILLA RAY CALLE 5	306.80	0.92	2			564.512	
TRAMO Q	SECTOR VILLA RAY CALLE 6	294.90	1.43	2			840.465	
TRAMO R	SECTOR VILLA RAY CALLE 7				46	2		92
Total							3102.23	885.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,174,437.83
Monto desembolsado RD\$ 3,174,437.83 (100%)
Avance de obra 191.45%

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 7 de marzo de 2023

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: PEPILLO SALCEDO (MANZANILLO)

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 3,102.23 metros cuadrados de aceras y 885.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Estas aceras fuerón construidas por administración.
2. Tienen buena terminacion y cumplen con lo recomendado por el programa.

IMÁGENES

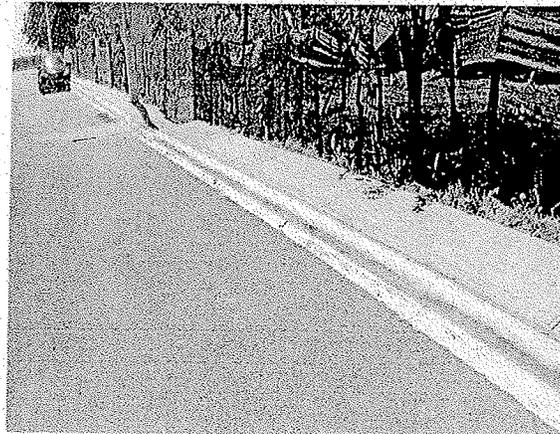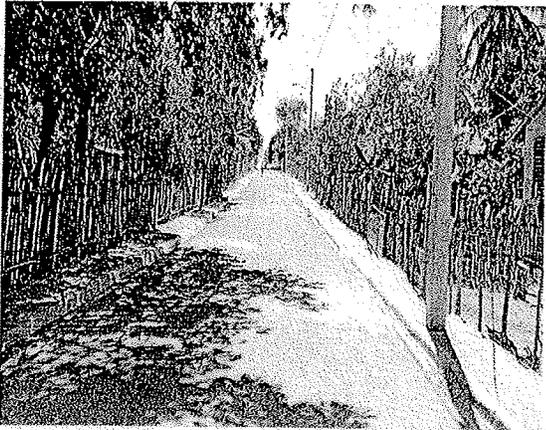



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

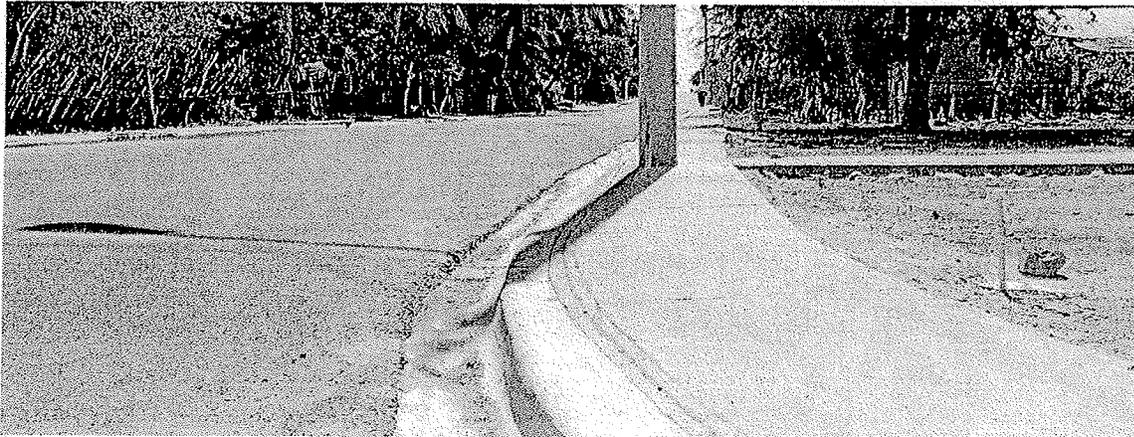

Suministra los datos de este reporte,

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

ING. RICHARD CABRERA

Técnico



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

3ER COMPONENTE

REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)

1- UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: PEPILLO SALCEDO

DISTRITO MUNICIPAL:

BARRIO Y/O SECTOR:

CALLE AL LADO DEL PLAY, COPEY, CALLE SEGUNDA

2- UNIDAD EJECUTORA (Marque con una X)

a. Gobierno Local

b. Contratista

Razón Social: AYUNTAMIENTO PEPILLO SALCEDO

RNC ó Cédula: 4-08-00085-6

3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Marque con una X)

a. Reparación de aceras y contenes:

b. Incluye demoliciones de tramos:

c. Incluye badenes:

d. Otros:

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO


Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.
Puede auxiliarse de Google Maps.

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A	Calle a lado del Plaz de Cober	19.677160	-71.682261	19.676852	-71.682296	85	1	85	85	85
Tramo B	Calle al lado del Plaz de Cober	19.676883	-71.683015	19.677317	-71.682758	43	1	43	43	43
Tramo C	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577170	-71.682223	19.679599	-71.681696	-	-	37.9	-	37.9
Tramo D	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577633	-71.681727	19.677541	-71.682354	61.4	1	61.4	61.4	61.4
Tramo E	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577329	-71.682473	19.678195	-71.682594	-	-	95	-	190
Tramo F	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577324	-71.682454	19.677575	-71.682657	83	1	83	83	88
Tramo G	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577357	-71.682727	19.677787	-71.682417	-	1	81	-	162
Tramo H	Calle cerca del Plaz de Cober	19.577787	-71.683407	19.677266	-71.682884	-	-	45.4	-	90.8
Tramo I	Cober, calle segunda	19.576598	-71.681024	19.676667	-71.680297	98.7	0.94	-	92.778	-
Tramo J	Cober, calle segunda	19.576555	-71.680972	19.676720	-71.680287	75	0.95	-	71.25	-
Tramo K										
Tramo L										



1441.428 758.1

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo M										
Tramo N										
Tramo O										
Tramo P										
Tramo Q										
Tramo R										
Tramo S										
Tramo T										
Tramo U										
Tramo V										
Tramo W										
Tramo X										



5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El Alcalde quiere saber si con estos metros ya el proceso está culminado al 100%, aunque solo haya recibido el 50% de los fondos como Avance.

6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

Anthony Isidro Almonte Lopez.

CÉDULA:

094-0023263-4


CODIA:

43217

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

5 de mayo del 2023.

Valida y aprueba los datos suministrados,


Firma y sello
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal



● ○ REDMI NOTE 8
∞ AI QUAD CAMERA

