

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 160101

REGIÓN: ENRIQUILLO

PROVINCIA: PEDERNALES

MUNICIPIO: PEDERNALES

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23/6/2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Elisabeth Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Av. Libertad	128.70	1.40	2	128.70	2	360.36	257.4
TRAMO B	Av. Libertad	66.00	1.45	1	66.00	1	95.7	66
TRAMO C	Av. Libertad	142.50	1.15	1	142.50	1	163.875	142.5
TRAMO D	Av. Libertad	46.30	1.15	1	46.3	1	53.245	46.3
TRAMO E	Av. Libertad	44.50	1.30	1	44.5	1	57.85	44.5
TRAMO F	Av. Libertad	165.30	1.50	1	165.3	1	247.95	165.3
TRAMO G	C/ Segunda	35.55	1.39	1	35.55	1	49.4145	35.55
TRAMO H	C/ Rosendo Pérez	86.00	1.00	1	14.3	1	86	14.3
TRAMO I	C/ 1er. Abril - C/ Segunda	53.10	1.30	1	53.1	1	69.03	53.1
TRAMO J	Calle M	35.70	0.80	1	35.7	1	28.56	35.7
TRAMO K	C/ Socrates Nolasco	56.10	0.77	1	56.1	1	43.197	56.1
TRAMO L	C/ Socrates Nolasco	39.60	0.95	2	47.4	2	75.24	94.8
TRAMO M	C/ Socrates Nolasco	40.90	1.10	1	40.9	1	44.99	40.9
TRAMO N	Calle 13 de Marzo	52.10	1.30	1	52.1	1	67.73	52.1
Total							1443.14	1104.55

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,188,920.26

Monto desembolsado RD\$ 4,188,920.26 (100%)

Avance de obra 111.91%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO  
PROVINCIA: PEDERNALES  
MUNICIPIO: PEDERNALES  
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 23/6/2022


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,443.14 metros cuadrados de aceras y 1,104.55 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Este Municipio esta construyendo por contrato.
2. Ya cumplio con el monto estimado a construir en dicho territorio, esta obra esta ejecutada al 100%.
3. La plantilla utilizada coincide con la recomendada por la LMD.


### IMÁGENES

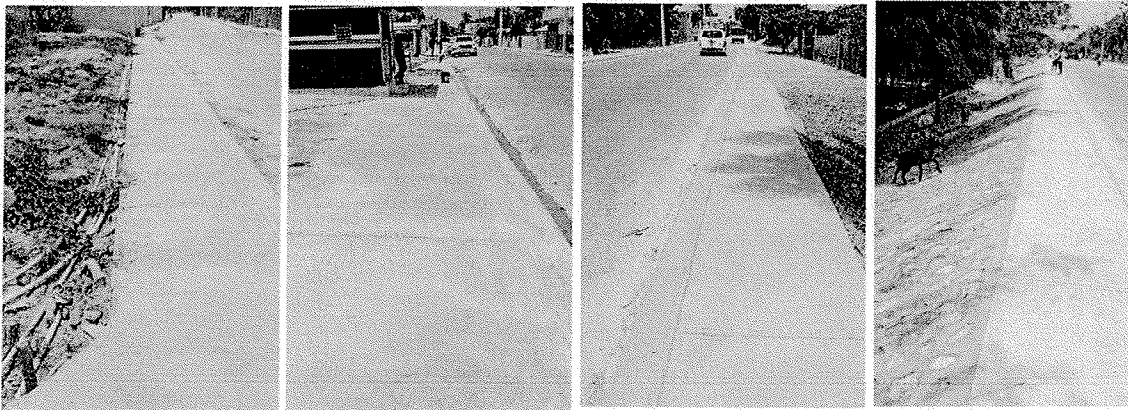

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico



  
ELISABEH AGUILERA  
Técnico
