



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 9 de septiembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
2. Ing. Danilo Mercado

CODIGO: 170104
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANI
DISTRITO MUNICIPAL: SABANA BUEY

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	La Altigracia				62.50	2		125
TRAMO B	La Altigracia				91.90	2		183.8
TRAMO C	La Libertad				70.50	2		141
TRAMO D	La Libertad				66.4	2		132.8
TRAMO E	La Estancia				98	2		196
TRAMO F	Santa Fé (La Iglesia)				51.4	2		102.8
TRAMO G	Deuris Mateo				64.9	1		64.9
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total								946.3

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,844,519.56
 Monto desembolsado RD\$ 1,422,259.78 (50%)
 Avance de obra 85.60%



**LIGA MUNICIPAL
—DOMINICANA—**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA BUEY

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 9 de septiembre de 2022


REPORTE

A la fecha de 09/09/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 946.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 85.6% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS



1. La obra la estan ejecutando por Contrato o Comparaciones de Precios.
2. Solo estan realizando contenes para aprovechar el Plan de Asfalto Nacional.
3. La construcción cumple con los estandares recomendados por el Programa.

IMÁGENES

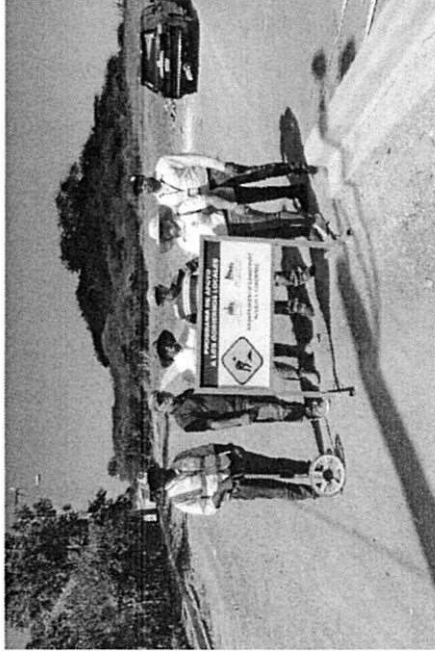



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

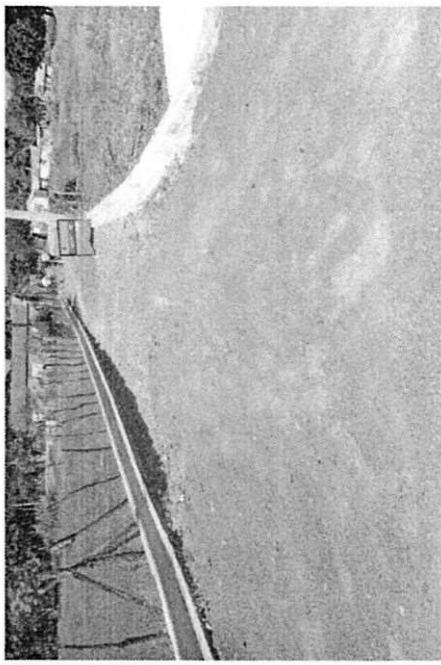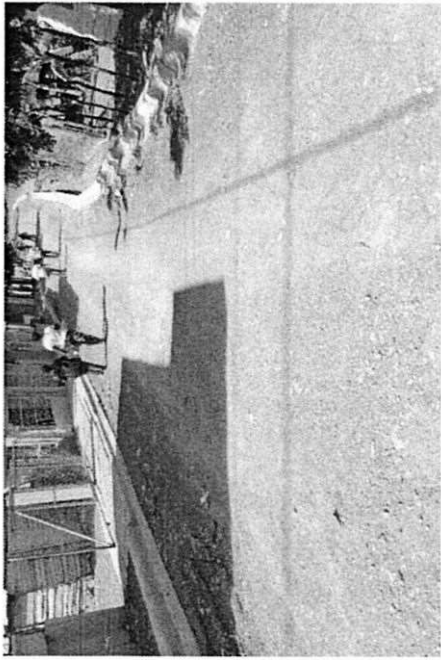

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA

Técnico

ING. DANILO MERCADO

Técnico

