




SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170107
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANI
DISTRITO MUNICIPAL: EL CARRETÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Ramírez
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE DE LA POLICIA				303.00	1.00		303.00
TRAMO B	CALLE DANIELITO				128.20	1.00		128.20
TRAMO C	CALLE 1 ERA				29.60	1.00		29.60
TRAMO D	Calle 2 da				47.00	2.00		94.00
TRAMO E	Calle 3 era				108.25	2.00		216.50
TRAMO F	Calle 4ta				67.75	2.00		135.50
TRAMO G	CALLE DE LA POLICIA				230.50	2.00		461.00
TRAMO H	Pablo Rivera (Detrás de La Gallera)				69.90	2.00		139.80
TRAMO I								
TRAMO J								
Total								1,507.60

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
 Monto asignado RD\$ 3,104,810.11
 Monto desembolsado RD\$ 1,552,405.06 (50%)
 Avance de obra 124.95%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: PERAVIA
MUNICIPIO: BANÍ
DISTRITO MUNICIPAL: EL CARRETÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,507.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra se está ejecutando por Contrato.
2. La calidad de la obra cumple con los estándares recomendados del programa.

IMÁGENES

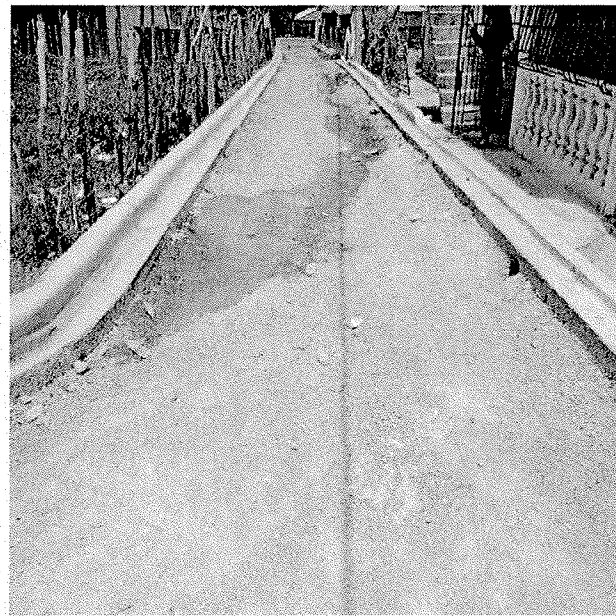




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico

