




**LIGA MUNICIPAL  
DOMINICANA**

Santo Domingo, D.N.  
31 de julio de 2023

Al: Ingeniero  
**Valentín Santos García**  
Subsecretario Apoyo Municipal de Obras Públicas, Planeamiento y  
Ordenamiento Territorial  
Su Despacho-

Vía: Ingeniero  
**Nelson D. Peña Luna**   
Director Asesoría Construcciones Municipales  
Su Despacho

Asunto: **Remisión de informe de cierre de ejecución del D.M. Catalina**

En la visita técnica realizada el 24 de mayo de 2022 se validó la ejecución de 1169.30 metros lineales de contenes, con la asignación del 1er y 2do componente del Programa de Aceras y Contenes, en el marco del “Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales”.

La supervisión externa ha validado la ejecución 221.00 metros lineales de contenes con los fondos de la asignación del 3er componente del referido programa.


Mediante el presente informe se da constancia de que se ha ejecutado 1390.90 metros lineales de contenes, por lo que con este metraje alcanzado el gobierno local ha cumplido con la cantidad de trabajo requerido a realizar con su asignación de fondos lo que corresponde al 100% o más de los fondos asignados para este territorio.

Para su conocimiento y fines de lugar,



**Stephany Castro de la Cruz**  
Ingeniera Civil

Dirección Asesoría Construcciones Municipales



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 170108  
**REGIÓN:** VALDESIA  
**PROVINCIA:** PERAVIA  
**MUNICIPIO:** BANI  
**DISTRITO MUNICIPAL:** CATALINA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 24 de mayo de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Danilo Mercado  
2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE CENTRAL, LA DELICIA				46.50	2		93
TRAMO B	CALLE CENTRAL, EL RINCON				115.60	1		115.6
TRAMO C	CALLE CENTRAL, EL RINCON				94.85	2		189.7
TRAMO D	CALLE CENTRAL, EL RINCON				68.50	2		137
TRAMO E	CALLE CENTRAL, JAZMIN BELTRE				41.6	1		41.6
TRAMO F	CALLE CENTRAL, JAZMIN BELTRE				54.2	1		54.2
TRAMO G	CALLE TANIA				47.75	2		95.5
TRAMO H	CALLE VICTORINO				67.85	2		135.7
TRAMO I	CALLE TANIA				140.9	2		281.8
TRAMO J	CALLE VICTORINO				25.2	1		25.2
<b>Total</b>							<b>0.00</b>	<b>1169.30</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,979,219.92  
Monto desembolsado RD\$ 2,979,219.92 (100%)  
Avance de obra 101.00%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA  
PROVINCIA: PERAVIA  
MUNICIPIO: BANÍ  
DISTRITO MUNICIPAL: CATALINA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 24 de mayo de 2022


## REPORTE

A la fecha de 24/05/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,169.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 101.% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS




1. Esta obra se esta realizando via administración.
2. En este proyecto solo se estan ejecutando contenes para aprovechar el plan de asfaltado.  
El ancho de acera es minimo(0.2 a 0.40 mts) debido que comunitarios no desean ceder los metros
3. apropiados del espacio público y el ancho de la calle esta dentro de las normas establecidas debido a que transitan camiones pesados.

## IMÁGENES

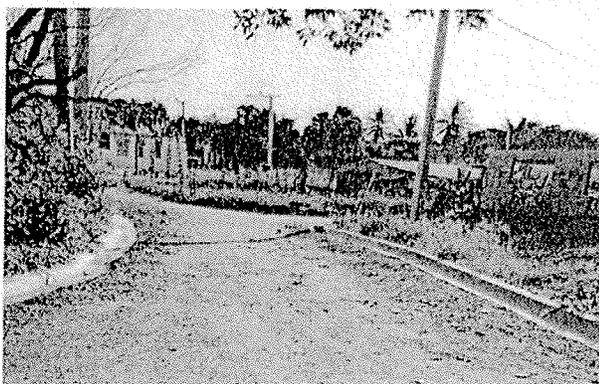



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

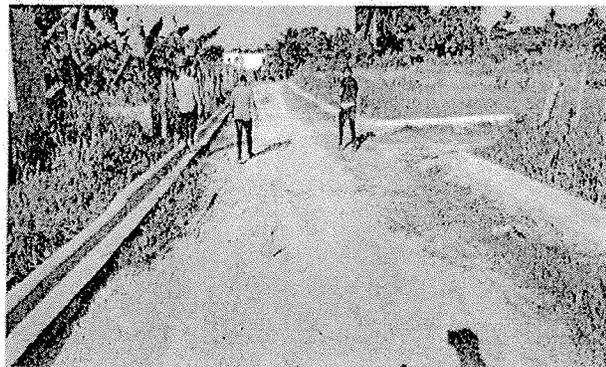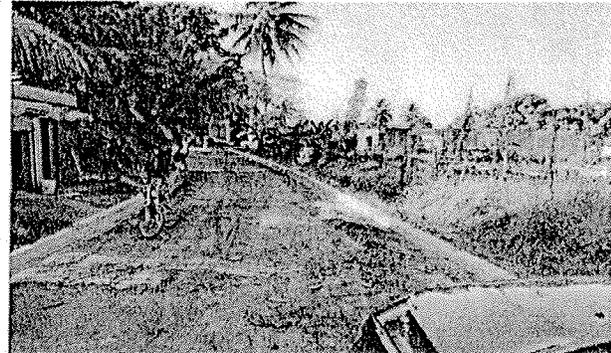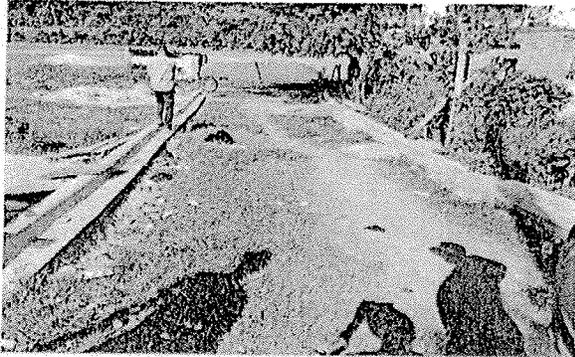

Suministra los datos de este reporte,

*Daniilo Mercado*  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

*Elizabeth García*  
ELIZABETH GARCÍA  
Técnico



**PROGRAMA DE APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE  
INFRAESTRUCTURAS DE COMPETENCIAS MUNICIPALES**

---

**3ER COMPONENTE**

**REPORTES DE CIERRE DE OBRA (ACERAS Y CONTENES)**

**1- UBICACIÓN DEL PROYECTO**

PROVINCIA: PERAVIA  
MUNICIPIO: BANI  
DISTRITO MUNICIPAL: CATALINA  
BARRIO Y/O SECTOR:  

CASCO URBANO
--------------

**2- UNIDAD EJECUTORA ( Marque con una X)**

- a. Gobierno Local   
b. Contratista

Razón Social: OCTAVIO PEGUERO  
RNC ó Cédula: 033-0004368-4

**3- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA ( Marque con una X)**

- a. Reparación de aceras y contenes:  
b. Incluye demoliciones de tramos:  
c. Incluye badenes:  
d. Otros:

SOLO CONTENES
---------------

**4- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

Localización de cada inicio y fin, de cada uno de los tramos, y proceda a tabular las georreferencias.  
Puede auxiliarse de Google Maps

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	INICIO		FINAL		LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE LA ACERA (m)	LONGITUD DE CONTENES (m)	TOTAL DE ACERAS (sumar ambos lados) (m2)	TOTAL DE CONTENES (sumar ambos lados) (m)
		LATITUD	LONGITUD	LATITUD	LONGITUD					
Tramo A		18.27312	-70.24669	18.27293	-70.24717			55.30		
Tramo B		18.27292	-70.24772	18.27289	-70.24729			10.20		
Tramo C		18.27289	-70.24732	18.27237	-70.2485			138.30		
Tramo D		18.27243	-70.24848	18.27255	-70.24839			17.20		
Tramo E										
Tramo F										
Tramo G										
Tramo H										
Tramo I										
Tramo J										
Tramo K										
Tramo L										

total de Contenes mL → (222.00 mL)








# BANI ( junta distrital DE CATALINA )

Capa sin nombre

- INICIO A
- ↳ TRAMO A
- FINAL A
- INICIO B
- ↳ TRAMO B
- FINAL B
- INICIO C
- ↳ TRAMO C
- FINAL C
- INICIO D
- FINAL D
- ↳ TRAMO D



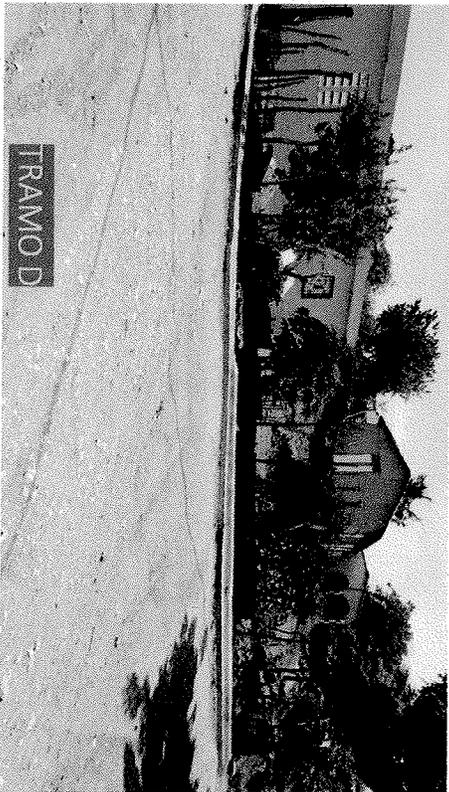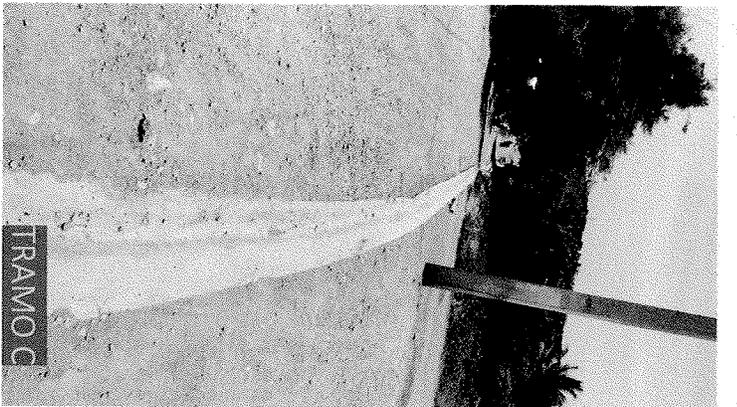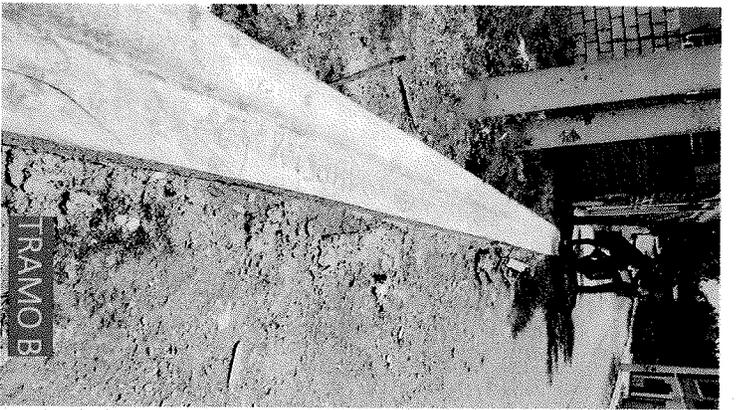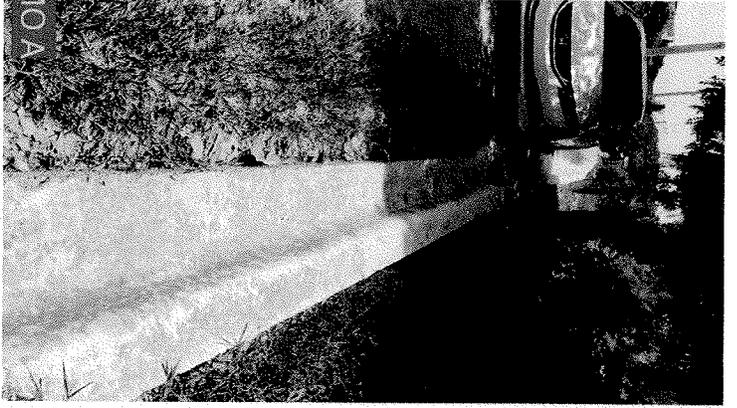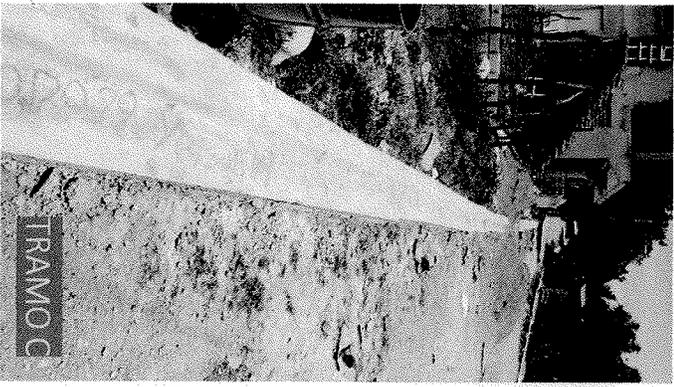

**5- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

- Cumple con los parámetros de constructores y planta  
- Condición de presupuesto Asignado (Cierre) completo

**6- FOTOGRAFÍAS DE LAS CALLES A INTERVENIR**

Anexar imágenes de las obras.

Suministra los datos de este reporte el Supervisor,

NOMBRE COMPLETO:

ALIS YOSI MERCEDOS CRBAEZ

CÉDULA:

402-2112326-8

CODIA:

35877

FECHA DE LA VISITA TÉCNICA:

24/06/2023

Valida y aprueba los datos suministrados,

Firma y sello  
Junta Distrital ó Alcaldía Municipal

