



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 170109

**REGIÓN:** VALDESIA

**PROVINCIA:** PERAVIA

**MUNICIPIO:** BANÍ

**DISTRITO MUNICIPAL:** EL LIMONAL

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 18/11/2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

**TÉCNICOS:** 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE ONEL FRANCO				180.50	1		180.5
TRAMO B	CALLE VIRIATO LORA				648.70	1		648.7
TRAMO C	CALLE PLINIO BAEZ				593.10	1		593.1
TRAMO D	SAN JUAN BAUTISTA				408.50	1		408.5
TRAMO E	CESARIA MOJICA				137.5	1		137.5
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	1968.30

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,148,517.23

Monto desembolsado RD\$ 1,574,258.62 (50%)

Avance de obra 160.87%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANI

DISTRITO MUNICIPAL: EL LIMONAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18/11/2022


### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,968.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Este distrito ejecutó por contrato.
2. Todo lo construido cumple con los parámetros recomendados por la liga.

### IMÁGENES

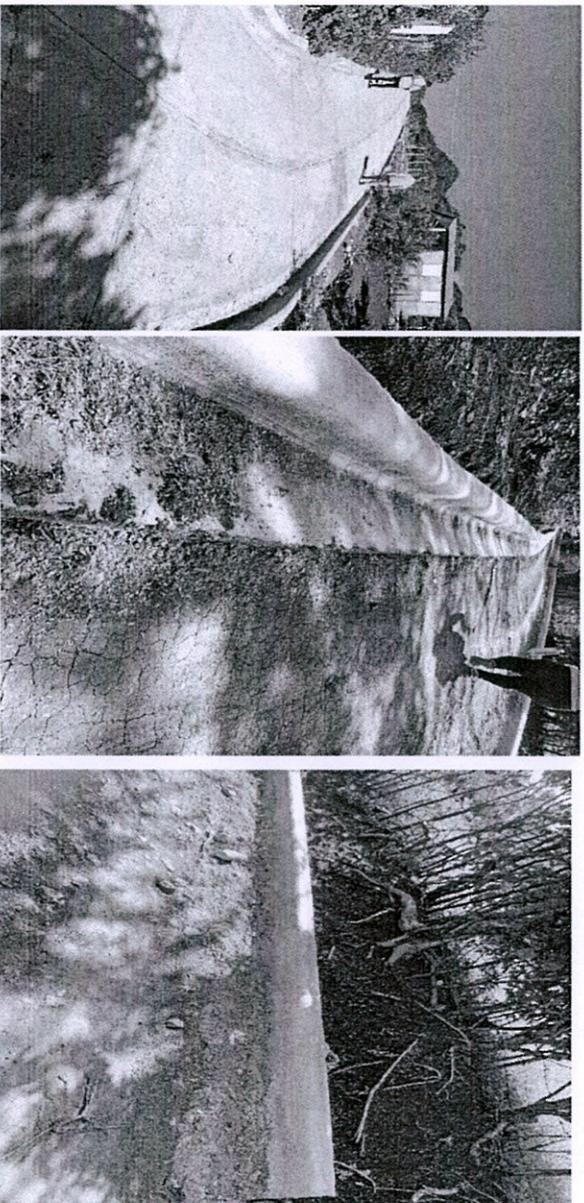



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

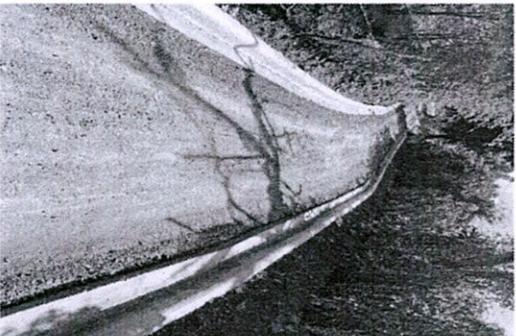

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ  
Técnico

\_\_\_\_\_  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico
