



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170110

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: LAS BARÍAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18/11/2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ alexis luna	193.20	1.00	1	81.80	1	193.2	81.8
TRAMO B	Esquina del play	92.20	1.00	1	145.30	1	92.2	145.3
TRAMO C	c/ doña nena	31.00	1.00	1	263.00	1	31	263
TRAMO D	c/ juan de cena	194.20	1.00	1	258.40	1	194.2	258.4
TRAMO E			1.00		342.2	1		342.2
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							510.60	1090.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,869,247.16

Monto desembolsado RD\$ 2,869,247.16 (100%)

Avance de obra 120.75%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: LAS BARRÍAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 18/11/2022



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 510.60 metros cuadrados de aceras y 1,090.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


- 1.** Este distrito municipal ejecutó por contrato
- 2.** Según lo visto se cumplen con los parámetros recomendados por la LMD

IMÁGENES

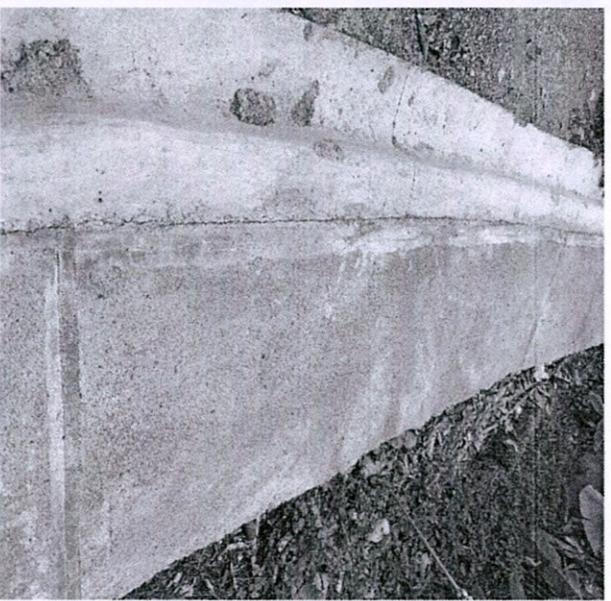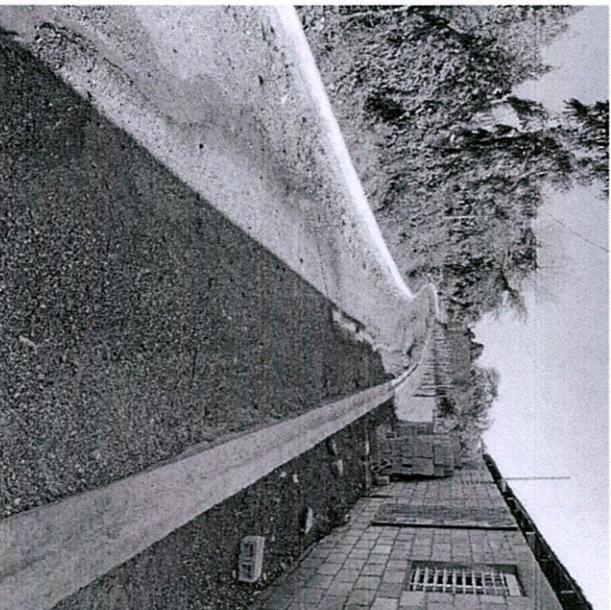



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

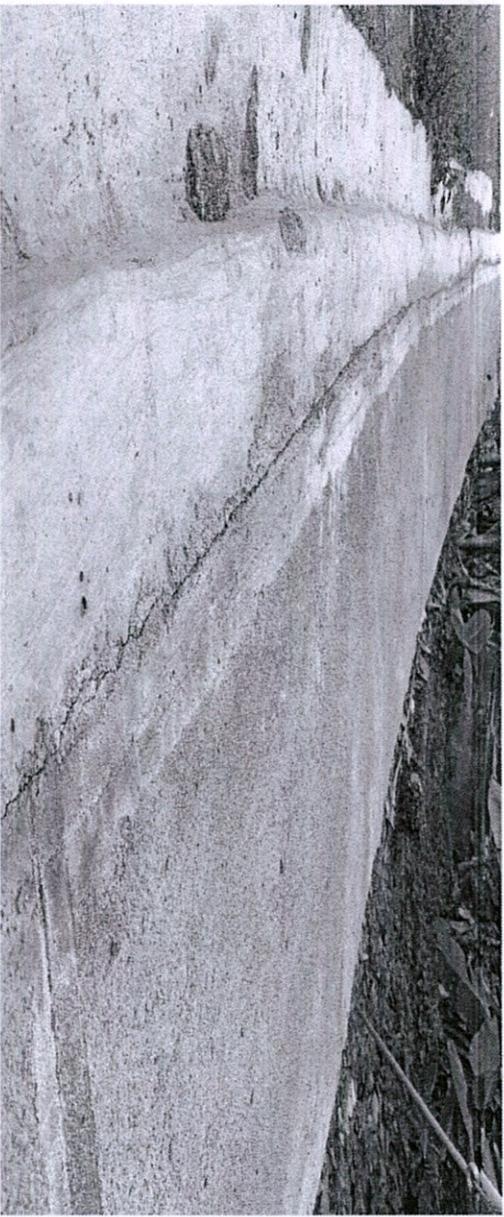

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
